

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Setor: PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT-INFRASTRUCTURE AND PUBLIC SERVICES
Número da Operação: 1702/SF-NI
Estágio: Approved
Tipo Operação: INV - Investimento
Operação Relacionada:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual: 40.100.000,00
Desembolsado: 29.118.848,60
% Desembolsado: 72,62
Saldo: 10.981.151,40

Custo Total e Fonte

Original BID: 40.100.000,00
Corrente BID: 40.100.000,00
Pari-passu: 99,08
Cofinanciamento/País: 639.500,00
Original Estimado: 40.739.500,00
Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011

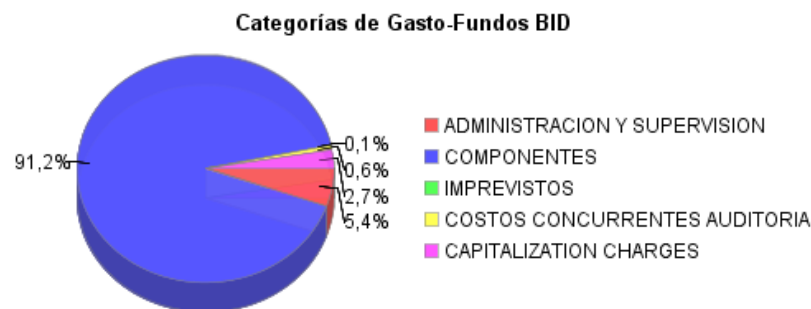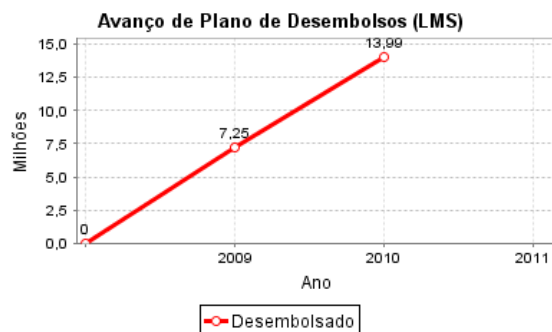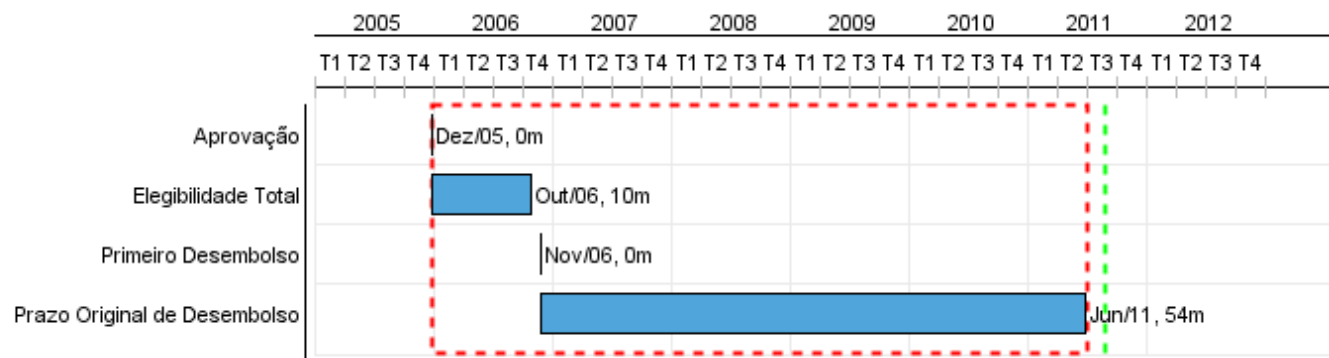

Progresso Acumulado até 2010

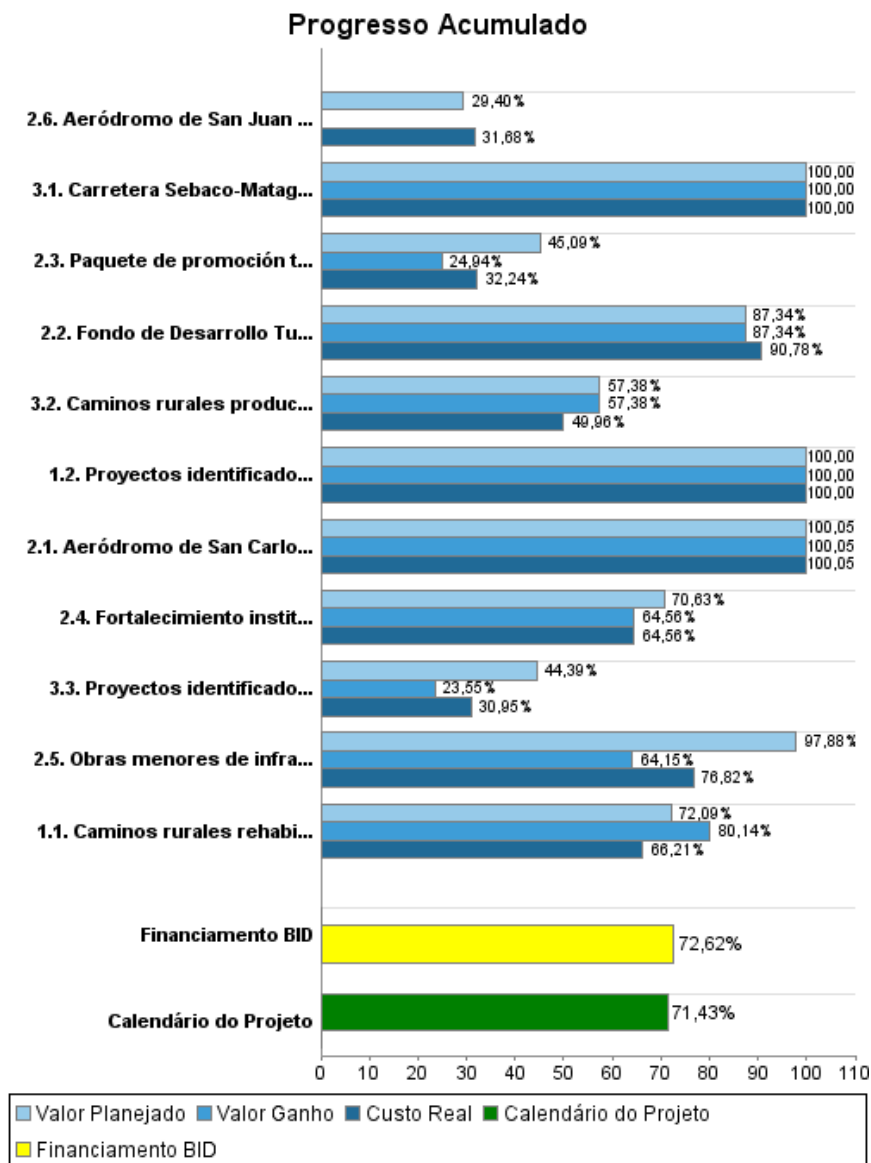

Resultados

Resultado:	Incrementada la competitividad y conectividad de los principales conglomerados productivos del país.
Suposições:	<p>Entorno macroeconómico estable, favorable a la inversión</p> <p>Condiciones de gobernabilidad adecuadas</p> <p>Mercados internacionales favorables</p> <p>Se mantiene el esquema de coordinación institucional para el desarrollo del programa</p>
Observações:	Este resultado se logrará a través de mejoras en infraestructura vial e intervenciones varias que apoyen incrementos en la productividad, ingresos y exportaciones de: (i) carne y lácteos; (ii) turismo (ruta del agua); y (iii) café. Esto en conformidad con las líneas estratégicas y las matrices de financiamiento establecidas en el PND.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Exportaciones/producción de carnes y lácteos de la zonas de influencia del proyecto.	Cambio Porcentual		2006	P A	15,00
Turistas en la zona de influencia del proyecto.	Cambio Porcentual		2006	P A	10,00
Exportaciones/ producción de café de las zonas de influencia del proyecto.	Cambio Porcentual		2006	P A	5,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Apoyo al conglomerado de carne y lácteos									
1.1. Caminos rurales rehabilitados.	Km	37,92	47,00		140,00	1.734.780,00	1.431.100,00		5.162.970,00
1.2. Proyectos identificados y elegibles para financiamiento del Programa	Proyectos	2,40			2,00				45.130,00
2. Apoyo al conglomerado de turismo (Ruta del Agua, Departamento Río San Juan)									
2.1. Aeródromo de San Carlos en funcionamiento.	Aeródromo				1,00				460.000,00
2.2. Fondo de Desarrollo Turístico implementado	Fondo de Desarrollo	0,50	0,50		1,00	121.850,00	165.640,00		1.275.000,00
2.3. Paquete de promoción turística Ruta del Agua implementado.	Paquete	1,00	0,40		1,00	335.830,00	207.310,00		1.000.000,00
2.4. Fortalecimiento institucional del INTUR implementado.	Plan				1,00	42.253,00	28.900,00		220.000,00
2.5. Obras menores de infraestructura turística del Proyecto Ruta del Agua.	Obras	11,30	4,30		26,00	2.049.723,00	689.340,00		6.459.490,00
2.6. Aeródromo de San Juan de Nicaragua en funcionamiento	Aeródromo	0,30			1,00	2.260.353,00	2.435.410,00		7.687.456,00
3. Apoyo al conglomerado de café									
3.1. Carretera Sebaco-Matagalpa rehabilitada.	Km				27,00				9.122.240,00
3.2. Caminos rurales productivos rehabilitados	Km	24,11	24,11		139,00	1.004.970,00	625.760,00		5.111.240,00
3.3. Proyectos identificados y elegibles para financiamiento del Programa	Proyectos	2,80	1,00		3,00	107.202,00	62.740,00		330.660,00
Administración, evaluación y auditorías									
Imprevistos									
Costos concurrentes									
Costos financieros									
TOTAL						7.656.961,00	5.646.200,00		36.874.186,00
