
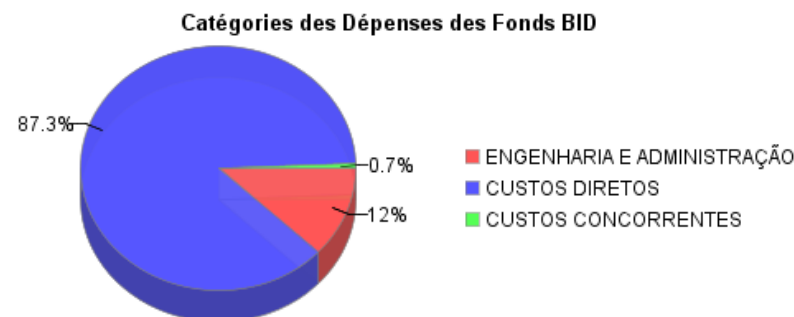
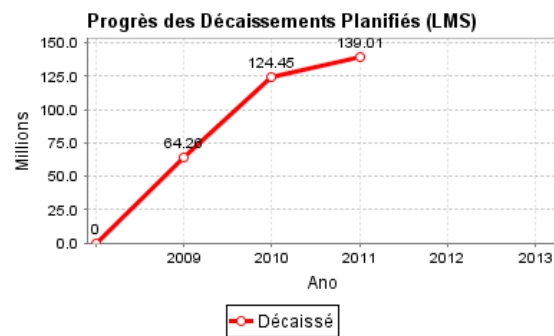



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Estado de Amazonas				
Secteur:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Numéro(s) de Prêt(s):	2006/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	154.000.000,00	Initial BID:	154.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	139.008.437,27	Courant BID:	154.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	90,27	Pari Passu:	70,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-L1005, BR-L1297	Solde:	14.991.562,73	Cofinancement/Pays:	66.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	220.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 15-mar-2012
		Validé par le Représentant: 22-abr-2012

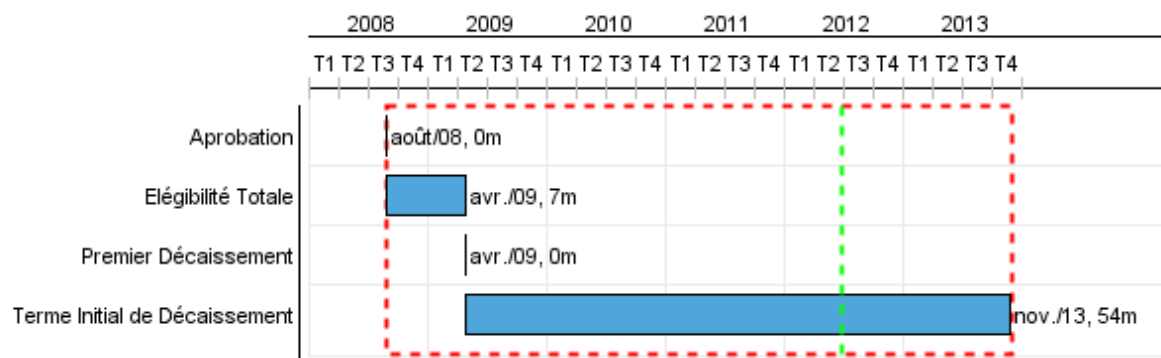

Progrès Cumulé à 2011

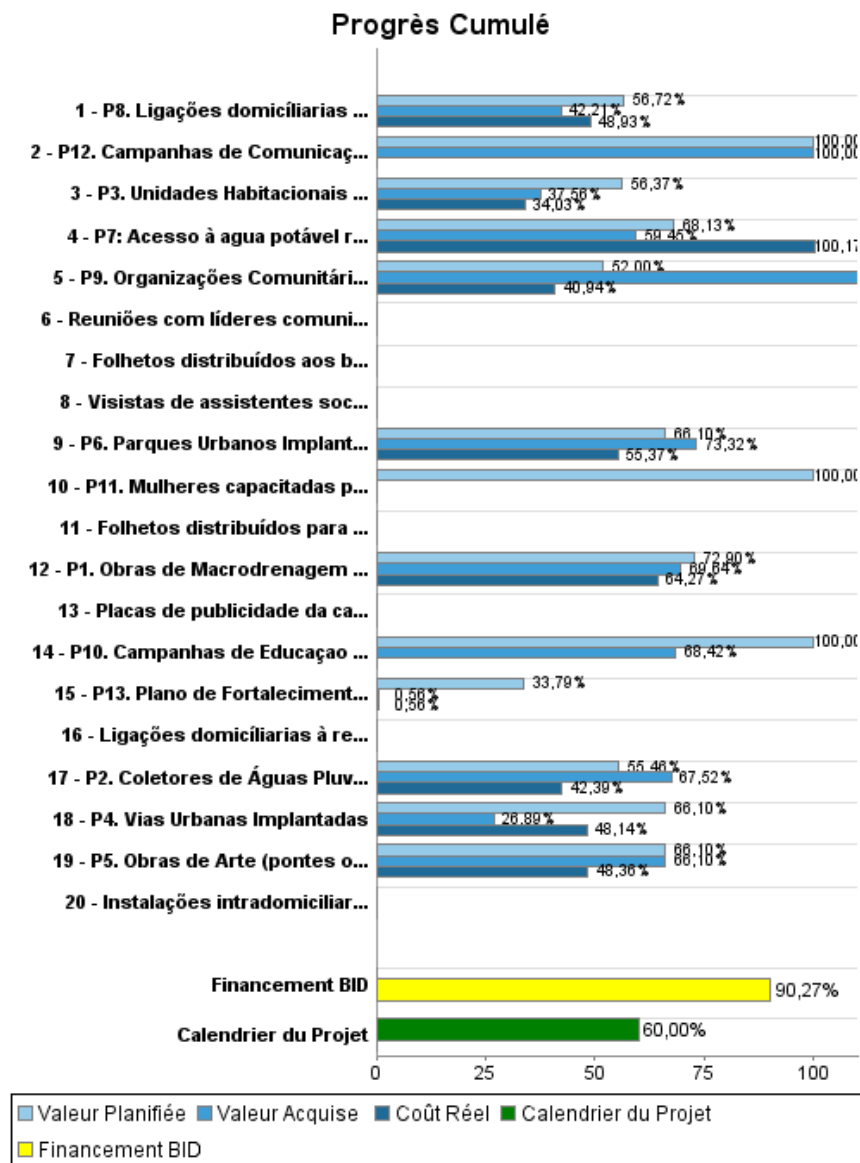

Résultats

Résultat:	Problemas socio-ambientais dos habitantes das bacias hidrograficas dos igarapés São Raimundo e Educandos (cidade de Manaus-AM) solucionados.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Coliformes termotolerantes	NMP/100ml	2,400.00	2006	P A	1.000,00
Oxigênio dissolvido nas águas (OD).	mgO2/L	3.10	2006	P A	4,20
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).	mgO2/L	240.00	2006	P A	20,00
Nitrogênio amoniacal.	mgN/L	13.00	2009	P A	10,00
Demanda Química de Oxigênio (DQO).	mgO2/L	152.30	2006	P A	75,00
Pessoas afetadas por inundações	peessoas	22,085.00	2006	P A	0,00
Casas localizadas em assentamentos precarios na cidade de Manaus	casas	84,500.00	2006	P A	80.500,00
Coliformes termotolerantes - Fundo Espanhol	NMP/100ml	2,400.00	2011	P A	1.000,00
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) - Fundo Espanhol	mgO2/L	240.00	2009	P A	20,00
Demanda Química de Oxigênio (DQO) - Fundo Espanhol	mgO2/L	152.30	2009	P A	75,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
COMPONENTE1: Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional									
P1. Obras de Macrodrenagem executadas (Canais de Água reabilitados e Galerias de Macrodrenagem construídas)	metro	1.289,00	1.024,00		4.901,19	5.399.420,00	3.098.000,00		27.077.920,00
P2. Coletores de Águas Pluviais construídos.	metro	1.818,00	2.918,00		9.803,68	612.240,00	211.000,00		3.070.350,00
P3. Unidades Habitacionais Construídas	unidade habitacional	395,00	166,00		1.038,00	12.354.300,00	3.363.000,00		40.518.540,00
P4. Vias Urbanas Implantadas	metro	5.375,00	1.825,00		15.369,14	5.619.580,00	1.360.000,00		24.007.840,00
P5. Obras de Arte (pontes ou viadutos) construídas.	obras de arte	2,00	2,00		7,00	4.953.120,00	1.246.000,00		21.160.630,00
P6. Parques Urbanos Implantados	ha	15,00	26,00		39,85	5.882.600,00	3.241.000,00		25.131.530,00
P7: Acesso à água potável regularizado	moradias	395,00	166,00		3.929,00	46.970,00	331.000,00		886.670,00
P8. Ligações domiciliares à rede pública de esgoto instaladas	Domicílios	395,00	166,00		8.226,00	10.846.050,00	6.823.000,00		53.287.530,00
COMPONENTE 2: Sustentabilidade Social e Institucional									
P9. Organizações Comunitárias criadas	organização	1,00			34,00	12.000,00	6.000,00		50.000,00
P10. Campanhas de Educação Sanitária e Ambiental realizadas	Campanhas	38,00	26,00		174,00	200.000,00			200.000,00
P11. Mulheres capacitadas para inserção no mercado de trabalho	Indivíduos	50,00			150,00	50.000,00			50.000,00
P12. Campanhas de Comunicação Social realizadas	campanhas	1,00	1,00		4,00	200.000,00			200.000,00
P13. Plano de Fortalecimento Institucional implantado	plano				1,00	1.424.090,00			4.284.000,00
COMPONENTE 3: OUTROS									
COMPONENTE 4: Conexões à rede (Fundo Espanhol)									
Instalações intradomiciliares construídas	instalações				15.610,00				4.500.000,00
Ligações domiciliares à rede pública de esgoto instaladas	Domicílios				15.610,00				500.000,00
COMPONENTE 5: Viabilidade social (Fundo Espanhol)									
Folhetos distribuídos para a população de Manaus	folhetos				90.000,00				860.000,00
Placas de publicidade da campanha de sensibilização confeccionadas	placas				27,00				291.000,00
Folhetos distribuídos aos beneficiários da doação	folhetos				93.000,00				25.000,00
Reuniões com líderes comunitários realizadas	reuniões				42,00				9.000,00

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1164 - Social and Environmental Program for the Manaus' Igarapés - PROSAMIM II
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 08/03/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Visistas de assistentes sociais realizadas	visitas				15.610,00				15.000,00
COMPONENTE 6: OUTROS (Fundo Espanhol)									
TOTAL						47.600.370,00	19.679.000,00		206.125.010,00
