
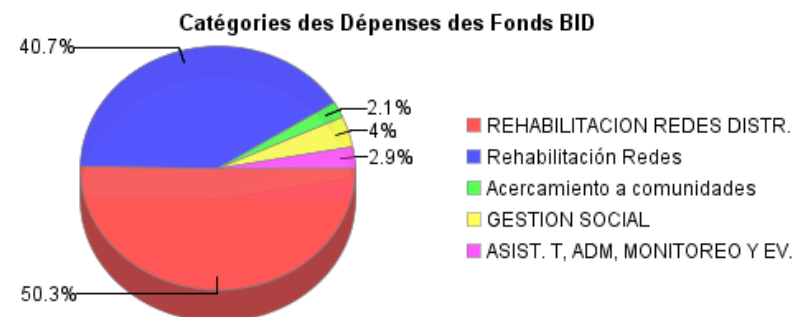
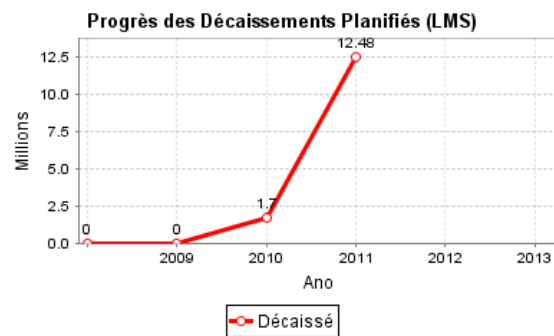



## Rapport Résumé

| Données Générales         |  | Fonds Disponibles (US\$)    |               | Coût Total et Source de Financement |               |
|---------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Agence d' Exécution (EA): | CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD |                             |               |                                     |               |
| Secteur:                  | ENERGY-POWER DISTRIBUTION              |                             |               |                                     |               |
| Numéro(s) de Prêt(s):     | 2042/OC-DR                             | Montant Courant Approuvé:   | 40.000.000,00 | Initial BID:                        | 40.000.000,00 |
| Étape:                    | Approved                               | Montant Décaissé à ce Jour: | 12.482.580,26 | Courant BID:                        | 40.000.000,00 |
| Type d' Opération:        | INV - Investissement                   | % Décaissé:                 | 31,21         | Pari Passu:                         | 76,00         |
| Opération(s) Connexe(s):  |  | Solde:                      | 27.517.419,74 | Cofinancement/Pays:                 | 12.730.000,00 |
| Sous-Type de l'Opération: | ESP - Specific Investment Operation    |                             |               | Estimation Initiale:                | 52.730.000,00 |
|                           |  |                             |               | Période d'Amortissement (mois):     | 240           |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet  | Reformulation   | Validation   |
|---|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: | B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 18-abr-2012<br>Validé par le Représentant: 23-abr-2012 |

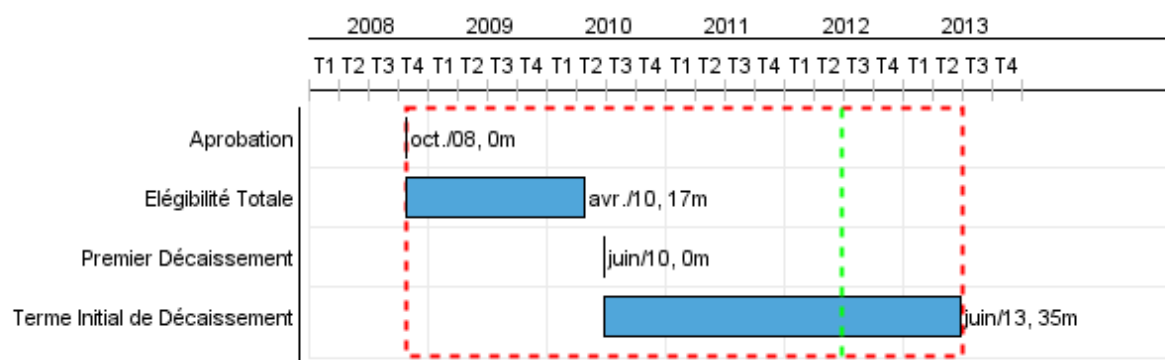

## Progrès Cumulé à 2011

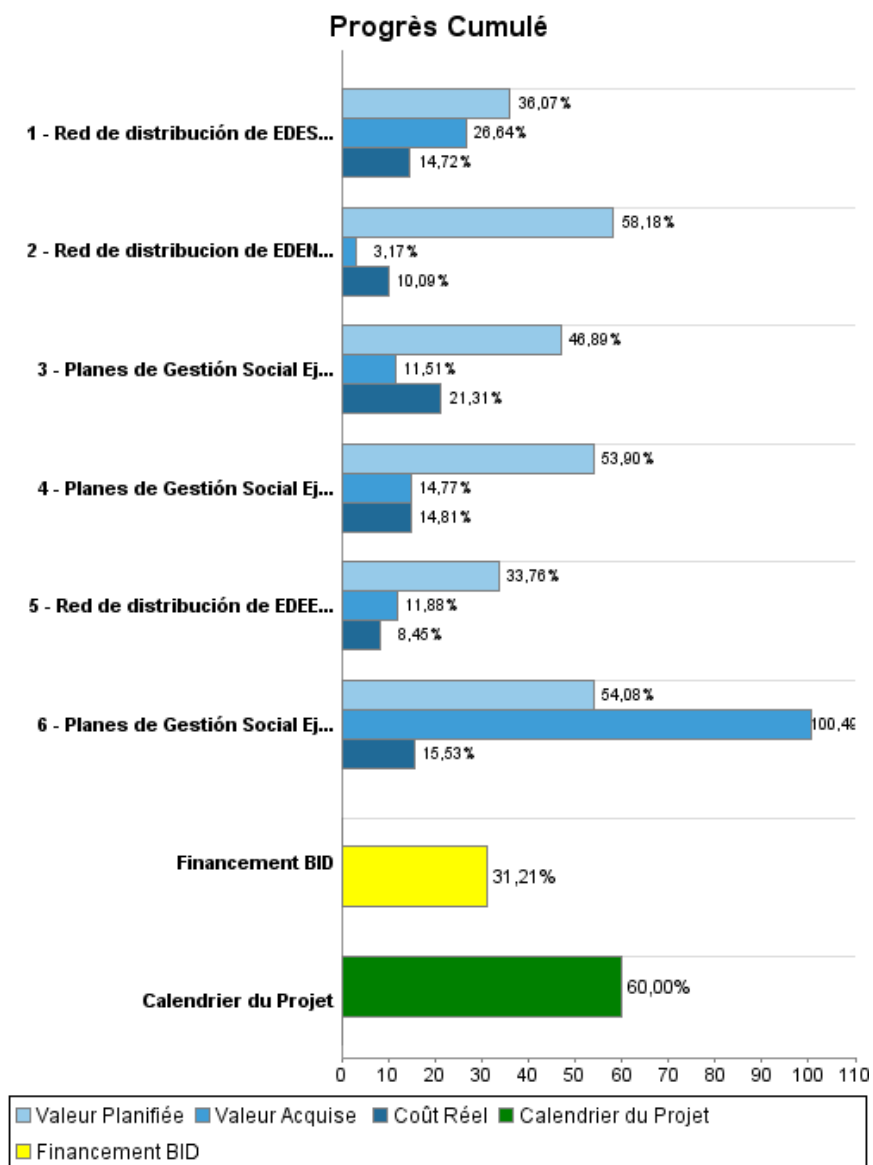

## Résultats

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Résultat:</b> | Eficiencia mejorada |
|------------------|---------------------|

| Indicateur                                      | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |   | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Indice de recaudación EdeNorte                  | %               | 89.45         | 2009                | P | 90.06 | 94.00 | 89.90 | 94.30 | 94,30         |
|   |                 |               |                     | A | 89.20 | 86.90 |       |       |               |
| Indice de Recaudación EdeSur                    | %               | 92.48         | 2009                | P | 93.16 | 97.46 | 93.70 | 95.50 | 95,50         |
|   |                 |               |                     | A | 91.10 | 91.70 |       |       |               |
| Indice de Recaudación EdeEste                   | %               | 94.76         | 2009                | P | 93.60 | 94.40 | 91.90 | 93.90 | 93,90         |
|   |                 |               |                     | A | 91.30 | 88.90 |       |       |               |
| Porcentaje de pérdidas EdeNorte                 | %               | 27.10         | 2009                | P | 23.75 | 25.00 | 29.90 | 27.00 | 27,00         |
|   |                 |               |                     | A | 32.30 | 32.90 |       |       |               |
| Porcentaje de pérdidas EdeSur                   | %               | 22.51         | 2009                | P | 18.38 | 28.18 | 27.60 | 24.90 | 24,90         |
|   |                 |               |                     | A | 32.20 | 30.60 |       |       |               |
| Porcentaje de pérdidas EdeEste                  | %               | 44.32         | 2009                | P | 42.20 | 35.20 | 32.00 | 29.70 | 29,70         |
|   |                 |               |                     | A | 39.90 | 36.00 |       |       |               |
| Indice de recuperacion de efectivo CRI EdeNorte | %               | 65.21         | 2009                | P | 68.67 | 70.50 | 62.30 | 68.80 | 68,80         |
|   |                 |               |                     | A | 60.40 | 58.30 |       |       |               |
| Indice de recuperacion de efectivo CRI EdeSur   | %               | 66.92         | 2009                | P | 76.04 | 70.00 | 66.60 | 71.70 | 71,70         |
|   |                 |               |                     | A | 60.90 | 63.60 |       |       |               |
| Indice de recuperacion de efectivo CRI, EdeEste | %               | 52.76         | 2009                | P | 54.10 | 61.20 | 60.90 | 66.00 | 66,00         |
|   |                 |               |                     | A | 54.90 | 56.90 |       |       |               |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Résultat:</b> | Disponibilidad de energía a nivel nacional incrementada |
|------------------|---|

| Indicateur  | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |   | 2010 | 2011     | 2012     | 2013     | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|---|------|----------|----------|----------|---------------|
| Promedio ponderado anual de horas de servicio en EdeNORTE | horas           | 7,264.00      | 2009                | P |      | 6,588.00 | 7,096.00 | 7,884.00 | 7.884,00      |
|   |                 |               |                     | A |      | 7,131.00 |          |          |               |
| Promedio ponderado anual de horas de servicio EdeSUR      | horas           | 6,701.00      | 2010                | P |      | 5,832.00 | 7,008.00 | 7,884.00 | 7.884,00      |
|   |                 |               |                     | A |      | 6,684.00 |          |          |               |
| Promedio ponderado anual de horas de servicio EdeEste     | horas           | 5,586.00      | 2009                | P |      | 6,760.00 | 6,920.00 | 7,884.00 | 7.884,00      |
|   |                 |               |                     | A |      | 7,017.00 |          |          |               |

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

| Description   | Unité de Mesure | Physique |       |                 |            | Financier            |                     |                |                      |
|---|-----------------|----------|-------|-----------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
|   |                 | Planifié | Réel  | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié             | Réel                | Coûts Cumulées | Coûts FDP            |
| <b>Rehabilitación de redes de distribución</b>                    |                 |          |       |                 |            |                      |                     |                |                      |
| Red de distribución de EDENORTE rehabilitada                      | Kilómetros      | 121,60   | 8,00  |                 | 300,00     | 8.955.000,00         | 1.875.000,00        |                | 18.590.000,00        |
| Red de distribución de EDESUR rehabilitada                        | Kilómetros      | 46,00    | 47,00 |                 | 163,00     | 3.585.000,00         | 2.024.000,00        |                | 13.750.000,00        |
| Red de distribución de EDEESTE rehabilitada                       | Kilómetros      | 16,00    | 8,00  |                 | 90,00      | 3.346.000,00         | 1.190.000,00        |                | 14.080.000,00        |
| <b>Resumen Gestión Social por empresa distribuidora</b>           |                 |          |       |                 |            |                      |                     |                |                      |
| Planes de Gestión Social Ejecutados EdeNorte                      | planes          | 5,00     | 2,00  |                 | 6,00       | 421.440,00           | 306.000,00          |                | 1.464.000,00         |
| Planes de Gestión Social Ejecutados EdeSur                        | planes          | 4,00     | 10,00 |                 | 12,00      | 440.130,00           | 160.000,00          |                | 1.095.000,00         |
| Planes de Gestión Social Ejecutados EdeEste                       | planes          | 6,00     | 3,00  |                 | 7,00       | 331.190,00           | 162.000,00          |                | 1.121.000,00         |
| <b>Asistencia técnica, administración, monitoreo y evaluación</b> |                 |          |       |                 |            |                      |                     |                |                      |
| <b>TOTAL</b>  |                 |          |       |                 |            | <b>17.078.760,00</b> | <b>5.717.000,00</b> |                | <b>50.100.000,00</b> |
