
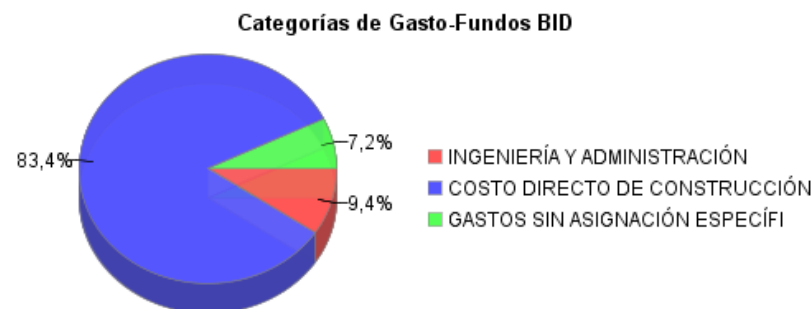
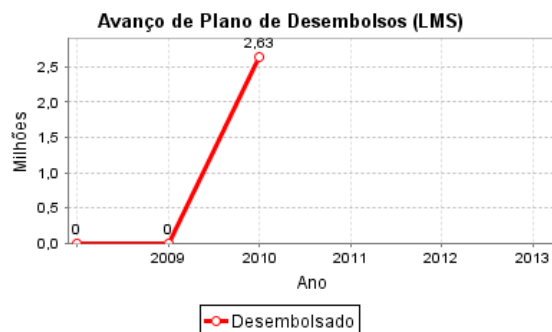



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.				
Sector:	ENERGY-POWER LINES				
Número da Operação:	2024/OC-PN	Atual:	12.500.000,00	Original BID:	12.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	2.632.551,58	Corrente BID:	12.500.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	21,06	Pari-passu:	100,00
Operação Relacionada:		Saldo:	9.867.448,42	Cofinanciamento/País:	12.500.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	25.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011

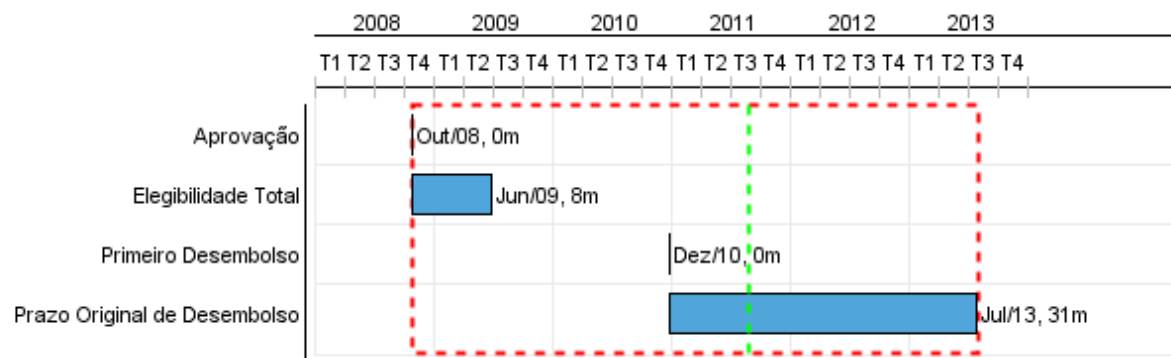

Progresso Acumulado até 2010

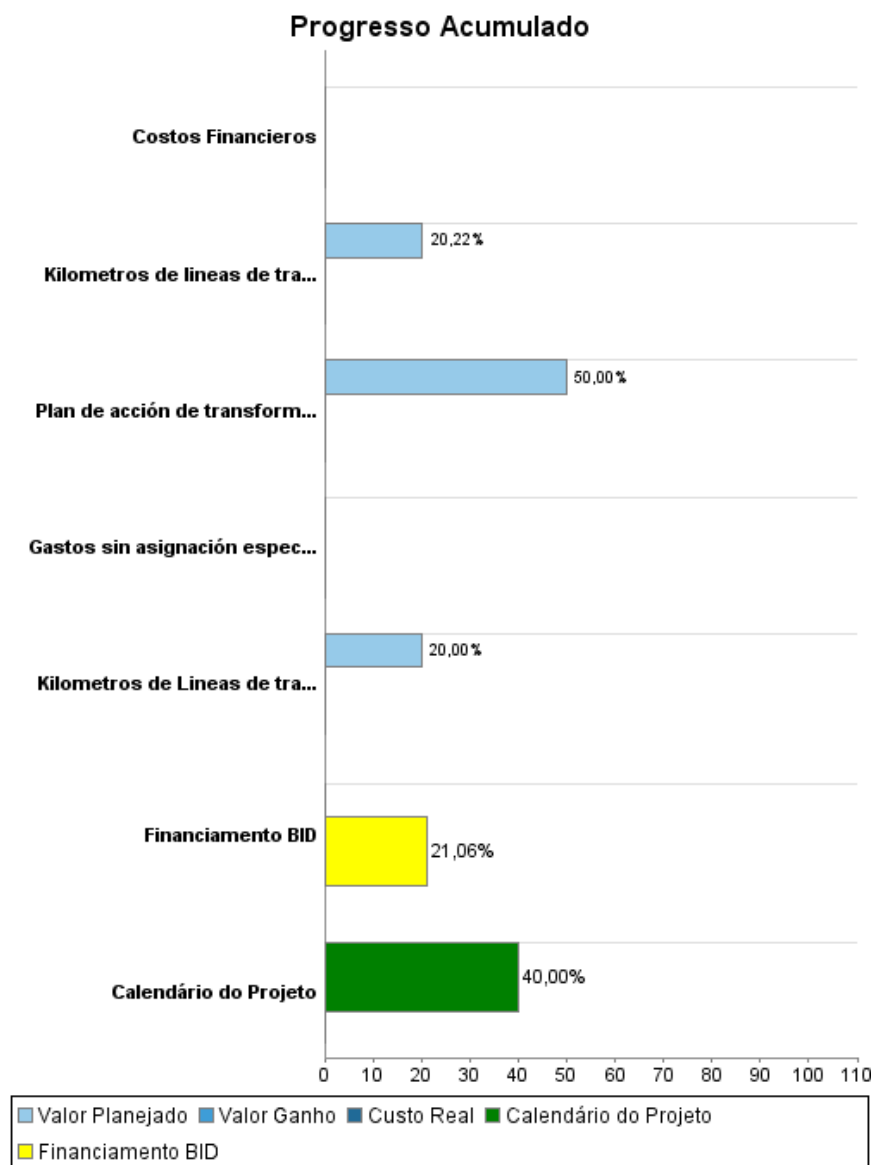

Resultados

Resultado:	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
Suposições:	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional incrementada.	Gwh	8.412,90	2008	P A	8.881,90
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional incrementada.	MW	1.356,50	2008	P A	1.431,20

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II									
Kilometros de Lineas de transmisión construidas (Proyecto Colón Fase II)	Kilometers				48,00	2.510.000,00			12.550.000,00
Componente 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers				121,00	1.826.000,00			9.030.000,00
Componente 2 - Actividades de transformación corporativa									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan				1,00	50.000,00			100.000,00
Gastos sin asignación específica	Global								1.810.000,00
Costos Financieros	Global								1.510.000,00
TOTAL						4.386.000,00			25.000.000,00
