
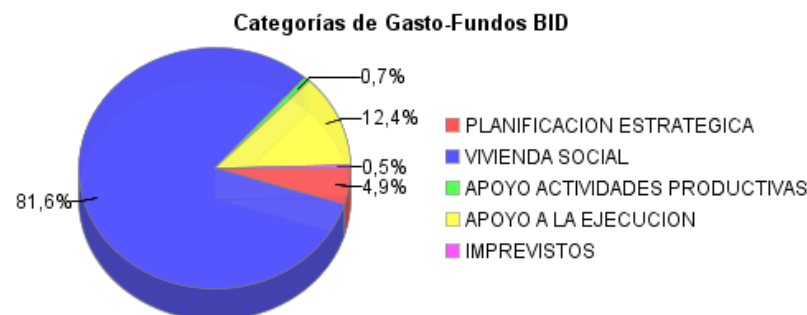
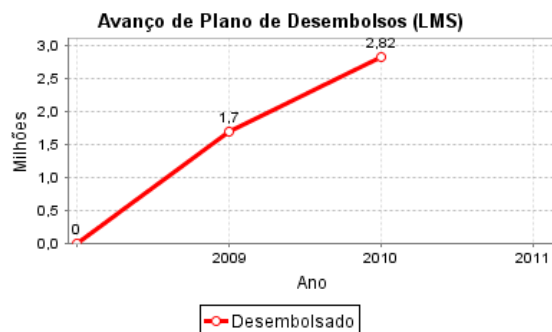



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Sector: SOCIAL INVESTMENT		
Número da Operação: 1476/OC-PN	Atual: 7.501.742,39	Original BID: 8.500.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 7.501.742,39	Corrente BID: 7.501.742,39
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 77,78
Operação Relacionada: TC0303001	Saldo:	Cofinanciamento/País: 1.500.000,00
Subtipo de Operação: INO - Innovation Operation		Original Estimado: 10.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 132

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 24, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 4, 2011

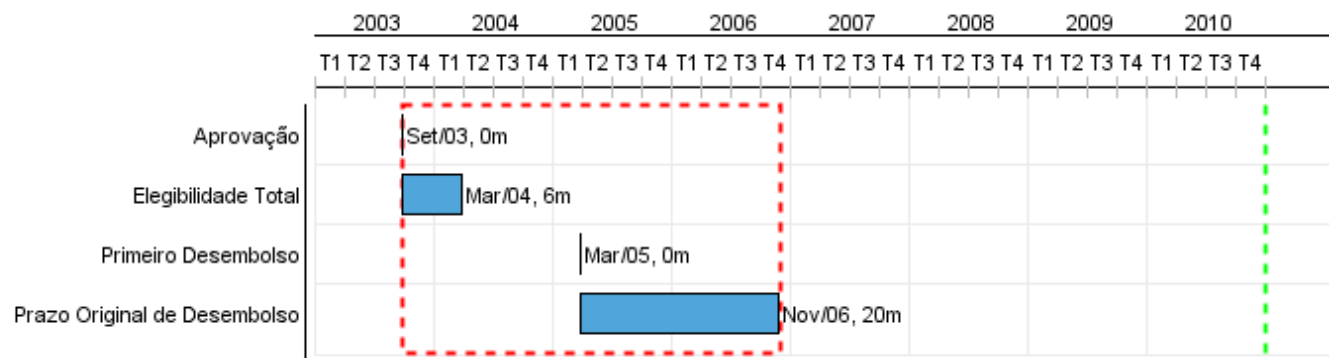

Progresso Acumulado até 2010

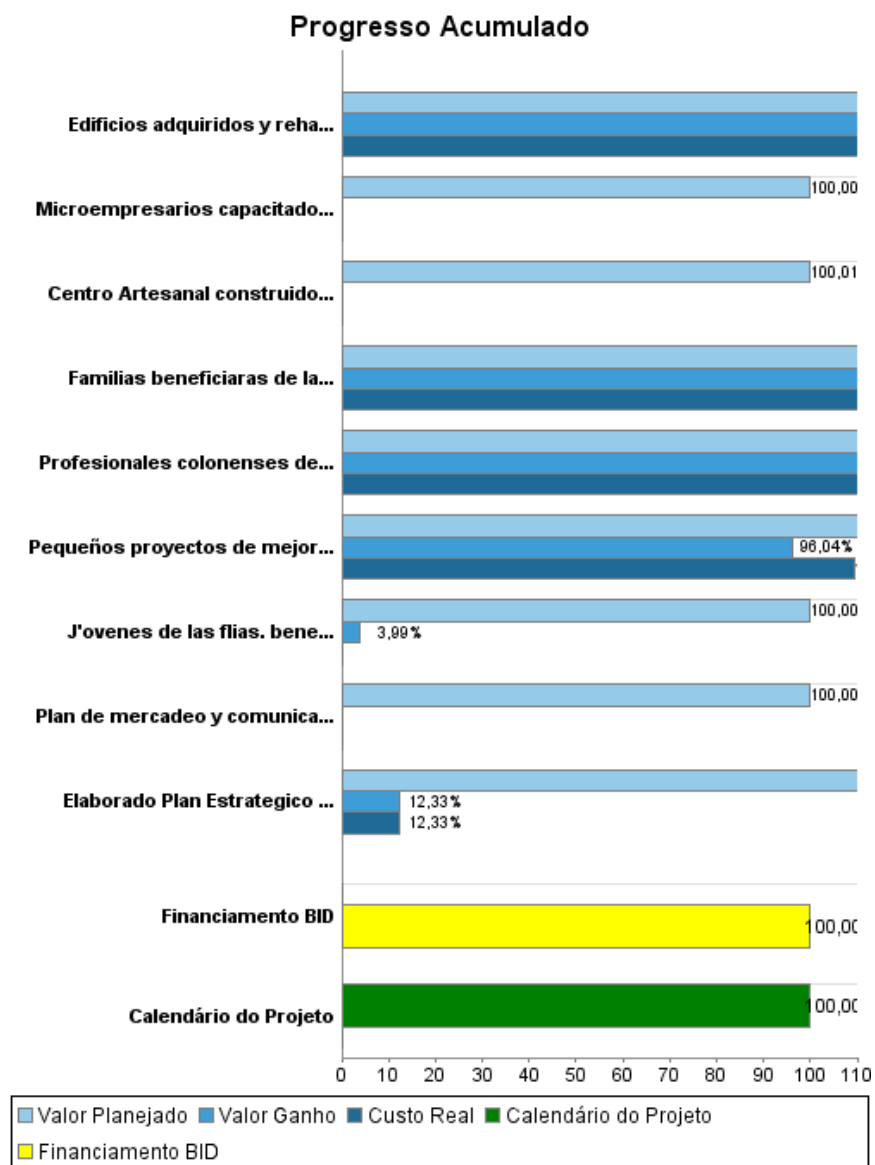

Resultados

Resultado:	Contribuir a la preservación del patrimonio histórico del Casco Urbano de la Ciudad de Colón.
Suposições:	Los habitantes de los edificios renovados preservan su inmueble y los recursos disponibles en el Fondo de Mejoramiento Urbano son utilizados de acuerdo a proyectos prioritarios.
Observações:	Se ha replanteado el marco Lógico del Proyecto y se han propuesto dos propósitos: (1) Contribuir a la preservación del patrimonio histórico del Casco urabano de Colón; y (2) Mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	Final do Projeto
El porcentaje de inmuebles históricos en el Barrio Norte de Colón en estado de deterioro se reduce.	% de inmuebles	40,00	2003	P	40,00	35,00
				A		
70% de los proyectos presentados al Fondo de Inversiones ejecutados.	% de proyectos		2006	P	70,00	70,00
				A	100,00	

Resultado:	Mejorar las condiciones de las familias beneficiarias.
Suposições:	La tasa de inflación (incremento en el costo de la vida) es razonable y el mercado de empleo en Colón es favorable.
Observações:	Se ha replanteado el marco Lógico del Proyecto y se han propuesto dos propósitos: (1) Contribuir a la preservación del patrimonio histórico del Casco urabano de Colón; y (2) Mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	Final do Projeto
Familias beneficiarias perciben una mejora en sus condiciones de vida como impacto del proyecto.	% familias		2006	P	80,00	80,00
				A	52,00	
Familias beneficiarias al corriente con sus pagos de arrendamiento y créditos a seis meses de haber sido reubicadas en los inmuebles renovados.	% de familias		2006	P	90,00	90,00
				A	10,00	
Familias beneficiarias con acceso lícito y al corriente de sus pagos de servicios de electricidad, agua potable y gas a un año de finalizar el proyecto.	% familias		2006	P	80,00	80,00
				A	55,00	
Jóvenes de las familais beneficiarias que se capacitaron laboralmente y que obtuvieron un empleo al final del proyecto.	% jóvenes		2006	P	70,00	70,00
				A	46,00	
Jóvenes de las familais beneficiarias del Proyecto capacitados (laboralmente o como auto-emprendedores) son certificados por el Minsiterio de Trabajo y Desarrollo Laboral al final del proyecto.	% jóvenes	80,00	2006	P	80,00	80,00
				A	73,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Planificación Estratégica.									
Elaborado Plan Estratégico para el Desarrollo de la Ciudad.	Plan Estratégico				100,00		37.000,00		300.100,00
Plan de mercadeo y comunicación del proyecto y del Plan Estratégico elaborado y ejecutado.	Plan de Mercadeo				100,00				150.000,00
Pequeños proyectos de mejoramiento urbano formulados y ejecutados con financiamiento del Fondo de Mejoramiento Urbano.	Proyectos		8,00		7,00		329.000,00		350.000,00
Vivienda Social									
Edificios adquiridos y rehabilitados.	Edificios		7,00		8,00		5.685.000,00		5.239.330,00
Familias beneficiarias de las acciones de acompañamiento social.	familias		298,00		250,00		644.000,00		600.000,00
Apoyo al desarrollo de actividades productivas.									
J'ovenes de las flías. beneficiarias reciben capacitacion laboral y son certificados.	jovenes capacitados y certificados				160,00				145.000,00
Microempresarios capacitados en Gestion Empresarial.	microempresarios				100,00				145.000,00
Profesionales colonenses del sector publico capacitados en gestion y formulacion de proyectos.	profesionales		22,00		25,00		55.170,00		55.170,00
Centro Artesanal construido, equipado y prestando servicios a la poblaci'onde artesanso y microempresarios residentes o que trabajan en el Casco urbano de la Ciudad de Col'on..	Centro Artesanal				100,00		4,00		50.000,00
TOTAL							6.750.174,00		7.034.600,00
