
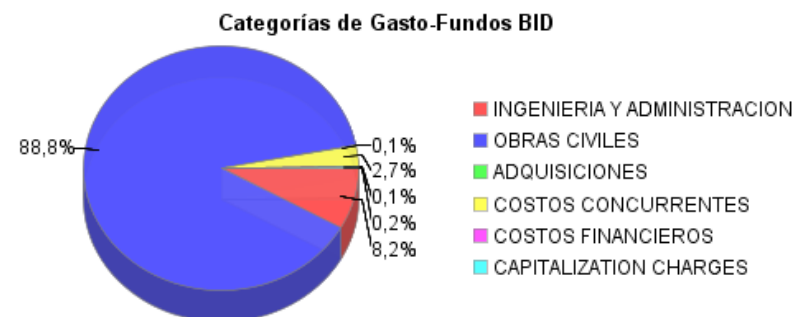
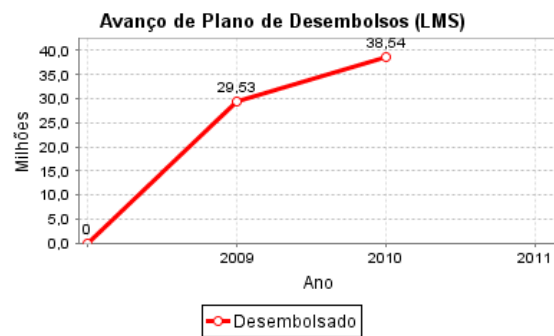



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES				
Sector:	TRANSPORTATION-MAJOR HIGHWAYS				
Número da Operação:	1278/OC-PR-2;1278/OC-PR-1;1278/OC-PR-1-CPS ;1278/OC-PR-2-CPS	Atual:	99.615.396,27	Original BID:	200.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	99.615.396,27	Corrente BID:	99.615.396,27
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	83,62
Operação Relacionada:		Saldo:		Cofinanciamento/País:	30.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	230.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	168

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 26, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011

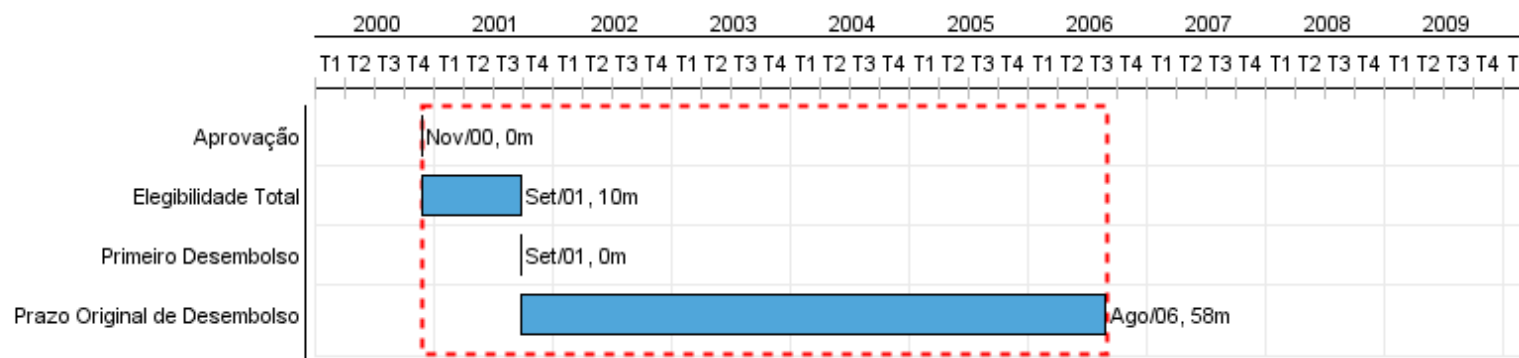

Progresso Acumulado até 2010

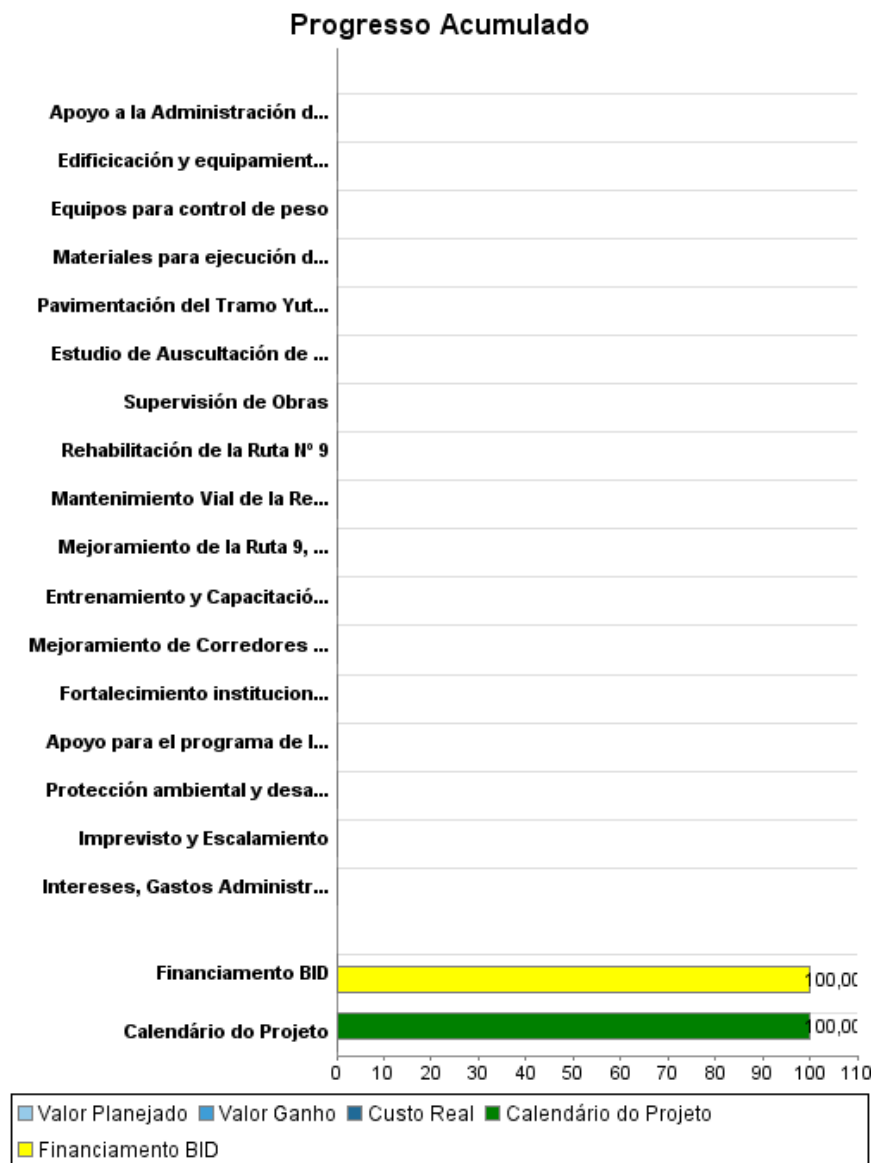

Resultados

Resultado:	Reducir los costos de transportes y tiempos de viaje de las áreas de producción agrícola y pecuaria de la Región Occidental del Chaco hasta Asunción y las fronteras con Bolivia, Argentina y Brasil
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	Final do Projeto
El volúmen de tráfico de la Ruta 9 aumentará en 30%	%	100,00	2001	P A	130,00	130,00
Los costos de flete de transporte en la ruta N°9 se reducirán en términos reales 20%	%	100,00	2001	P A	80,00	80,00
El tiempo de viaje de la Ruta N°9 hasta la patria se reducirán en 50%	%	100,00	2001	P A	60,00	60,00
Los accidentes en la Ruta N°9 se reducirán en 50%	%	100,00	2001	P A	50,00	50,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN									
Apoyo a la Administración del Programa	Consultorías		1,00		12,00		455.471,00		
Supervisión de Obras	Nº de Obras fiscalizadas				12,00		11.685.803,00		
Estudio de Auscultación de Pavimentos	Consultoría				1,00		199.717,00		
OBRAS CIVILES									
Rehabilitación de la Ruta Nº 9	km				495,00		19.361.003,00		
Mejoramiento de la Ruta 9, tramo Mcal Estigarribia - La Patria	km				123,00		31.667.215,00		
Mejoramiento de Corredores de Integración de la Región Occidental	km				647,00		71.895.588,00		
Mantenimiento Vial de la Región Occidental	km				2.000,00		11.412.521,00		
Edificación y equipamiento de Casetas de Control de peso, y Sedes Distritales	obras				4,00		3.189.067,00		
Pavimentación del Tramo Yuty-Leandro Oviedo (Ruta 8)	km				14,00		3.375.957,00		
ADQUISICIONES									
Equipos para control de peso	equipo				2,00				
Materiales para ejecución de tramos piloto	etapas de impl ementación del convenio		1,00		3,00				
GASTOS CONCURRENTES									
Entrenamiento y Capacitación de personal	Grupos fortalecidos				3,00				
Protección ambiental y desarrollo de comunidades	hectáreas				12.000,00		824.445,00		
Fortalecimiento institucional y asesoramiento	personal incremental para la DV						800.416,00		
Apoyo para el programa de Investigación del Tramo Piloto	consultorías				1,00		33.427,00		
Imprevisto y Escalamiento	-								
GASTOS FINANCIEROS									
Intereses, Gastos Administrativos, Comisión de Crédito y gastos de inspección y Vigilancia.	-						12.190.195,00		
TOTAL							167.090.825,00		
