
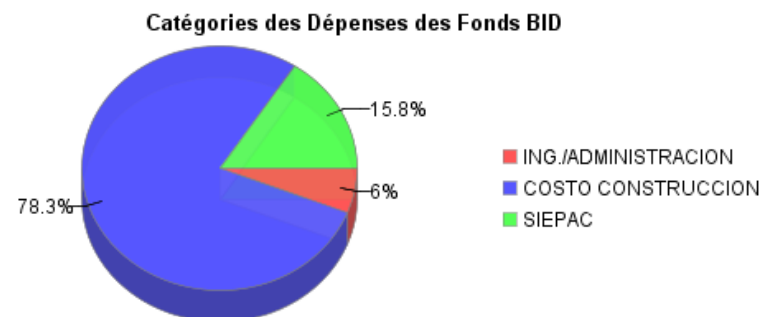
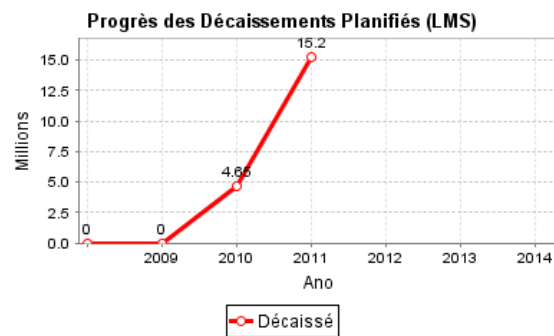



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		
Secteur:	ENERGY-POWER LINES		
Numéro(s) de Prêt(s):	2016/BL-HO	Montant Courant Approuvé:	28.550.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	15.201.467,27
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	53,25
Opération(s) Connexe(s):	HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039	Solde:	13.348.532,73
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	28.550.000,00
		Courant BID:	28.550.000,00
		Pari Passu:	91,00
		Cofinancement/Pays:	2.760.000,00
		Estimation Initiale:	31.310.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 18-abr-2012
		Validé par le Représentant: 26-abr-2012

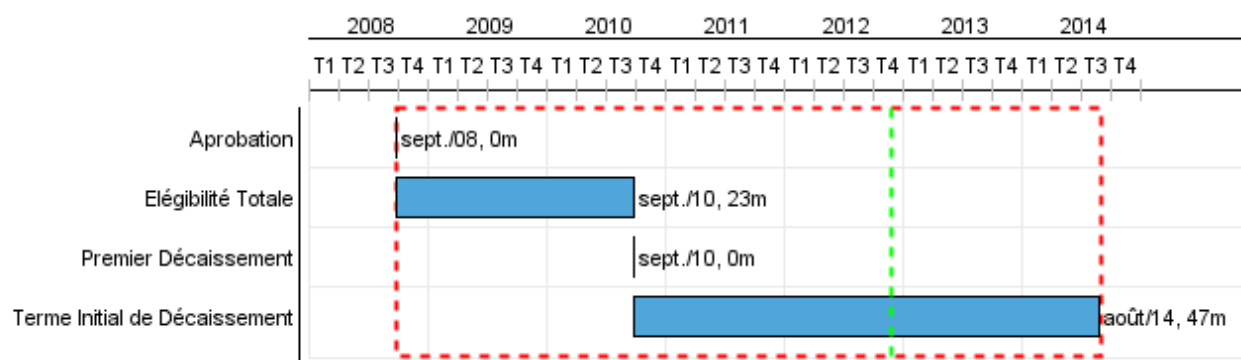

## Progrès Cumulé à 2011

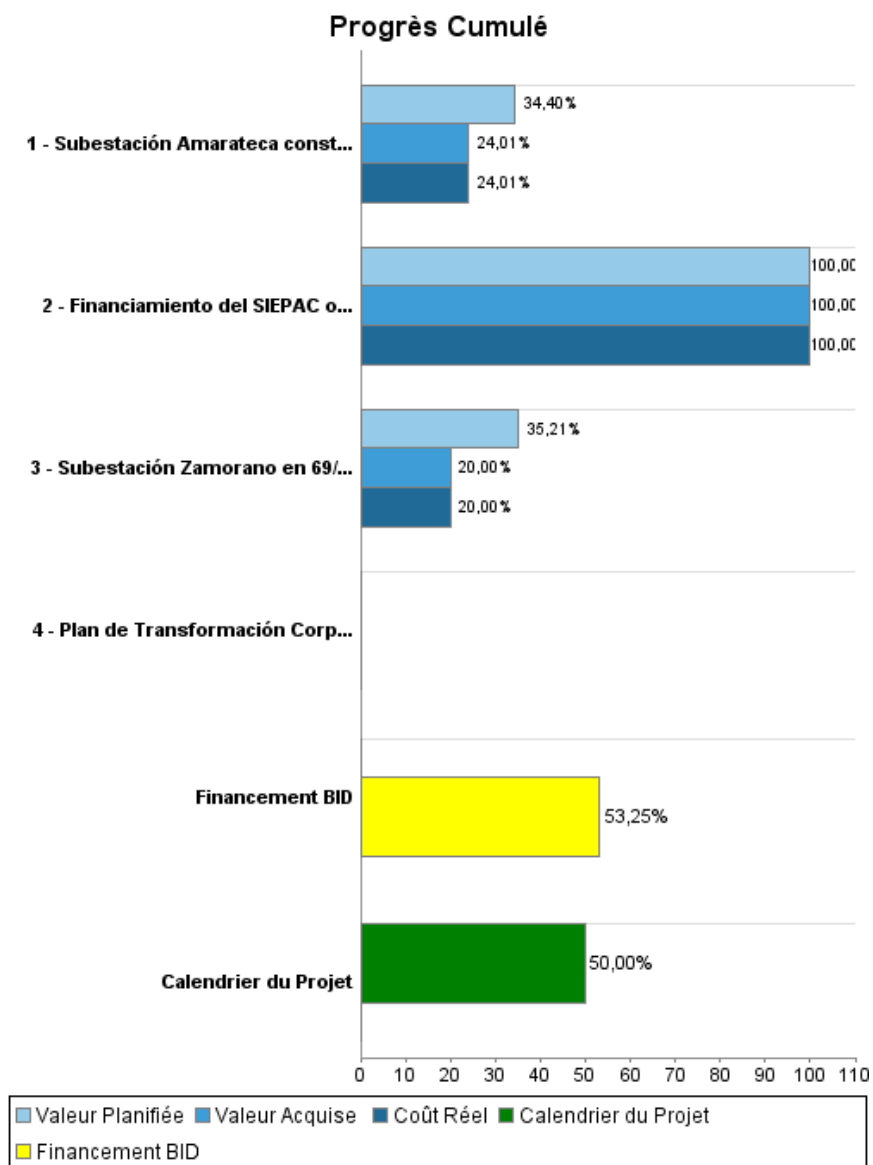

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Incremento de la energía servida en las zonas de influencia de los proyectos
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Electricidad suministrada al nivel de 138 kv por los refuerzos en Amarateca	MW		2007	P A	132,10
Electricidad suministrada al nivel de 69 kv por la Subestación del Zamorano	MW	6.40	2007	P A	8,40

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Composante 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.</b>									
Subestación Amarateca construida y en operación	Subestación				1,00	7.000.000,00	4.884.525,82		20.346.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación				1,00	440.300,00	250.102,80		1.250.500,00
<b>Composante 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.</b>									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00				750.000,00
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia				1,00				4.500.000,00
<b>Gestión del Programa</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>7.440.300,00</b>	<b>5.134.628,62</b>		<b>26.846.500,00</b>
