
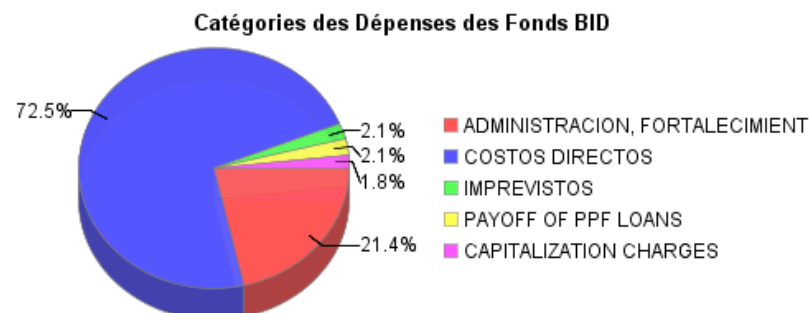
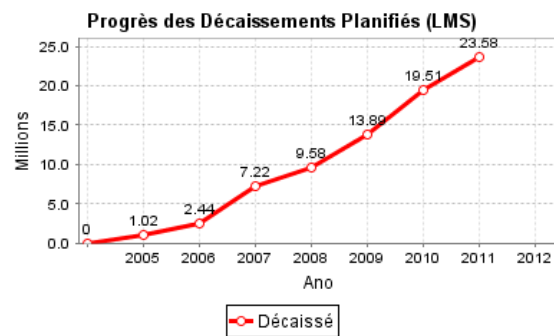



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Secretaría de Turismo - SECTUR		
Secteur:	TOURISM		
Numéro(s) de Prêt(s):	1623/SF-HO	Montant Courant Approuvé:	35.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	23.576.151,57
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	67,36
Opération(s) Connexe(s):	TC0301053	Solde:	11.423.848,43
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	35.000.000,00
		Courant BID:	35.000.000,00
		Pari Passu:	86,00
		Cofinancement/Pays:	5.850.000,00
		Estimation Initiale:	40.850.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	354


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 29-mar-2012
		Validé par le Représentant: 26-abr-2012

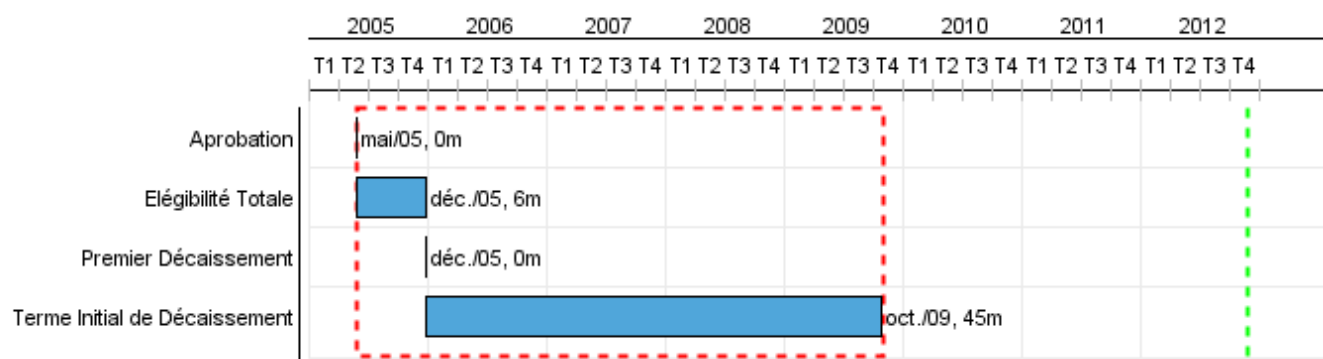

Progrès Cumulé à 2011

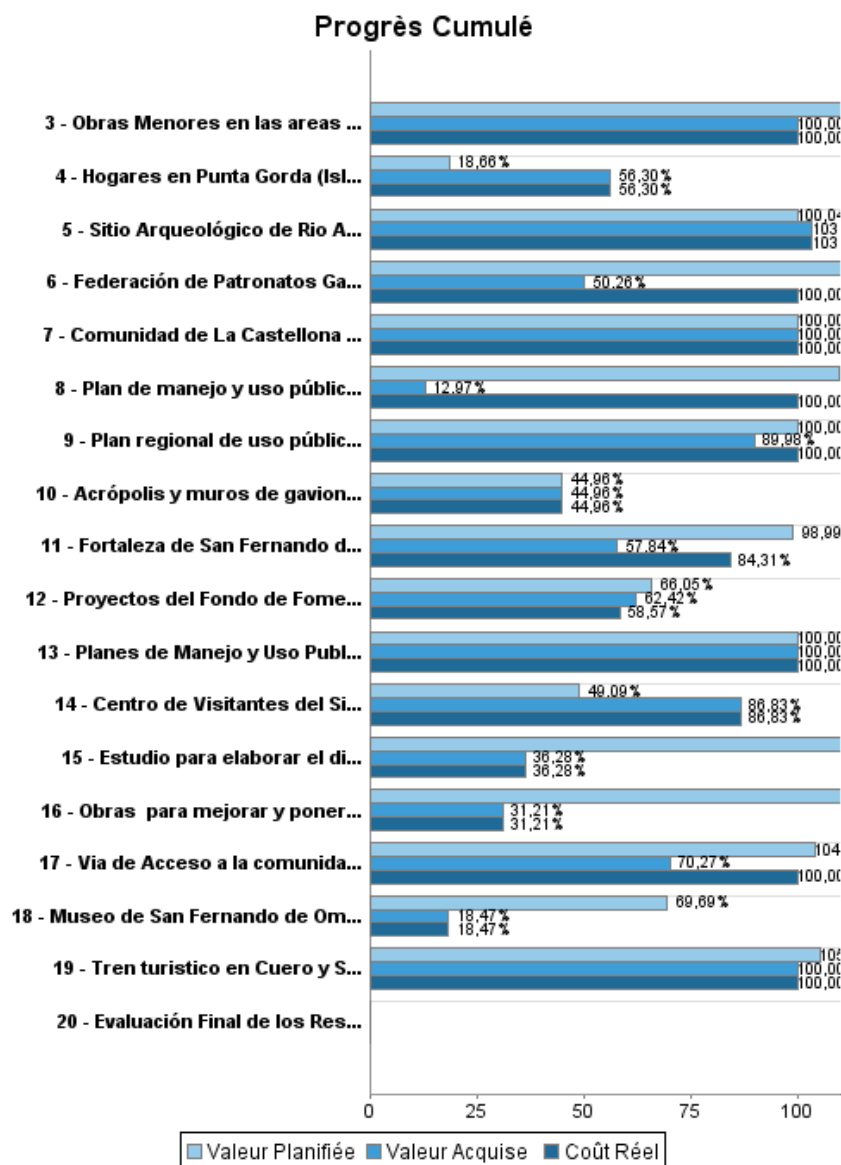

Progrès Cumulé

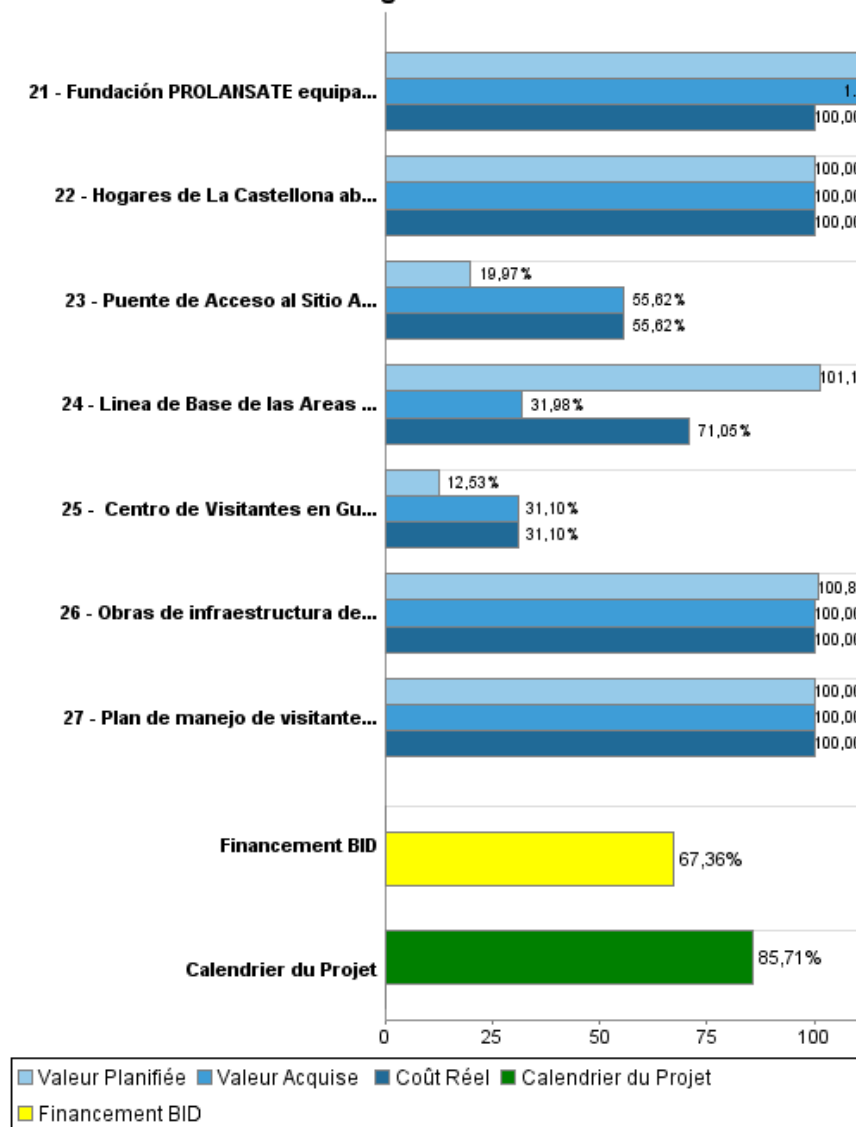

Résultats

Résultat:	Actividad Turística en Honduras Incrementada.
Suposições:	1. Autoridades mantienen la voluntad política para continuar apoyando el desarrollo del sector. 2. Agentes privados muestran interés de invertir en las zonas beneficiadas. 3. Existe coordinación entre las instituciones, municipalidades y comunidades en las intervenciones del Programa. 4. Las comunidades beneficiarias participan y se apropian de los proyectos en sus localidades.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Visitantes totales anuales logrados.	Visitantes	1,025,500.00	2004	P	1,300,000.00	1,550,000.00	1,700,000.00	1,850,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
				A	1,336,600.00	1,611,200.00		2,214,300.00		
Gasto promedio ponderado del turista receptor alcanzado.	Dolares Americano al año	646.00	2004	P	680.00	703.00	715.00	730.00	745.00	730.00
				A	623.40	672.30		700.60		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1: Inversiones públicas de apoyo al desarrollo del turismo sostenible/ Sub Componente 1.1: Mundo Maya									
Planes de Manejo y Uso Publico para el Parque Arqueologico en Rio Amarillo Elaborados	plan				1,00				53.760,00
Sitio Arqueológico de Rio Amarillo Restaurado	sitio arqueológico	1,00	1,00		1,00	74.630,00	74.300,00		856.540,00
Centro de Visitantes del Sitio Arqueológico en Río Amarillo construido	centro de visitantes				1,00	236.640,00	723.400,00		1.037.000,00
Puente de Acceso al Sitio Arqueologico de Rio Amarillo Rehabilitado	puente				1,00	184.500,00	513.900,00		924.000,00
Acrópolis y muros de gaviones en el Parque Arqueológico de Copan Ruinas: y techo del museo arqueológico restaurados y construidos.	obras				3,00		182.100,00		405.000,00
Vía de Acceso a la comunidad de La Castellona construida	Kilometers				2,75	141.360,00	136.400,00		1.145.000,00
Comunidad de La Castellona Electrificada	Kilometers				8,50		2.300,00		102.550,00
Hogares de La Castellona abastecidos con agua potable y saneamiento	Households				81,00				431.230,00
Plan de manejo de visitantes del Parque Arqueológico en Copan Ruinas elaborado	plan				1,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
Plan de manejo y uso público de la Fortaleza formulado	plan		1,00		1,00		11.800,00		91.000,00
Fortaleza de San Fernando de Omoa Restaurada	Fortaleza				1,00	175.240,00	107.400,00		1.421.700,00
Museo de San Fernando de Omoa Construido	museo				1,00	399.650,00	169.400,00		1.035.220,00
Componente 1: Inversiones públicas de apoyo al desarrollo del turismo sostenible/ Sub Componente 1.2: Inversiones Prioritarias de la Estrategia Nacional Turismo Sostenible (ENTS)									
Centro de Visitantes en Lancetilla acondicionado y equipado	Centro de Visitantes				1,00	240.630,00	107.800,00		599.430,00
Fundación PROLANSATE equipada.	equipamiento	1,00	21,00		21,00	43.980,00	20.200,00		76.220,00
Linea de Base de las Areas Protegidas de la Bahía de Tela Levantada	estudio	1,00			1,00	207.160,00	135.600,00		347.080,00
Estudio para elaborar el diseño constructivo de Senderos, señalizacion, torres de observación y otras obras del Jardín Botánico Lancetilla, Parque Nacional Jeannette Kaway y Parque Nacional Punta Izopo realizado	obras diseñadas		1,00		8,00	180.180,00	50.500,00		139.200,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Plan regional de uso público y mejoramiento ambiental de playas de la costa norte formulado	plan		1,00		1,00				250.050,00
Tren turístico en Cuero y Salado rehabilitado	tren				1,00		23.300,00		469.500,00
Obras Menores en las areas BC y D contenidas en el master plan paseo marítimo en Tela diseñadas	obras		1,00		1,00	265.930,00	87.000,00		158.620,00
Obras para mejorar y poner en marcha los Sistemas de Saneamiento en Islas de la Bahía diseñadas	diseño				1,00	277.790,00	52.500,00		168.200,00
Hogares en Punta Gorda (Islas de la Bahía) abastecidos de Agua Potable.	Households				500,00	65.750,00	198.400,00		352.400,00
Centro de Visitantes en Guanaja Construido	centro de visitantes				1,00	44.000,00	109.210,00		351.210,00
Escuela de Canopy en valle de Angeles Construida	Escuela de Canopy				1,00		25.200,00		159.900,00
Componente 2: Fomento de la Inversión Privada									
Obras de infraestructura de los Micos: (1) vías; (2) planta potabilizadora y redes de agua potable; (3) red de alcantarillado sanitario y planta de aguas negras; (4) red de alcantarillado construidas	obras				10,00		61.400,00		8.589.280,00
Federación de Patronatos Garífunas de Bahía de Tela Constituida	federación constituida	1,00			1,00	9.000,00	6.700,00		13.470,00
Proyectos del Fondo de Fomento al Turismo que benefician a micro, pequeñas y medianas empresas financiados	negocios	20,00	15,00		49,00	563.930,00	406.800,00		2.099.930,00
Gestión del Programa									
Evaluación Final de los Resultados e Impactos del Programados	estudio				1,00				268.000,00
TOTAL						3.140.370,00	3.235.610,00		21.575.490,00
