

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.
Secteur: ENERGY-POWER LINES
Numéro(s) de Prêt(s): 2024/OC-PN
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 12.500.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 6.675.876,63
% Décaissé: 53,41
Solde: 5.824.123,37

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 12.500.000,00
Courant BID: 12.500.000,00
Pari Passu: 50,00
Cofinancement/Pays: 12.500.000,00
Estimation Initiale: 25.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 18-abr-2012

Validé par le Représentant: 27-abr-2012

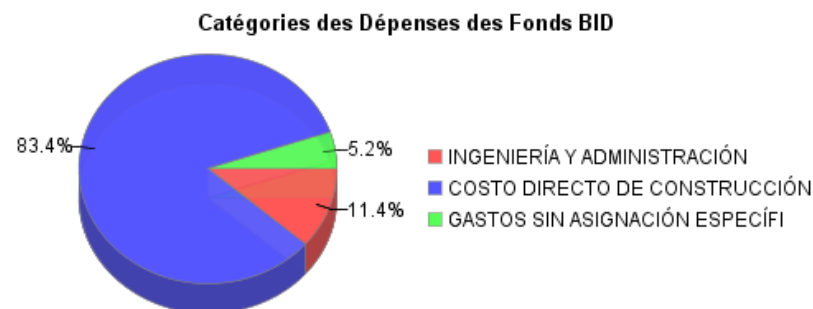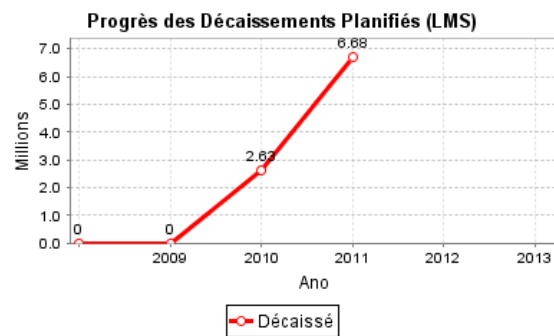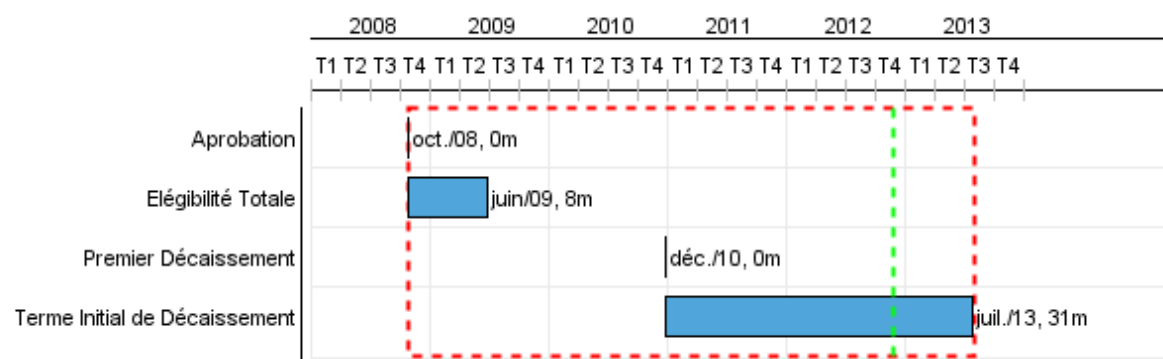

Progrès Cumulé à 2011

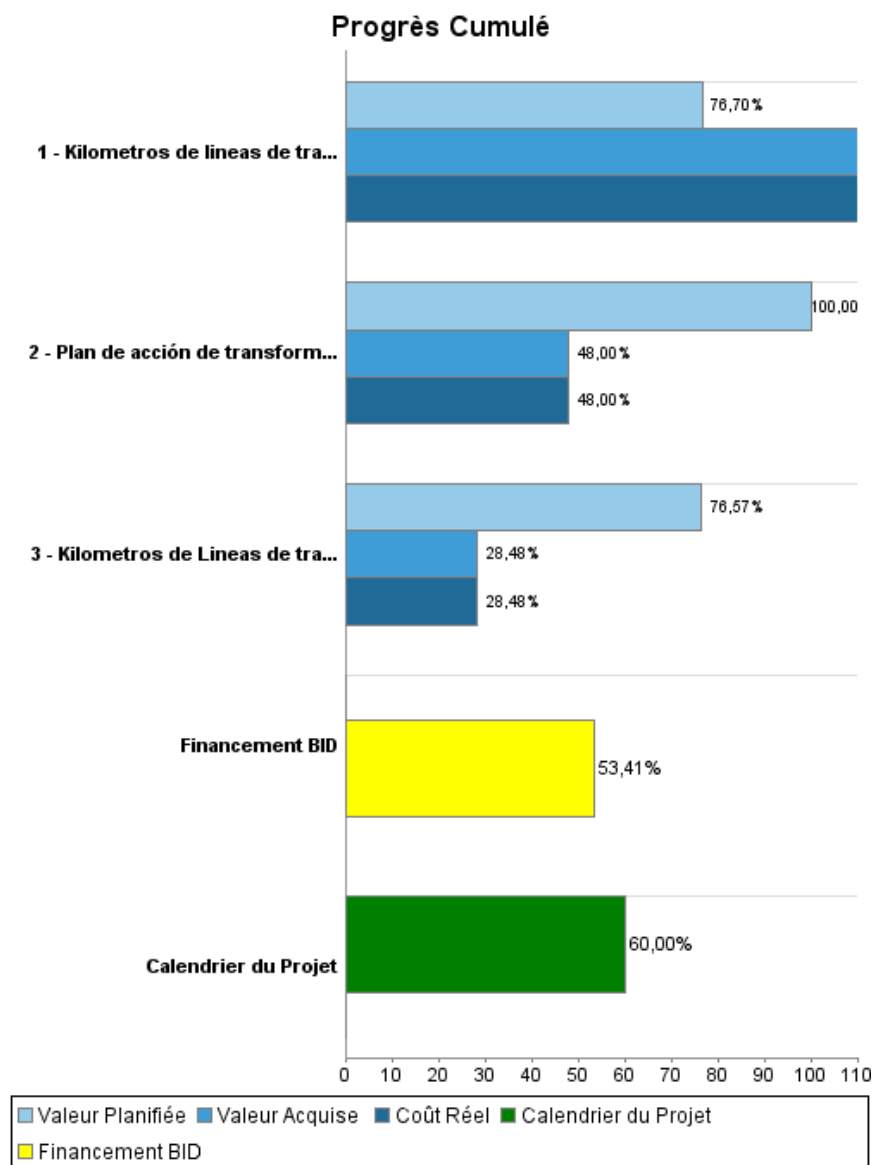

Résultats

Résultat:	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
Suposições:	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional	Gwh	8,412.90	2008	P A	8.881,90
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional.	MW	1,356.50	2008	P A	1.431,20

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II									
Kilometros de Lineas de transmisión construidas (Proyecto Colón Fase II)	Kilometers				48,00	7.100.000,00	3.574.526,00		12.550.000,00
Componente 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers		120,00		121,00	5.100.000,00	12.159.959,00		9.030.000,00
Componente 2 - Actividades de transformación corporativa									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan		0,20		1,00	50.000,00	47.998,75		100.000,00
Gastos sin Asignación Específica									
Gastos Financieros									
TOTAL						12.250.000,00	15.782.483,75		21.680.000,00
