
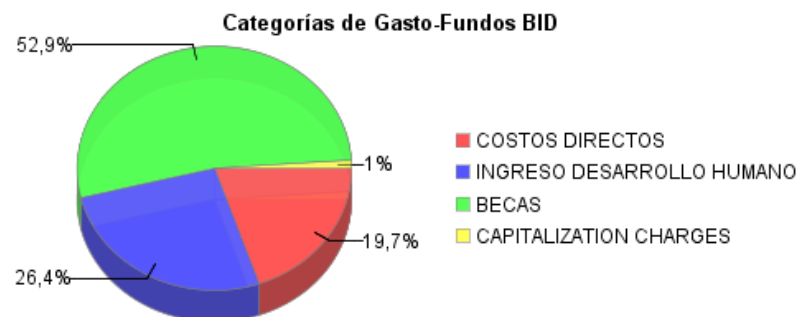
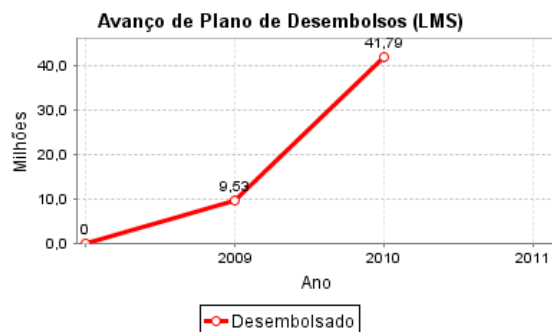



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: COMITE EJECUTOR MATANZA-RICHUELO		
Sector: WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número da Operação: 1059/OC-AR	Atual: 250.000.000,00	Original BID: 250.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 230.991.696,29	Corrente BID: 250.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 92,40	Pari-passu: 80,51
Operação Relacionada: AR0217	Saldo: 19.008.303,71	Cofinanciamento/País: 250.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 500.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 150

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 26, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 28, 2011

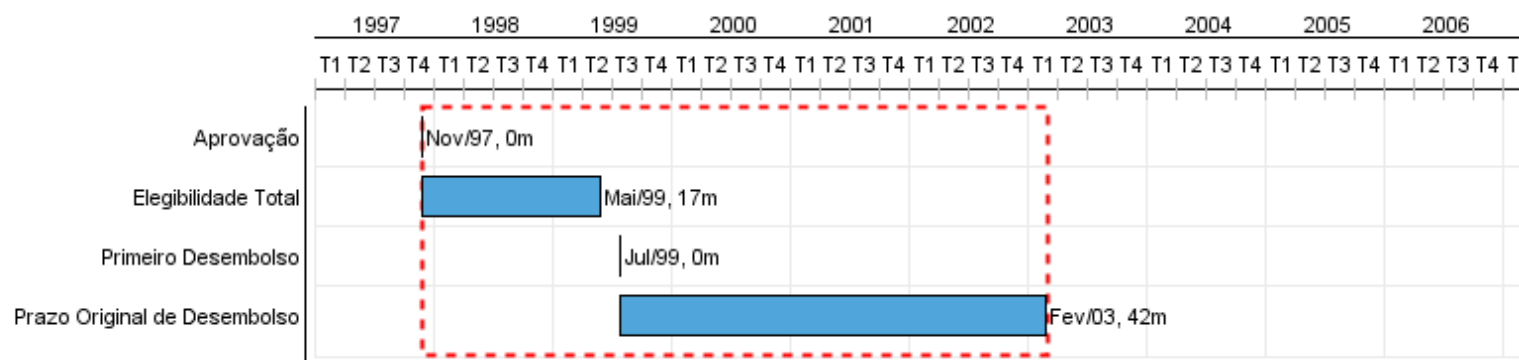

## Progresso Acumulado até 2010

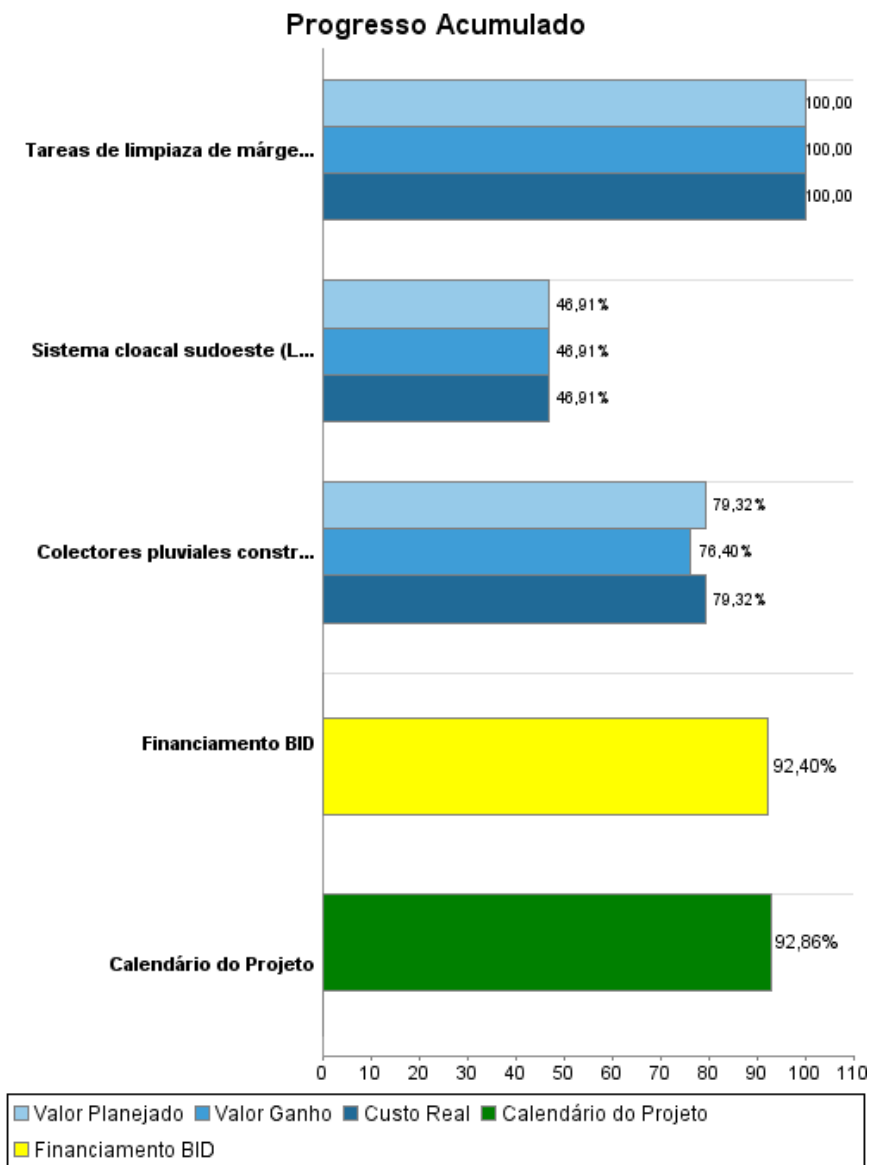

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Cobertura de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo incrementada
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Hogares con servicio de saneamiento nuevo	Hogares		2006	P A		49.000,00

<b>Resultado:</b>	Riesgo de inundaciones reducido
-------------------	---------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Habitantes beneficiados por las obras de drenaje pluvial	habitantes		2006	P A		427.000,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Obras de drenaje urbano</b>									
Colectores pluviales construídos	km	9,50	6,30		32,30	2.504.907,00	2.504.907,00		28.946.000,00
<b>Limpieza de márgenes</b>									
Tareas de limpieza de márgenes concluídas	Contratos concluídos	1,00	1,00		1,00				1.451.000,00
<b>Saneamiento cloacal</b>									
Sistema cloacal sudoeste (LaFerrere) construído	Plantas				1,00	19.719.058,00	19.719.058,00		59.498.000,00
<b>Administración, supervisión y costos financieros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>22.223.965,00</b>	<b>22.223.965,00</b>		<b>89.895.000,00</b>
