
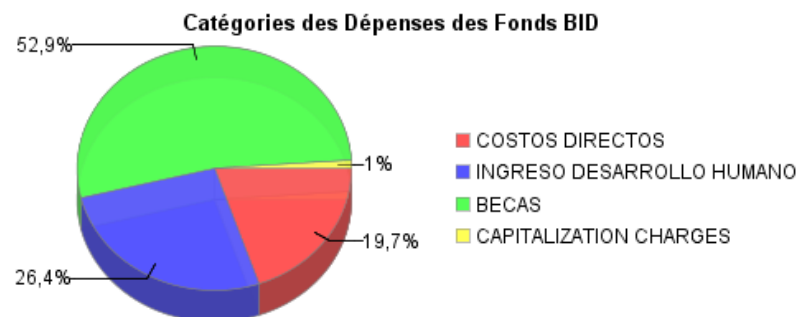
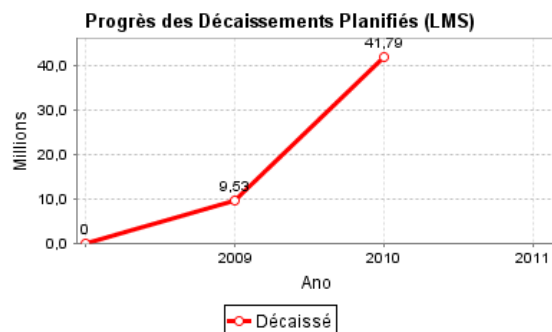



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	COMITE EJECUTOR MATANZA-RICHUELO				
Secteur:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Numéro(s) de Prêt(s):	1059/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	250.000.000,00	Initial BID:	250.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	230.991.696,29	Courant BID:	250.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	92,40	Pari Passu:	80,51
Opération(s) Connexe(s):	AR0217	Solde:	19.008.303,71	Cofinancement/Pays:	250.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	500.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	150

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Apr 26, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 28, 2011

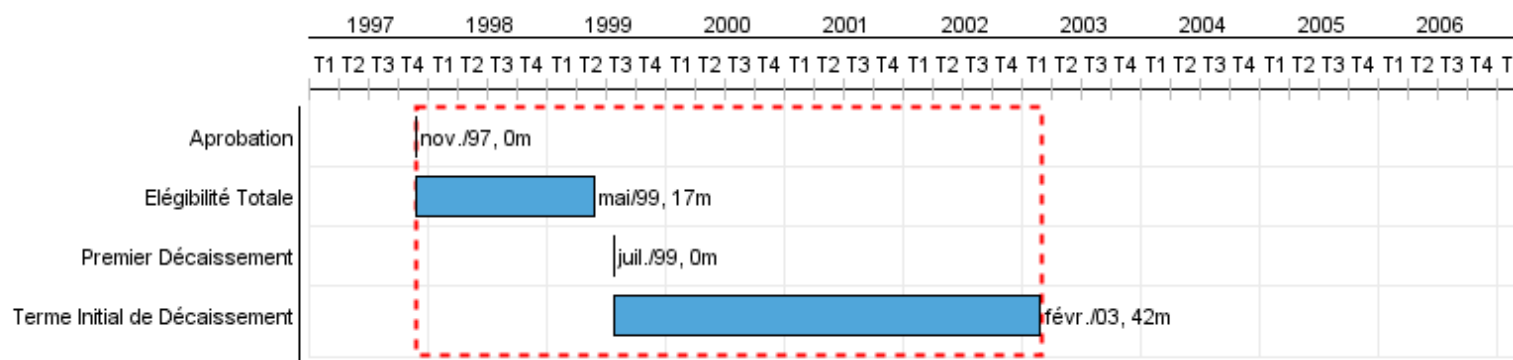

Progrès Cumulé à 2010

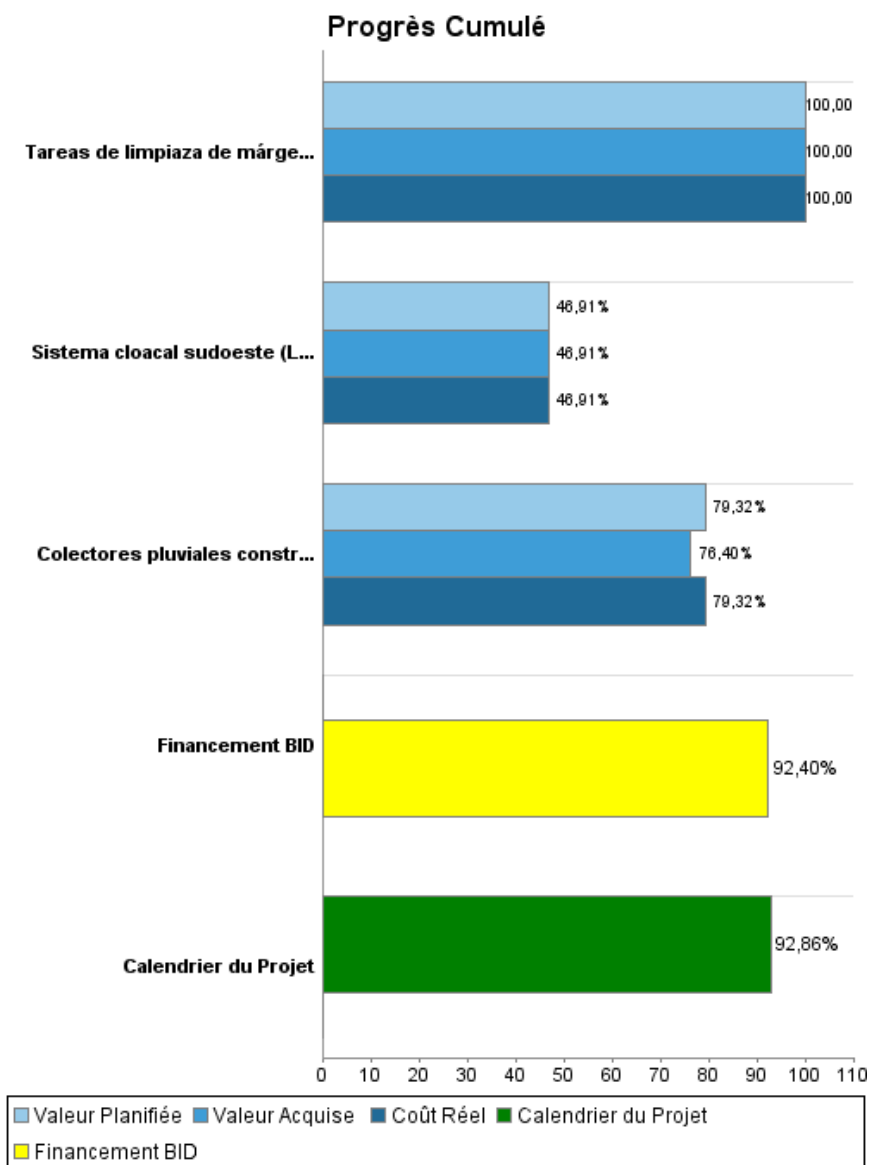

Résultats

Résultat:	Cobertura de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo incrementada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Hogares con servicio de saneamiento nuevo	Hogares		2006	P A		49.000,00

Résultat:	Riesgo de inundaciones reducido
------------------	---------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Habitantes beneficiados por las obras de drenaje pluvial	habitantes		2006	P A		427.000,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Obras de drenaje urbano									
Colectores pluviales construídos	km	9,50	6,30		32,30	2.504.907,00	2.504.907,00		28.946.000,00
Limpieza de márgenes									
Tareas de limpieza de márgenes concluídas	Contratos concluídos	1,00	1,00		1,00				1.451.000,00
Saneamiento cloacal									
Sistema cloacal sudoeste (LaFerrere) construído	Plantas				1,00	19.719.058,00	19.719.058,00		59.498.000,00
Administración, supervisión y costos financieros									
TOTAL						22.223.965,00	22.223.965,00		89.895.000,00
