
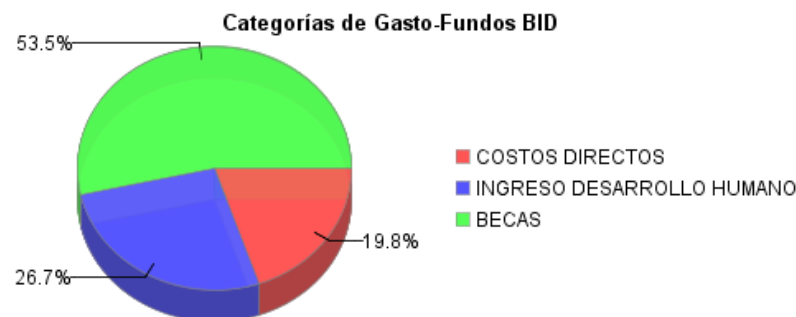
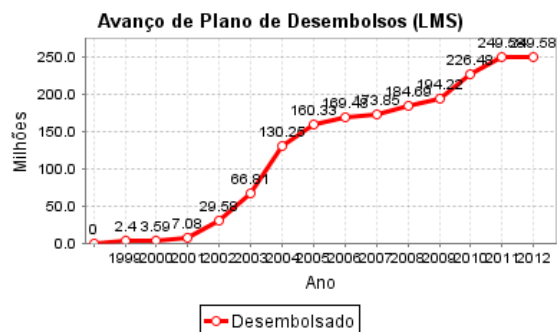



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: COMITE EJECUTOR MATANZA-RICHUELO		
Sector: WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número da Operação: 1059/OC-AR	Atual: 249.579.963,99	Original BID: 250.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 249.579.963,99	Corrente BID: 249.579.963,99
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 50,00
Operação Relacionada: AR0217	Saldo:	Cofinanciamento/País: 250.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 500.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 150

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 15-oct-2012

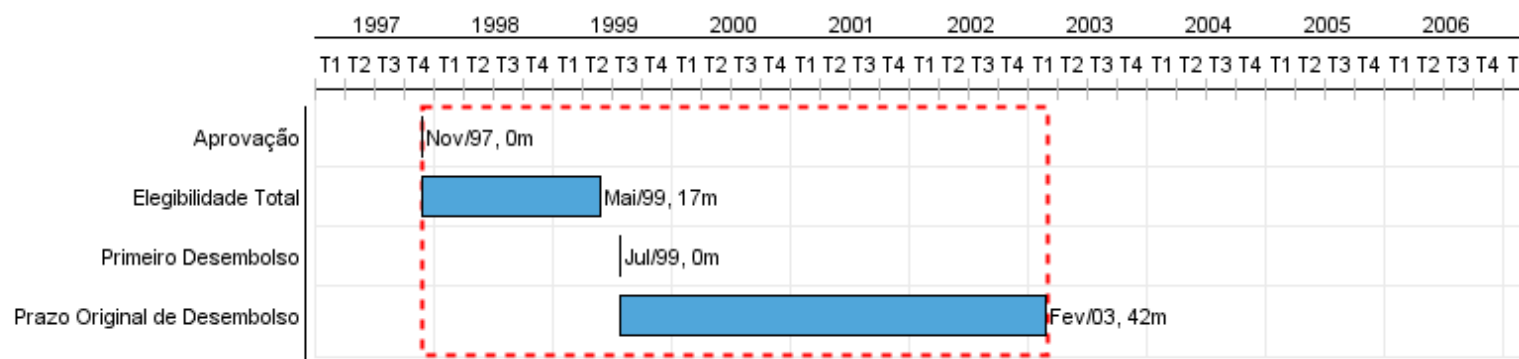

Progresso Acumulado até 2012

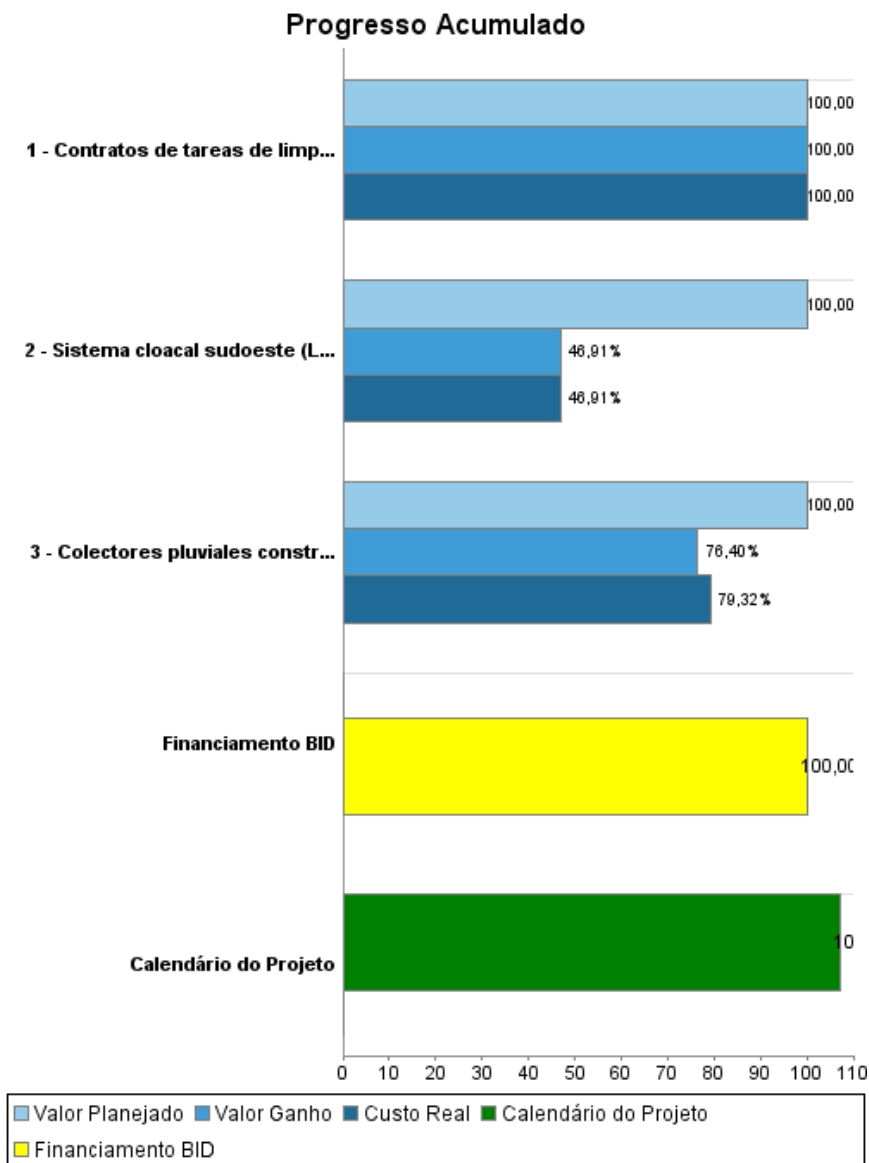

Resultados

Resultado:	Cobertura de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo incrementada
-------------------	----------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Hogares con servicio de saneamiento nuevo	Hogares		2006	P A		49,000.00

Resultado:	Riesgo de inundaciones reducido
-------------------	---------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Habitantes beneficiados por las obras de drenaje pluvial	habitantes		2006	P A		427,000.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Obras de drenaje urbano									
Colectores pluviales construídos	km				32,30				28.946.000,00
Limpieza de márgenes									
Contratos de tareas de limpieza de márgenes finalizados	Contratos				1,00				1.451.000,00
Saneamiento cloacal									
Sistema cloacal sudoeste (LaFerrere) construído	Sistemas				1,00				59.498.000,00
Administración, supervisión y costos financieros									
Administración, supervisión y costos financieros	N/A								668.000,00
Estudios y consultorías realizadas	N/A								432.000,00
TOTAL									90.995.000,00
