
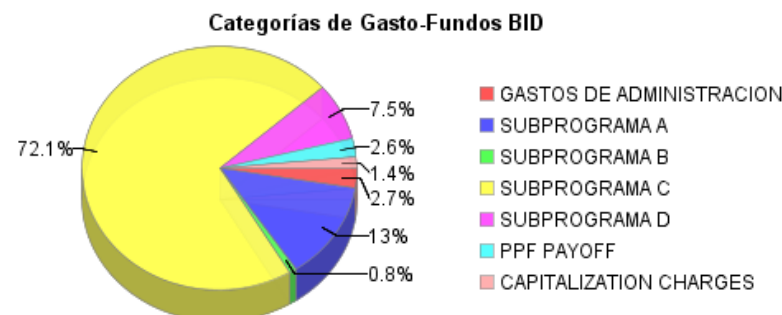




Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS		
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN DEVELOPMENT CREDIT		
Número da Operação: 1006/SF-BO	Atual: 42.067.706,19	Original BID: 45.800.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 42.067.706,19	Corrente BID: 42.067.706,19
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: BO0026, BO0183	Saldo:	Cofinanciamento/País: 11.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 56.800.000,00
		Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 24-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 26-sep-2012

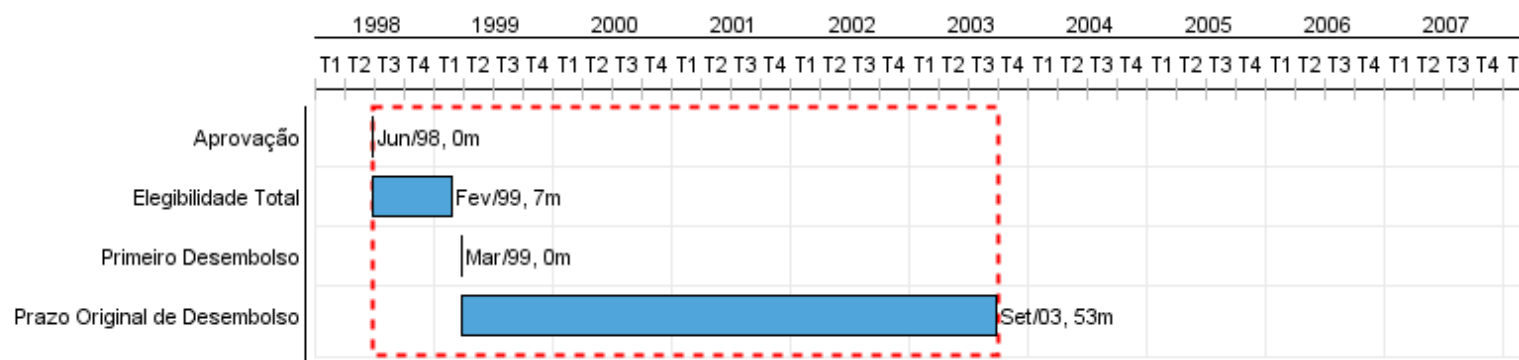

Progresso Acumulado até 2012

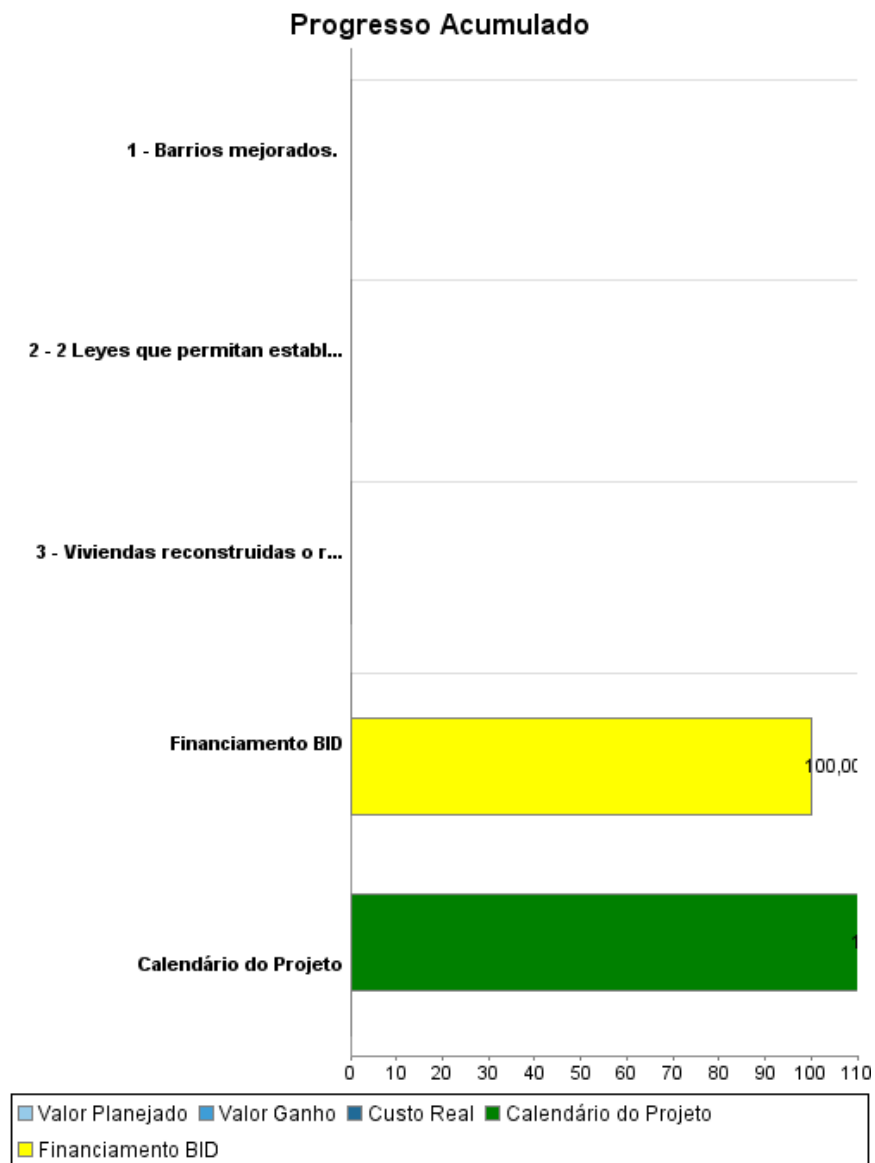

Resultados

Resultado:	Contribuir a elevar la situación habitacional de la población, particularmente de aquella de más bajos ingresos.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	Final do Projeto
Acceso a servicios de saneamiento básico por parte de las familias beneficiarias del Programa.	Familias			P	23,000.00	
				A	56,000.00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Sub-Programa A. Implementación de la Política de Reforma del Sector Habitacional									
2 Leyes que permitan establecer una reforma legal e institucional que reduzca los costos de producción, transacción y financiamiento de la vivienda en Bolivia (en %).	Leyes				100,00				
Sub-Programa C. Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.									
Barrios mejorados.	Barrios				81,00				
Sub-Programa D. Reconstrucción de Viviendas en zonas urbanas de Aiquile, Mizque y Totora.									
Viviendas reconstruidas o refaccionadas en las zonas afectadas.	Viviendas				1.400,00				
Sub-Programa B. Desarrollo del Mercado Secundario (se canceló)									
TOTAL									
