
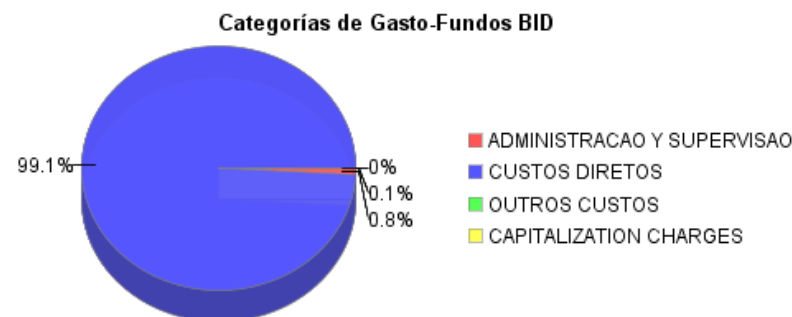
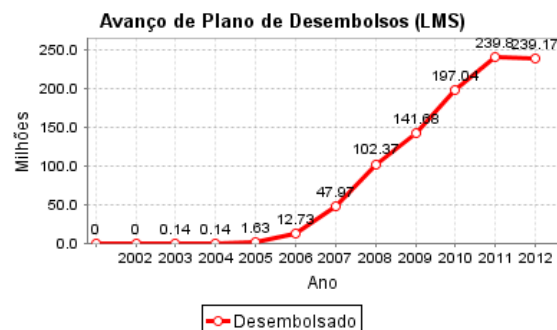



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		
Sector: SUSTAINABLE TOURISM		
Número da Operação: 1392/OC-BR	Atual: 239.800.000,00	Original BID: 240.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 239.800.000,00	Corrente BID: 239.800.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 60,00
Operação Relacionada:	Saldo:	Cofinanciamento/País: 160.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 400.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012

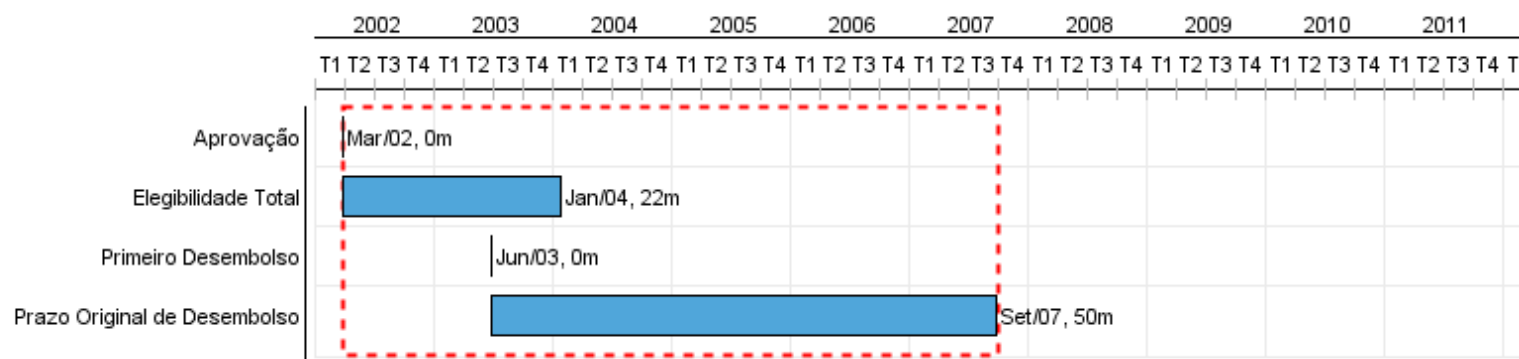

Progresso Acumulado até 2012

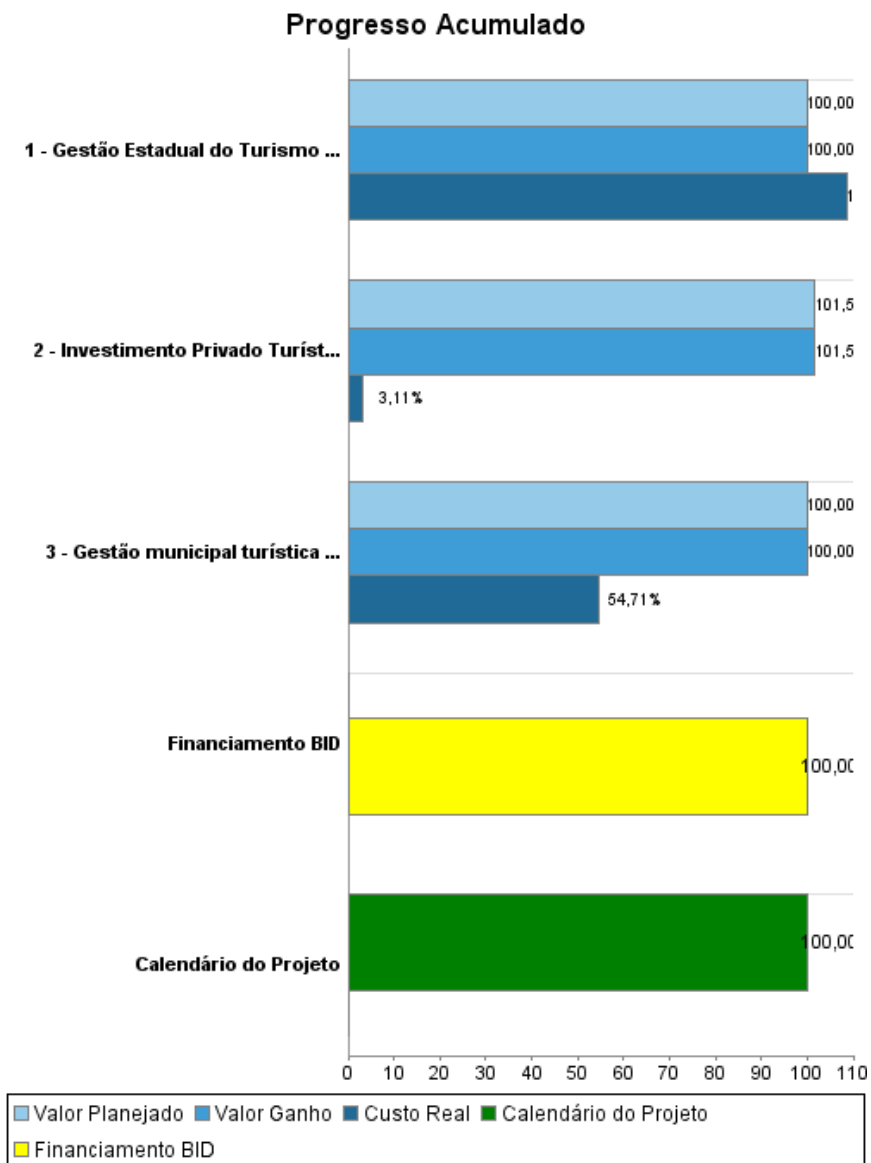

Resultados

Resultado:	Qualidade do produto Turísticos melhorada.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2007	2009	Final do Projeto
Grau de satisfação dos turistas com a limpeza pública nas Capitais aumentado	%		2000	P A				
Grau de satisfação dos turistas com a sinalização turística nas Capitais aumentado	%		2000	P A				
Grau de satisfação dos turistas com os atrativos naturais nas Capitais aumentado	%		2000	P A				
Grau de satisfação dos turistas com a qualidade da infra-estrutura nas Capitais aumentado	%		2000	P A				
Grau de satisfação dos turistas com a segurança pública nas Capitais aumentada	%		2000	P A				
Grau de satisfação dos turistas com os serviços proporcionados pelos EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS nas Capitais aumentado	%		2000	P A				
População atendida com rede de abastecimento de água nos municípios dos Pólos doprojetos do PRODETUR/NE II Incrementado	%		2000	P A				
População atendida com rede de esgoto sanitário nos municípios dos Pólos doprojetos do PRODETUR/NE II incrementado	%		2000	P A				

Resultado:	De maneira sustentável, a renda gerada nos Pólos pelo Turismo aumentada.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2007	2009	Final do Projeto
Movimentação de passageiros nos aeroportos das capitais do Programa	Número	12,735,226.00	2004	P A				20,000,000.00
Taxa Média de Ocupação Hoteleira nas capitais aumentada	%	55.80		P A	17,052,243.00	18,827,487.00	22,394,547.00	65.00
Número de unidades habitacionais nas capitais aumentada	Número			P A	59.90	58.30	60.90	
					54,076.00	56,586.00	59,889.00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
COMPONENTE 1: Gestão municipal.									
Gestão municipal turística nos polos de atuação do Programa fortalecida	unidade				1,00				67.557.500,00
COMPONENTE 2: Gestão Estadual do Turismo									
Gestão Estadual do Turismo Fortalecida	unidade				1,00				255.950.000,00
COMPONENTE 3: Promoção do Investimento Privado									
Investimento Privado Turístico Incrementado	unidade				1,00				20.300.000,00
Outros									
Administração e Supervisão	N/A								12.950.000,00
Outros Custos	N/A								1.600.000,00
Custos Financeiros	N/A								41.642.500,00
TOTAL									400.000.000,00
