
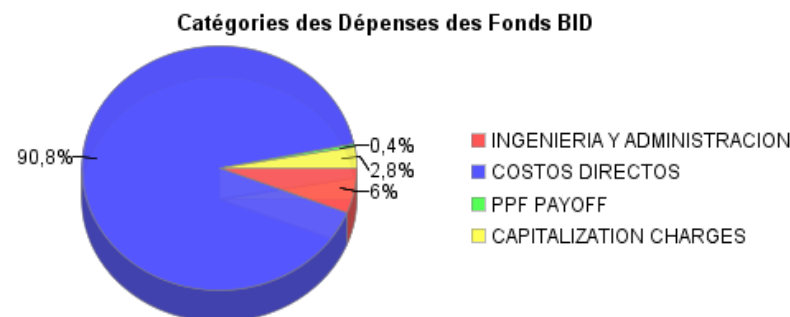
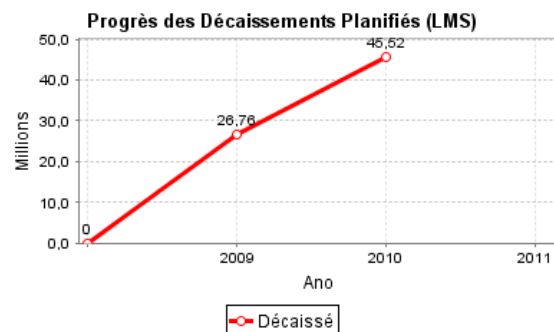



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Administradora Boliviana de Carreteras		
Secteur:	TRANSPORTATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	1101/SF-BO	Montant Courant Approuvé:	75.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	74.167.579,56
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	98,89
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	832.420,44
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project		
		Initial BID:	75.000.000,00
		Courant BID:	75.000.000,00
		Pari Passu:	80,94
		Cofinancement/Pays:	45.000.000,00
		Estimation Initiale:	120.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 28, 2011 Validé par le Représentant: Apr 19, 2011

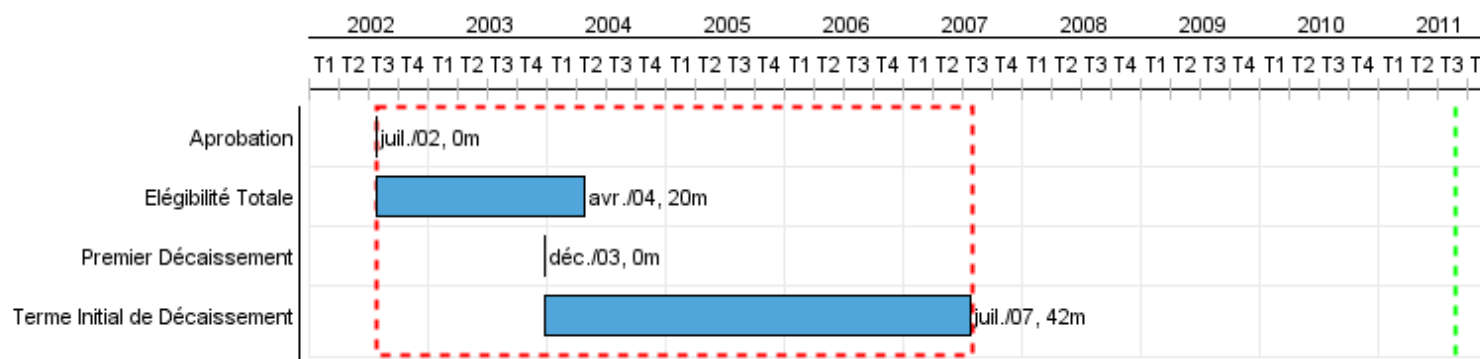

## Progrès Cumulé à 2010

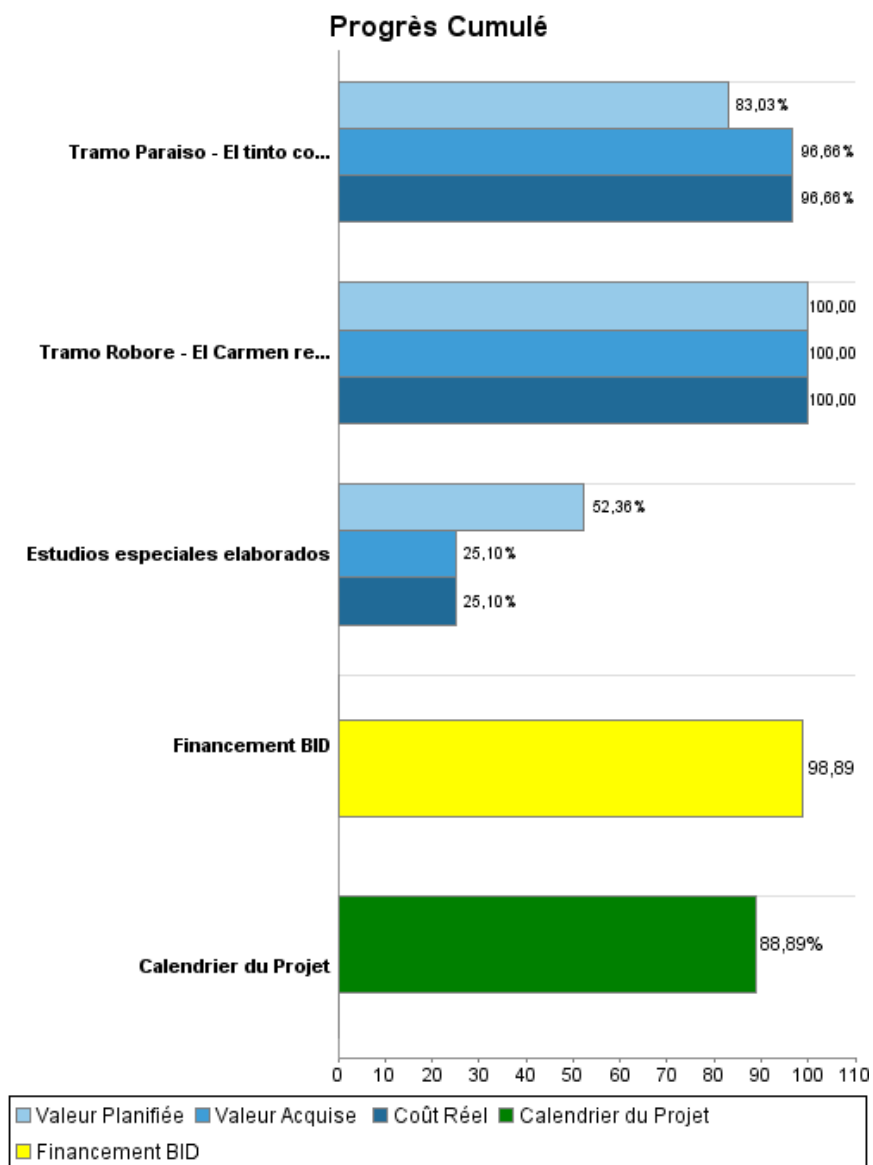

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Condiciones de integración entre Santa Cruz y Puerto Suárez mejoradas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo de viaje para vehículos pesados en el corredor Santa Cruz-Puerto Suarez	Días	7,00	2002	P A	1,00
Transito de vehículos comerciales y particulares en el tramo Paraiso-El Tinto	Vehículos/día	87,00	2002	P A	1.130,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>COMPONENTE 1: CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO y SUPERVISION TECNICA.</b>									
Tramo Paraiso - El tinto contruido y pavimentado	Kilómetros				125,00	17.459.920,00	29.270.440,00		86.695.720,00
Tramo Robore - El Carmen rehabilitado en Ripio	Kilómetros				139,00				2.575.260,00
<b>COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>									
Estudios especiales elaborados	Estudios				3,00	224.290,00	33.470,00		700.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>17.684.210,00</b>	<b>29.303.910,00</b>		<b>89.970.980,00</b>
