
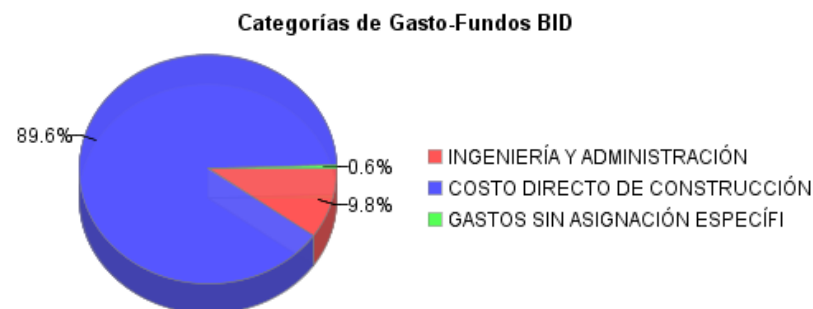
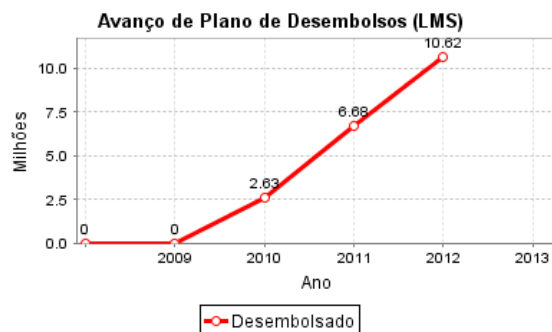



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.		
Sector: ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS		
Número da Operação: 2024/OC-PN	Atual: 12.500.000,00	Original BID: 12.500.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 9.351.744,00	Corrente BID: 12.500.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 74,81	Pari-passu: 50,00
Operação Relacionada:	Saldo: 3.148.256,00	Cofinanciamento/País: 12.500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 25.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012

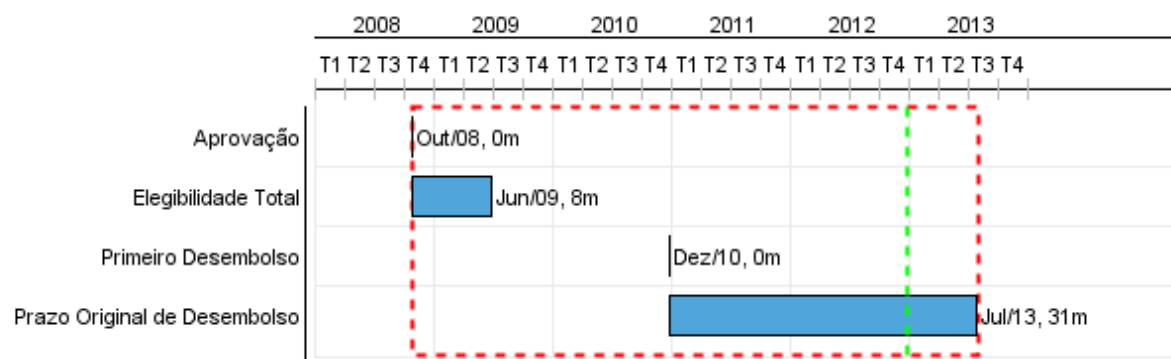

## Progresso Acumulado até 2012

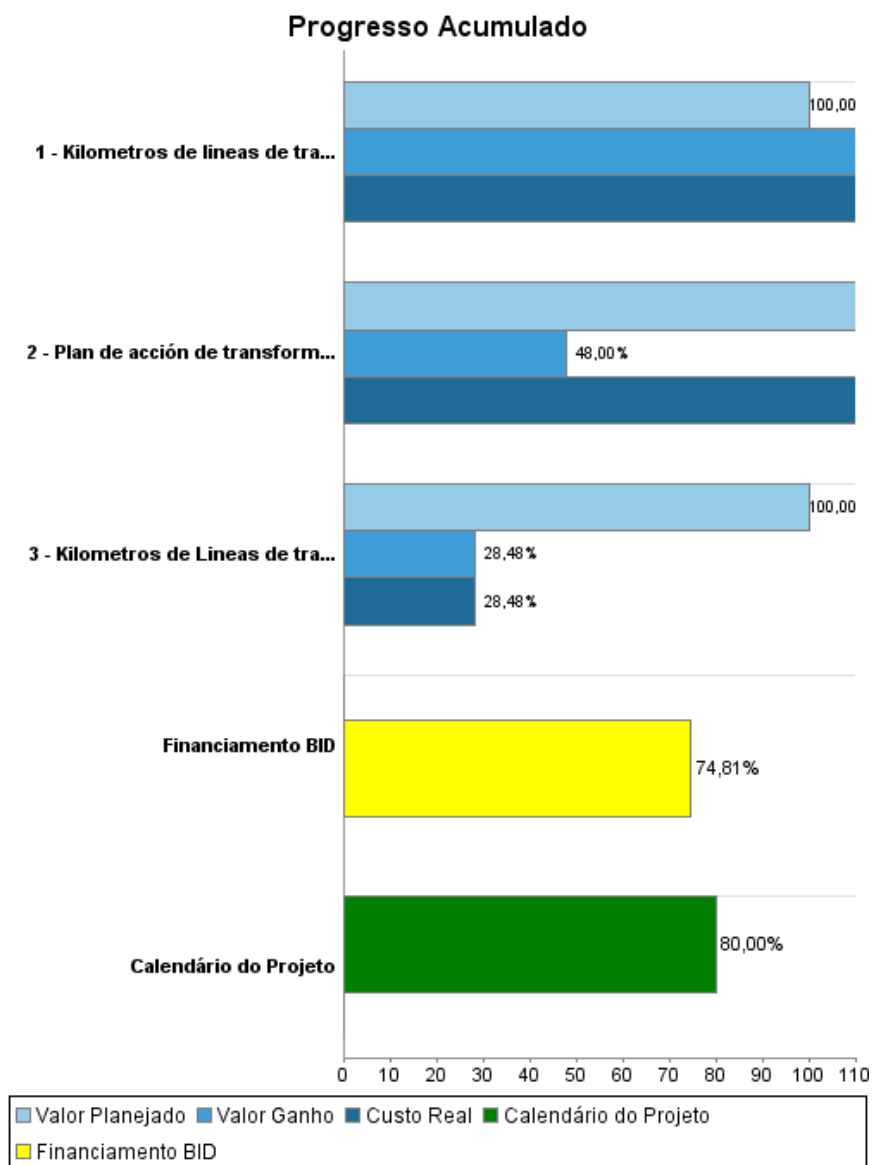

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
<b>Suposições:</b>	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional	Gwh	8,412.90	2008	P A	8,881.90
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional.	MW	1,356.50	2008	P A	1,431.20

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II</b>									
Kilometros de Lineas de transmisión construidas (Proyecto Colón Fase II)	Kilometers	15,00			48,00	2.940.000,00			12.550.000,00
<b>Componente 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola</b>									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers	36,00			121,00	2.104.000,00	2.486.568,62		9.030.000,00
<b>Componente 2 - Actividades de transformación corporativa</b>									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan	1,00			1,00		189.298,75		100.000,00
<b>Gastos sin Asignación Específica</b>									
Gastos sin asignación específica	N/A								1.810.000,00
<b>Gastos Financieros</b>									
Costos Financieros	N/A								1.510.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>5.044.000,00</b>	<b>2.675.867,37</b>		<b>25.000.000,00</b>
