
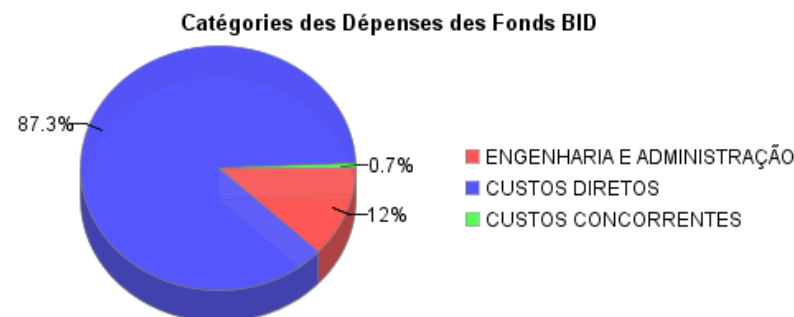
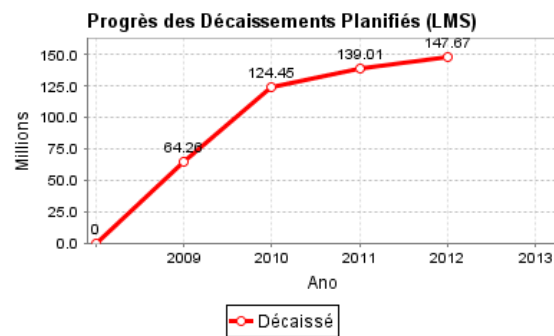



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Estado de Amazonas		
Secteur:	WATER AND SANITATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2006/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	154.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	146.185.069,63
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	94,93
Opération(s) Connexe(s):	BR-L1005, BR-L1297	Solde:	7.814.930,37
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project		
		Initial BID:	154.000.000,00
		Courant BID:	154.000.000,00
		Pari Passu:	70,00
		Cofinancement/Pays:	66.000.000,00
		Estimation Initiale:	220.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012 Validé par le Représentant: 28-sep-2012

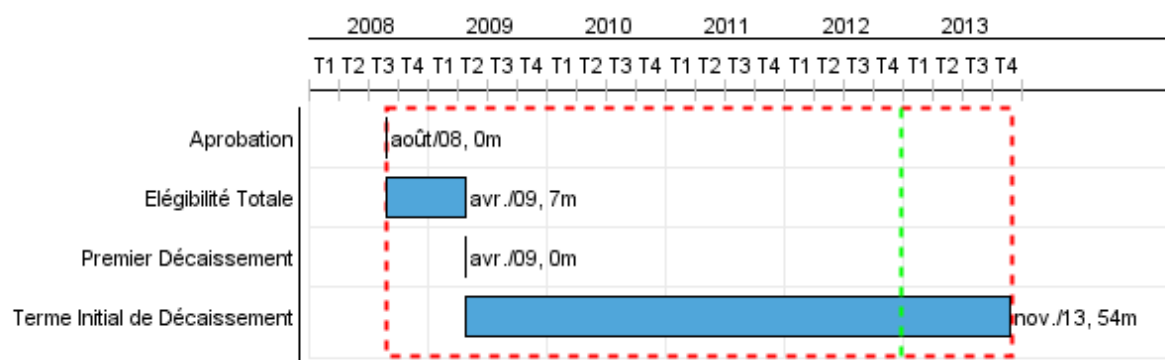

Progrès Cumulé à 2012

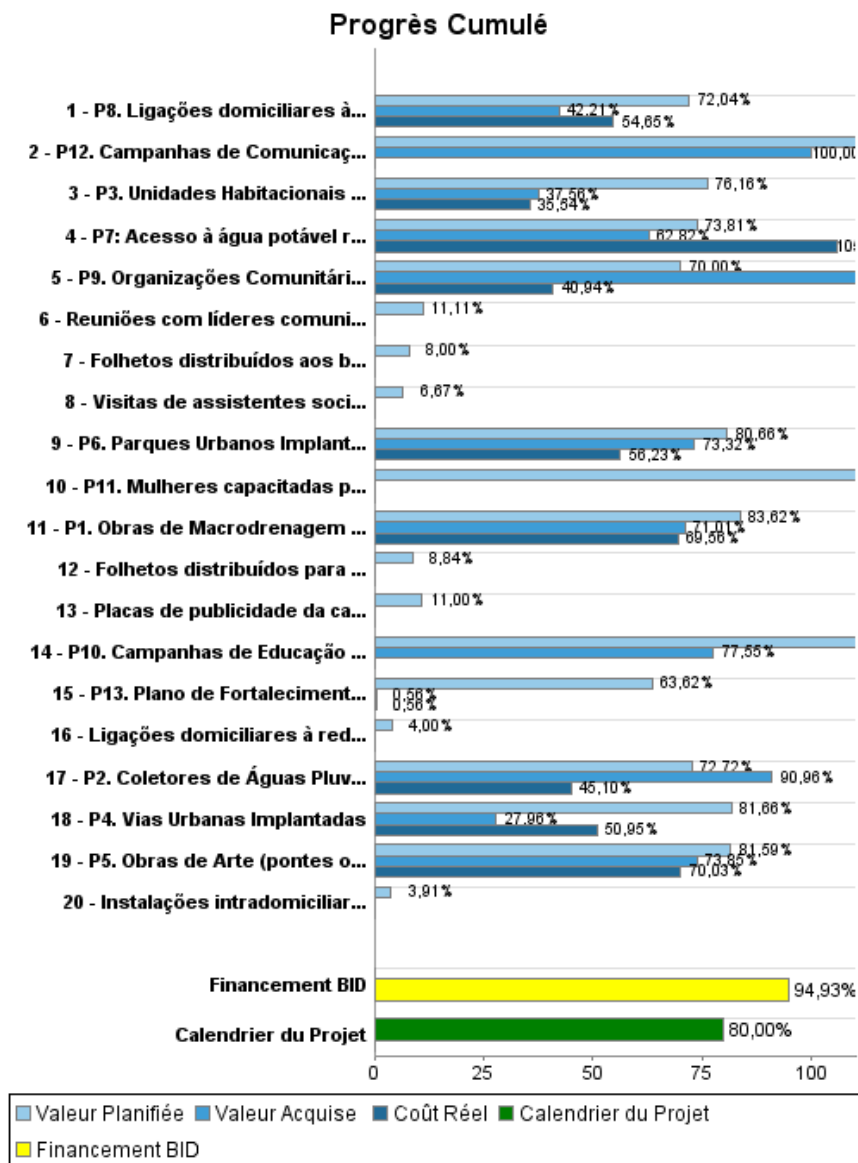

Résultats

Résultat:	Problemas socioambientais dos habitantes das bacias hidrográficas dos igarapés São Raimundo e Educandos (cidade de Manaus-AM) solucionados.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Coliformes termotolerantes	NMP/100ml	2,400.00	2006	P A	1,000.00
Oxigênio dissolvido nas águas (OD).	mgO2/L	3.10	2006	P A	4.20
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5).	mgO2/L	240.00	2006	P A	20.00
Nitrogênio amoniacal.	mgN/L	13.00	2009	P A	10.00
Demanda Química de Oxigênio (DQO).	mgO2/L	152.30	2006	P A	75.00
Pessoas afetadas por inundações	peessoas	22,085.00	2006	P A	
Casas localizadas em assentamentos precários na cidade de Manaus	casas	84,500.00	2006	P A	80,500.00
Coliformes termotolerantes - Fundo Espanhol	NMP/100ml	2,400.00	2011	P A	1,000.00
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) - Fundo Espanhol	mgO2/L	240.00	2009	P A	20.00
Demanda Química de Oxigênio (DQO) - Fundo Espanhol	mgO2/L	152.30	2009	P A	75.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
COMPONENTE 1: Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional									
P1. Obras de Macrodrenagem executadas (Canais de Água reabilitados e Galerias de Macrodrenagem construídas)	metro	600,00	77,00		4.901,19	2.903.000,00	1.432.650,00		27.077.920,00
P2. Coletores de Águas Pluviais construídos.	metro	1.879,00	2.670,00		9.804,00	530.000,00	83.370,00		3.070.350,00
P3. Unidades Habitacionais Construídas	unidade habitacional	238,00			1.038,00	8.019.000,00	613.440,00		40.518.540,00
P4. Vias Urbanas Implantadas	metro	4.132,00	284,38		15.000,00	3.735.000,00	675.540,00		24.007.840,00
P5. Obras de Arte (pontes ou viadutos) construídas.	obras de arte	1,00	0,50		7,00	3.278.000,00	4.585.490,00		21.160.630,00
P6. Parques Urbanos Implantados	hectare	2,00			39,85	3.660.000,00	215.110,00		25.131.530,00
P7: Acesso à água potável regularizado	moradia	1.108,00	658,00		3.929,00		50.290,00		886.670,00
P8. Ligações domiciliares à rede pública de esgoto instaladas	Domicílios	2.398,00			8.226,00	8.164.000,00	3.049.380,00		53.287.530,00
COMPONENTE 2: Sustentabilidade Social e Institucional									
P9. Organizações Comunitárias criadas	organização	3,00	1,00		34,00	9.000,00			50.000,00
P10. Campanhas de Educação Sanitária e Ambiental realizadas	campanha	46,00	14,00		174,00	60.000,00			200.000,00
P11. Mulheres capacitadas para inserção no mercado de trabalho	Indivíduos	50,00			150,00	15.000,00			50.000,00
P12. Campanhas de Comunicação Social realizadas	campanha	1,00			4,00	60.000,00			200.000,00
P13. Plano de Fortalecimento Institucional implantado	plano				1,00	1.278.000,00			4.284.000,00
COMPONENTE 3: OUTROS									
Outros Custos (unidade executora, gerenciamento, supervisão de obras, estudos e projetos, auditoria, avaliação e monitoramento)	N/A					1.160.000,00			20.075.000,00
COMPONENTE 4: Conexões à rede (Fundo Espanhol)									
Instalações intradomiciliares construídas	instalação	610,00			15.610,00	176.000,00			4.500.000,00
Ligações domiciliares à rede pública de esgoto instaladas	Domicílios	610,00			15.610,00	20.000,00			500.000,00
COMPONENTE 5: Viabilidade social (Fundo Espanhol)									
Folhetos distribuídos para a população de Manaus	folheto	8.000,00			90.000,00	76.000,00			860.000,00
Placas de publicidade da campanha de sensibilização confeccionadas	placa	3,00			27,00	32.000,00			291.000,00

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1164 - Social and Environmental Program for the Manaus' Igarapés - PROSAMIM II
2012 1^o período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 27/09/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Folhetos distribuídos aos beneficiários da doação	folheto	9.000,00			93.000,00	2.000,00			25.000,00
Reuniões com líderes comunitários realizadas	reunião	6,00			42,00	1.000,00			9.000,00
Visitas de assistentes sociais realizadas	visita	1.189,00			15.610,00	1.000,00			15.000,00
COMPONENTE 6: OUTROS (Fundo Espanhol)									
Outros custos (inspeção e supervisão de obras, auditoria, avaliação, acompanhamento)	N/A								250.000,00
TOTAL						33.179.000,00	10.705.270,00		226.450.010,00
