
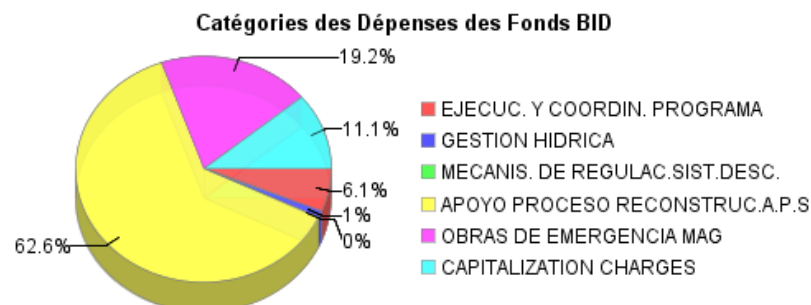




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	COMISION COORDINADORA DE REFORMA SECTORIAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS				
Secteur:	WATER AND SANITATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	1102/OC-ES	Montant Courant Approuvé:	41.575.465,57	Initial BID:	43.700.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	41.575.465,57	Courant BID:	41.575.465,57
Type d' Opération:	LON - Loan Operation	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	73,50
Opération(s) Connexe(s):	TC9911141	Solde:		Cofinancement/Pays:	11.300.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	55.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2012
		Validé par le Représentant: 28-sep-2012

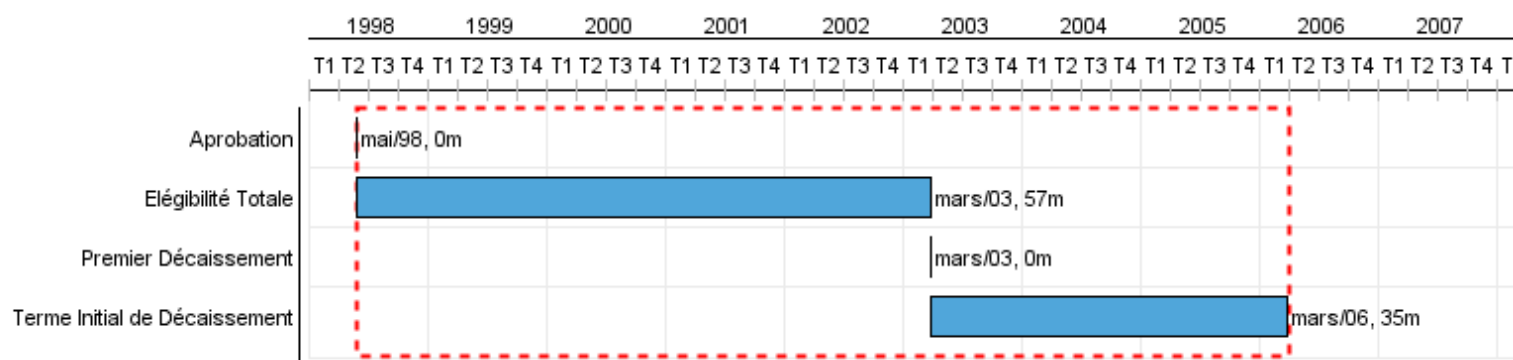

Progrès Cumulé à 2012

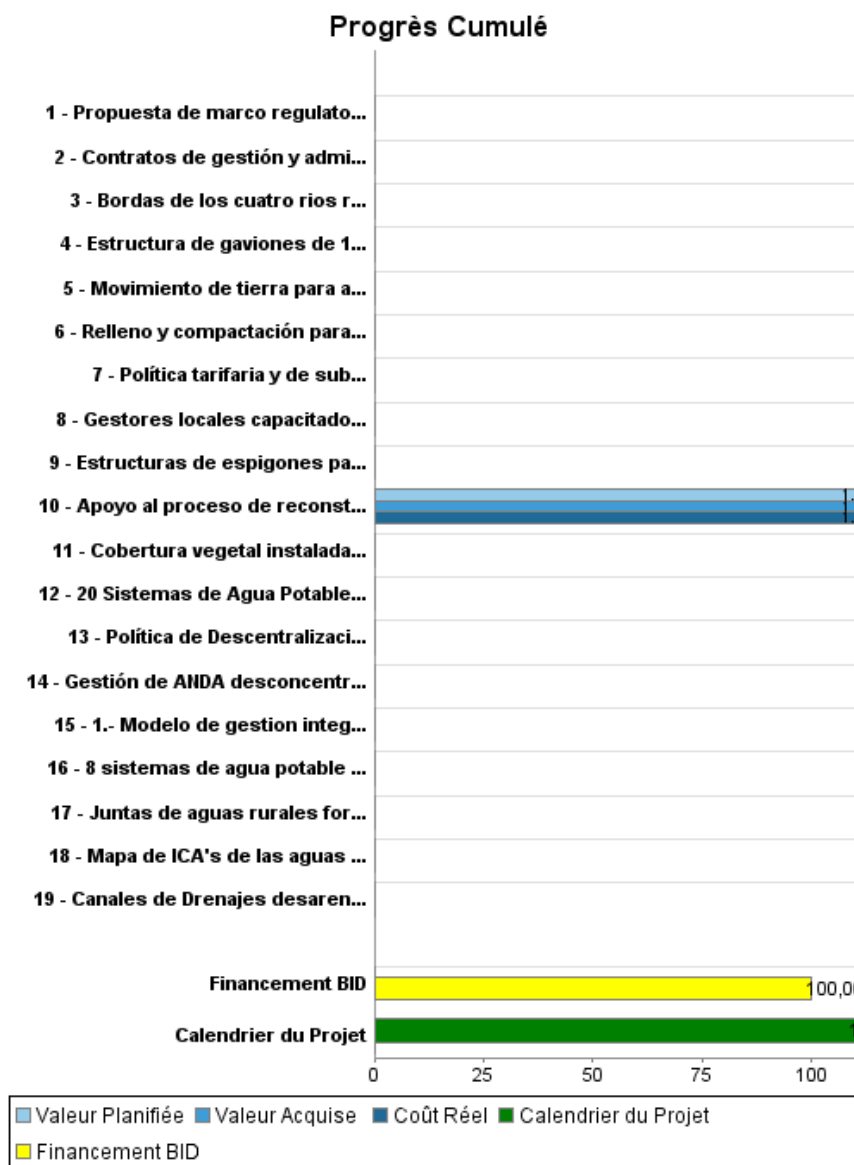

Résultats

Résultat: Mejorar los niveles de cobertura y calidad de los servicio de agua potable, por medio de la prestación del servicio por empresas descentralizadas Sostenibles

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	Fin du Projet
Empresas descentralizadas operando sistemas de agua potable cumplen con indices de sostenibilidad financiera y de eficiencia en la continuidad de la prestación del servicio de AP, publicado por la unidad de contratos de gestión y/o administración de s	Empresas		1998	P	12.00	16.00	16.00
				A	15.00	15.00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1.- Gestión Hídrica en apoyo a la reconstrucción de sistemas de agua potable y saneamiento descentralizados funcionando									
1.- Modelo de gestion integral de cuenca hidrografica implentado y operando en dos microregiones en donde existen Empresas descentralizadas	U.				2,00				
Mapa de ICA's de las aguas superficiales y subterráneas publicado y actualizado de dos microregiones en donde existen empresas descentralizadas	U.				2,00				
Gestores locales capacitados en gestión de recursos hídricos en empresas descentralizadas	U.				6,00				
2. Mecanismos Reguladores desarrollados y operando en los sistemas de agua potable y saneamiento reconstruidos y descentralizados.									
Propuesta de marco regulatorio y tarifario para la prestación de servicios de las APS	Propuesta presentada				1,00				
Contratos de gestión y administración para la prestación de los servicios de agua potable implementados con empresas descentralizadas	Contratos de administración				10,00				
Política tarifaria y de subsidios operando en empresas de APS descentralizadas	contratos de administración que incorporan las regulaciones del rubro de tarifas y subsidios				10,00				
Política de Descentralización y desconcentración de ANDA aprobada	documento de política aprobado				1,00				
Obras de Emergencia del MAG									
Bordas de los cuatro rios rehabilitados y/o reconstruidas	metros lineales				9.500,00				
Canales de Drenajes desarenados y limpiados	metro lineal				33.500,00				
Cobertura vegetal instalada para proteger taludes de bordas	metros cuadrados				36.250,00				

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Movimiento de tierra para ampliación de sección hidráulica de ríos	metros cúbicos				40.000,00				
Relleno y compactación para estabilización de bordas	metros cúbicos				10.366,00				
Estructura de gaviones de 1mt x 1mt x 1mt instalados	metro lineal				13.176,00				
Estructuras de espigones para protección de las bordas	Espigones				46,00				
Apoyo al proceso de reconstrucción de sistemas de agua potable									
Apoyo al proceso de reconstrucción de sistemas de agua potable	%				100,00				1.416.040,43
8 sistemas de agua potable rurales rehabilitados	No. de sistemas rurales rehabilitados				8,00				
20 Sistemas de Agua Potable rehabilitados y ampliados en empresas descentralizadas	No. de sistemas intervenidos				20,00				
Gestión de ANDA desconcentrada en aquellos sistemas no descentralizados	%				100,00				
Juntas de aguas rurales fortalecidas	Juntas de Agua				8,00				
TOTAL									1.416.040,43
