

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
Secteur:	WATER AND SANITATION
Numéro(s) de Prêt(s):	1793/SF-HO
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	TC0203009
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	30.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	6.119.972,69
% Décaissé:	20,40
Solde:	23.880.027,31

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	30.000.000,00
Courant BID:	30.000.000,00
Pari Passu:	92,00
Cofinancement/Pays:	2.540.000,00
Estimation Initiale:	32.540.000,00
Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validation


Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012

Validé par le Représentant: 01-oct-2012

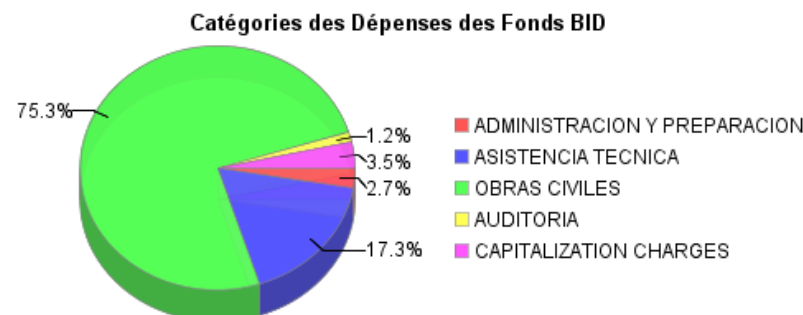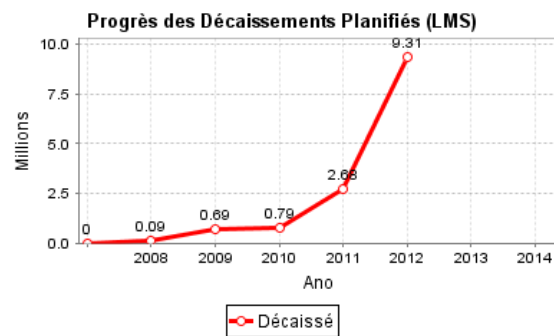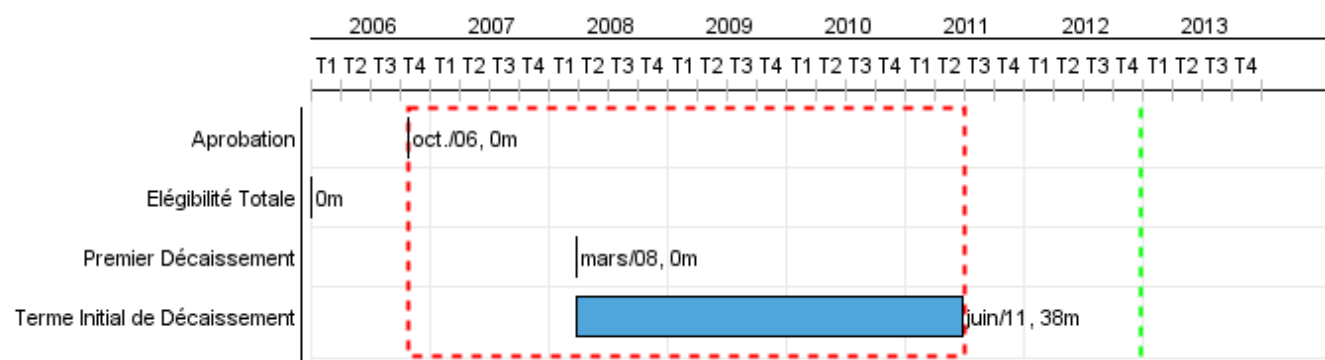

Progrès Cumulé à 2012

Progrès Cumulé

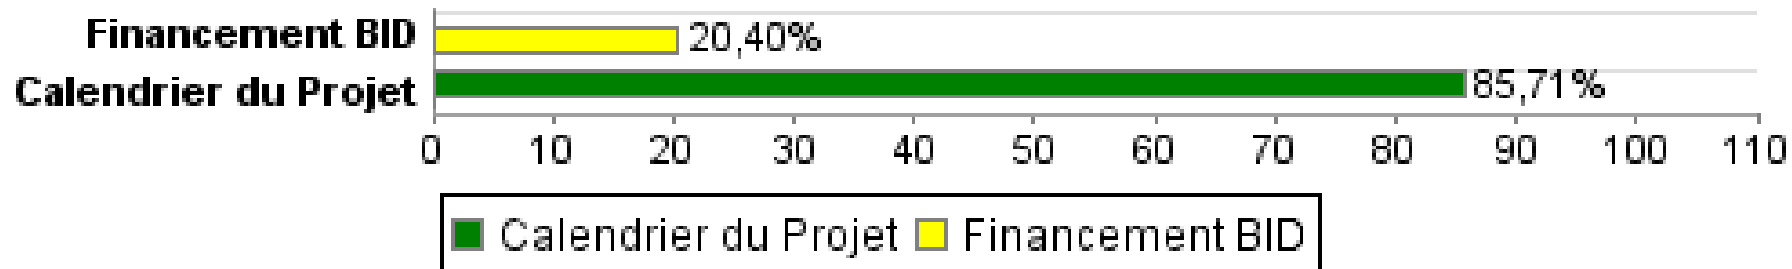

Résultats

Résultat:	Cobertura de agua potable mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos
Suposições:	1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2012	2013	2014	Fin du Projet
Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable	Hogares		2009	P A				4,841.00	2,074.00	11,470.00

Résultat:	Cobertura de saneamiento mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos
Suposições:	1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2012	2013	2014	Fin du Projet
Hogares con acceso a saneamiento nuevo o mejorado	Hogares		2011	P A			1,833.00	3,455.00	1,482.00	8,694.00

Résultat:	Operadores de servicios de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a normativas locales
Suposições:	1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2012	2013	2014	Fin du Projet
Operadores de Sevicios de Agua Potable y Saneamiento opererando de acuerdo a normativa de Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	Operadores		2010	P A				8.00	15.00	23.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP
Componente I: Asistencia Tecnica para el cambio Institucional					
Estudios previos a la transferencia del sistema del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) al la Alcaldía Municipal realizados	Estudios				5,00
Municipalidades con cambio institucional implementado	Municipios	8,00	6,00		23,00
Plan de Fortalecimiento del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento implementado	N/A				
Equipamiento instalado en SANAA para revisión de diseños de obra	N/A				
Componente II. Obras Civiles construidas					
Sistemas de Saneamiento construidos	Sistemas	8,00	3,00		23,00
Sistemas de Agua Potable Construidos	Sistema				3,00
Gestión del Programa					
Monitoreo y evaluación	N/A				
Coordinación	N/A				
