
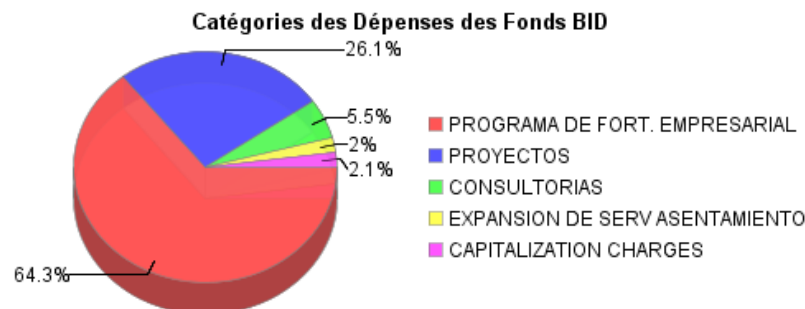




## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS				
Secteur:	WATER AND SANITATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	1049/SF-NI	Montant Courant Approuvé:	13.883.993,36	Initial BID:	13.900.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	13.883.993,36	Courant BID:	13.883.993,36
Type d' Opération:	LON - Loan Operation	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	73,11
Opération(s) Connexe(s):		Solde:		Cofinancement/Pays:	1.660.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	15.560.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012 Validé par le Représentant: 28-sep-2012

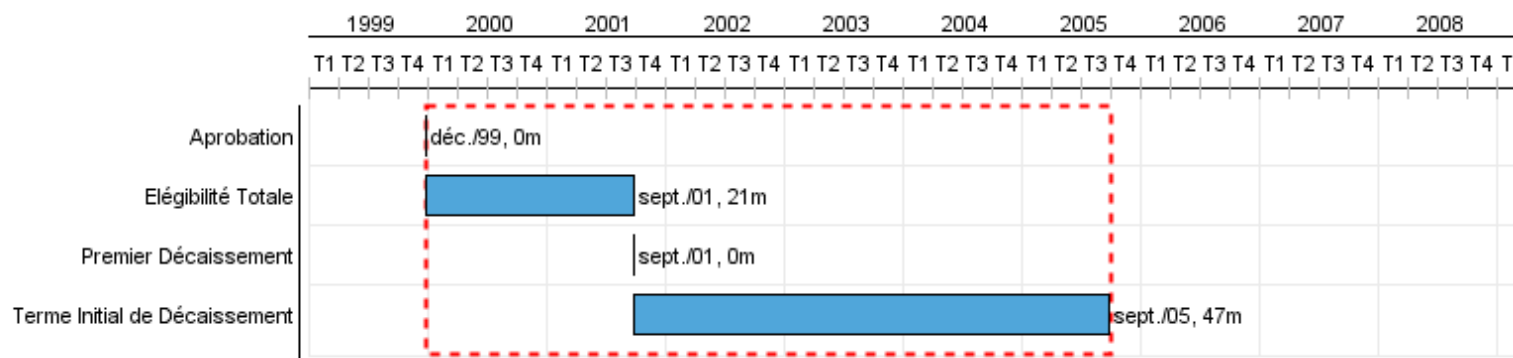

## Progrès Cumulé à 2012

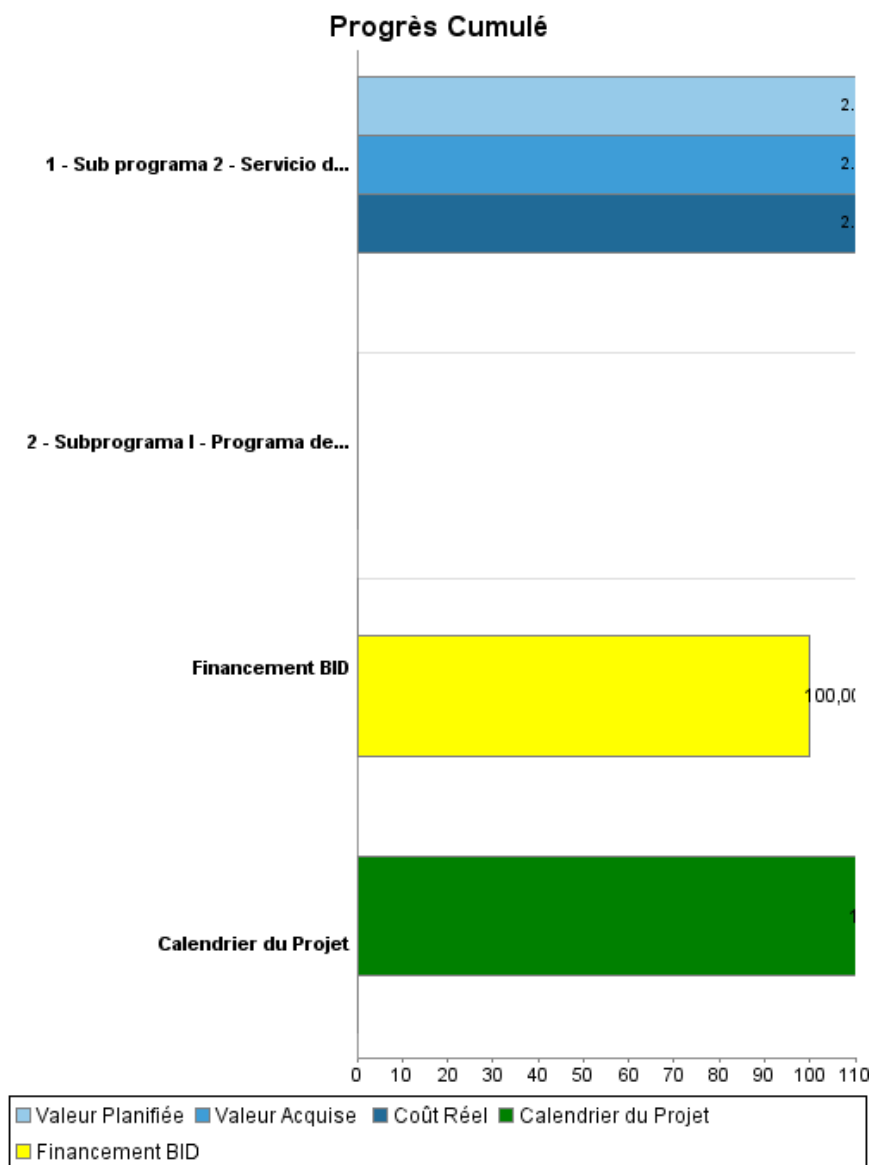

## Résultats

**Résultat:** ENACAL fortalecida empresarialmente en el corto plazo a nivel nacional con acciones prioritarias.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2008	2010	Fin du Projet
Reduccion del agua no facturada a Nivel Nacional	%	55.88		P		53.50	51.90	51.90
				A	54.21	53.20	51.63	
Incremento en la tasa de Micromedicion	%	38.80		P	44.40	45.00	47.00	47.00
				A	49.20	50.80	57.60	
Reduccion del consumo de energia	Kwh/m3	0.69		P	0.68	0.68	0.68	0.68
				A	0.70	0.69		
Reduccion del Numero de Clandestinos en los servicios	% de clandestinos	19.69		P		10.56	10.50	10.50
				A	14.97	9.21	6.11	

**Résultat:** incrementado los niveles de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en 10 barrios marginales de la Ciudad de Managua.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2008	2010	Fin du Projet
Personas con Acceso Seguro al AP	Personas beneficiadas con AP			P			38,850.00	38,850.00
				A		38,850.00		
Personas con Acceso Seguro al Servicio de Alcantarillado Sanitario	Personas beneficiadas con AS			P			48,210.00	48,210.00
				A		48,210.00		

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Sub programa 2 - Servicio de agua potable y alcantarillado expandidos en barrios marginales de la Ciudad de Managua</b>									
Sub programa 2 - Servicio de agua potable y alcantarillado expandidos en barrios marginales de la Ciudad de Managua									200.000,00
<b>Subprograma I - Programa de Fortalecimiento Empresarial de ENACAL</b>									
Subprograma I - Programa de Fortalecimiento Empresarial de ENACAL									
<b>TOTAL</b>									<b>200.000,00</b>
