
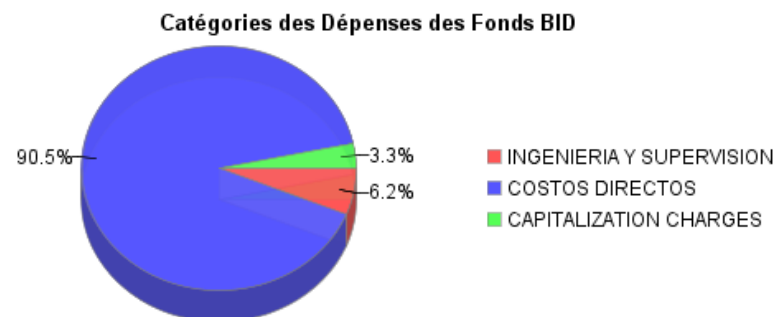
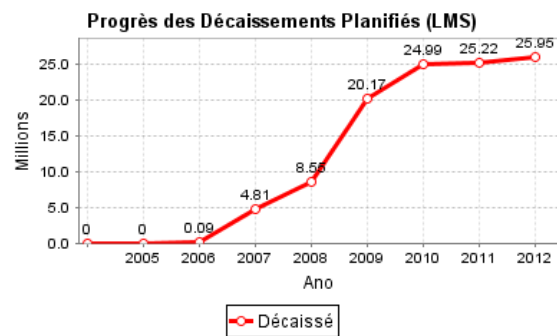



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE		
Secteur:	TRANSPORT		
Numéro(s) de Prêt(s):	1599/SF-NI	Montant Courant Approuvé:	25.945.459,23
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	25.945.459,23
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	NI-L1035	Solde:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	40.000.000,00
		Courant BID:	25.945.459,23
		Pari Passu:	80,00
		Cofinancement/Pays:	10.000.000,00
		Estimation Initiale:	50.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012 Validé par le Représentant: 28-sep-2012

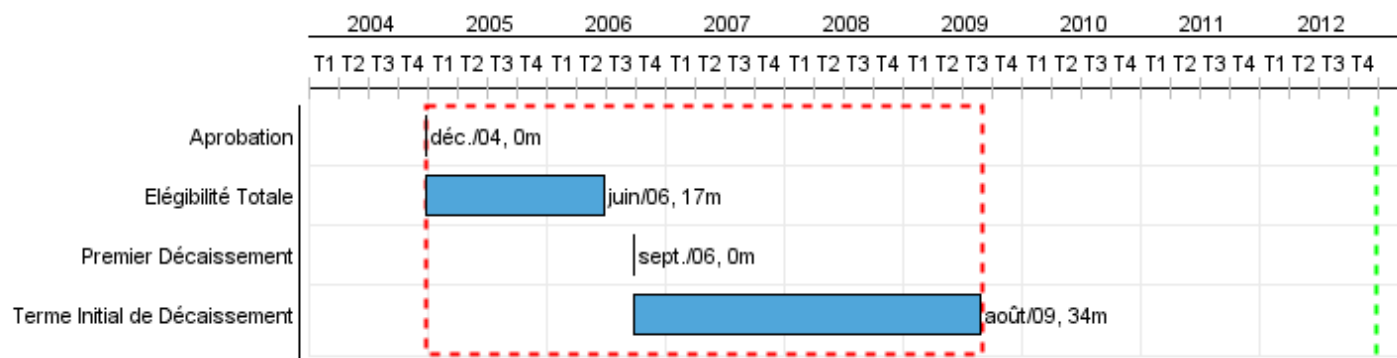

Progrès Cumulé à 2012

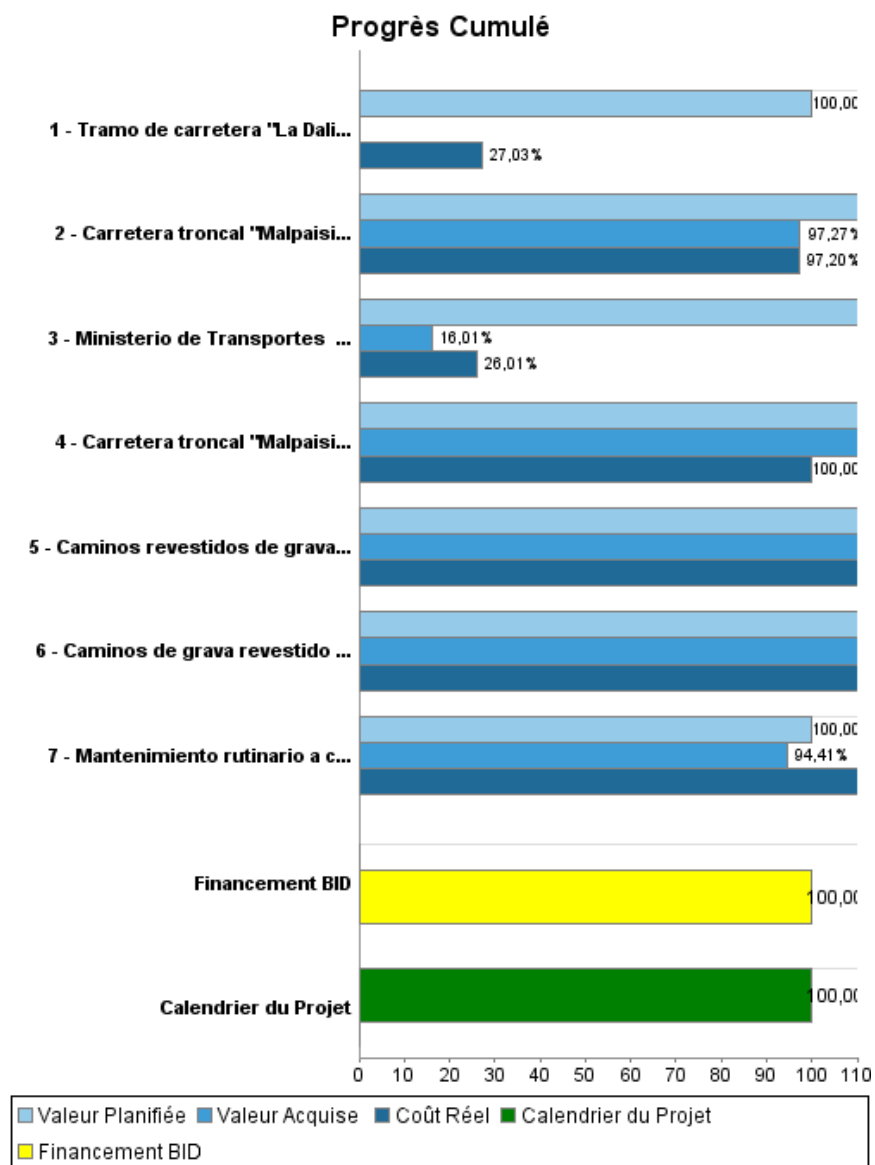

Résultats

Résultat: Condiciones de transporte para los usuarios de la zona del proyecto mejoradas.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	Fin du Projet
Costos de operación vehicular de automóviles (veh) en el tramo Malpasillo, San Isidro.	US\$/veh.km	0.30	2009	P A		0.64	0.16
Costos de operación vehicular de autobuses (Autob) en el tramo Malpasillo, San Isidro.	US\$/Autob.km	1.90	2009	P A			0.90
Costos de operación vehicular de camiones pesados (Cp) en el tramo Malpasillo, San Isidro,	US\$/Cp.km	1.35	2009	P A			0.70
Velocidad para los usuarios del tramo Malpasillos - San Isidro (automóviles).	Km/h	30.00	2009	P A			65.00
Velocidad para los usuarios del tramo Malpasillos - San Isidro (autobuses).	Km/h	28.00	2009	P A			60.00
Velocidad para los usuarios del tramo Malpasillos - San Isidro (camiones pesados).	Km/h	26.00	2009	P A			60.00
Costos de operación vehicular de automoviles (veh) en los caminos grava (Grupos I, II y III).	US\$/veh.km	0.30	2009	P A			0.28
Costos de operación vehicular de autobuses(Autob) en los caminos grava (Grupos I, II y III).	US\$/Autob.km	2.10	2009	P A			1.90
Costos de operación vehicular de camiones pesados (Cp) en los caminos grava (Grupos I, II y III).	US\$/Cp.km	1.40	2009	P A			1.30

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Rehabilitación de carretera troncal pavimentada									
Carretera troncal "Malpaisillo - San Isidro" con microcarpeta colocada (ETAPA I)	Kilómetros				72,00		7.281.023,00		7.759.023,44
Carretera troncal "Malpaisillo - San Isidro", reforzada con carpeta alfáltica (ETAPA II)	Kilómetros				72,00	2.167.522,31	1.806.000,00		12.898.433,31
Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas									
Mantenimiento rutinario a carreteras Pavimentadas efectuado	Kilómetros	286,00	270,00		286,00	1.400.000,00	2.049.868,00		3.200.000,00
Mantenimiento periódico de caminos revestidos de grava									
Caminos revestidos de grava con mantenimiento periódico.	Kilómetros	38,00	196,50		225,00		6.956.759,00		4.706.867,99
Fortalecimiento Institucional									
Ministerio de Transportes e Infraestructura, fortalecido	Unidad		1,00		1,00	831.999,47	36.373,00		924.479,37
Revestimiento mejorativo de caminos de grava									
Caminos de grava revestido con material selecto.	Kilómetros				88,30				9.812.781,99
Tramo de carretera "La Dalia-La Mora" rehabilitada.	Kilómetros	10,68			10,68	5.829.020,00	1.575.780,00		5.829.020,00
Administración del Programa									
Gastos Financiero (Intereses y FIV)	N/A					1.339.647,00	859.460,00		1.339.647,00
Auditorías y Evaluaciones	N/A					81.299,25	69.890,00		81.299,25
Fondos sin asignar	N/A					4.533.872,33			4.533.872,33
TOTAL						16.183.360,36	20.635.153,00		51.085.424,68
