
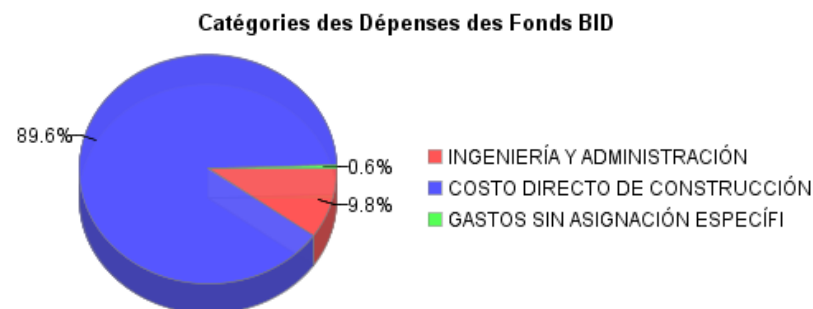
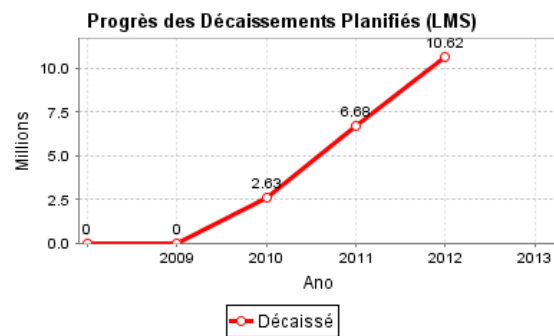



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.				
Secteur:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2024/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	12.500.000,00	Initial BID:	12.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	9.351.744,00	Courant BID:	12.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	74,81	Pari Passu:	50,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	3.148.256,00	Cofinancement/Pays:	12.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	25.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012 Validé par le Représentant: 28-sep-2012

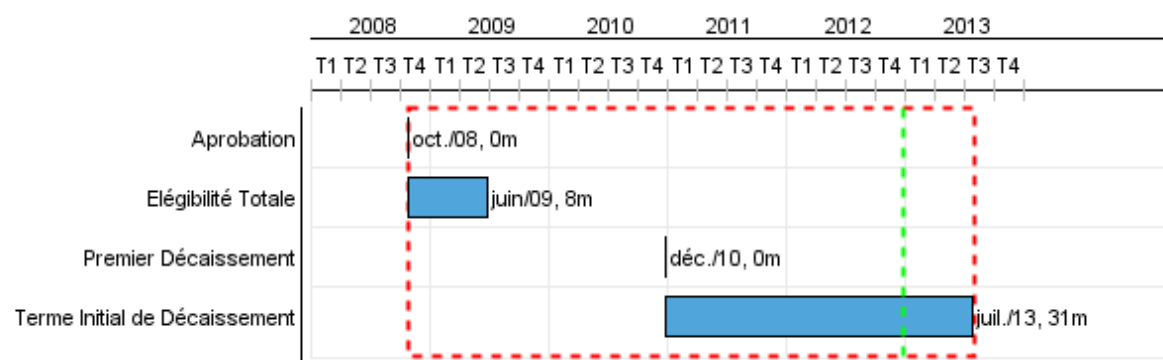

Progrès Cumulé à 2012

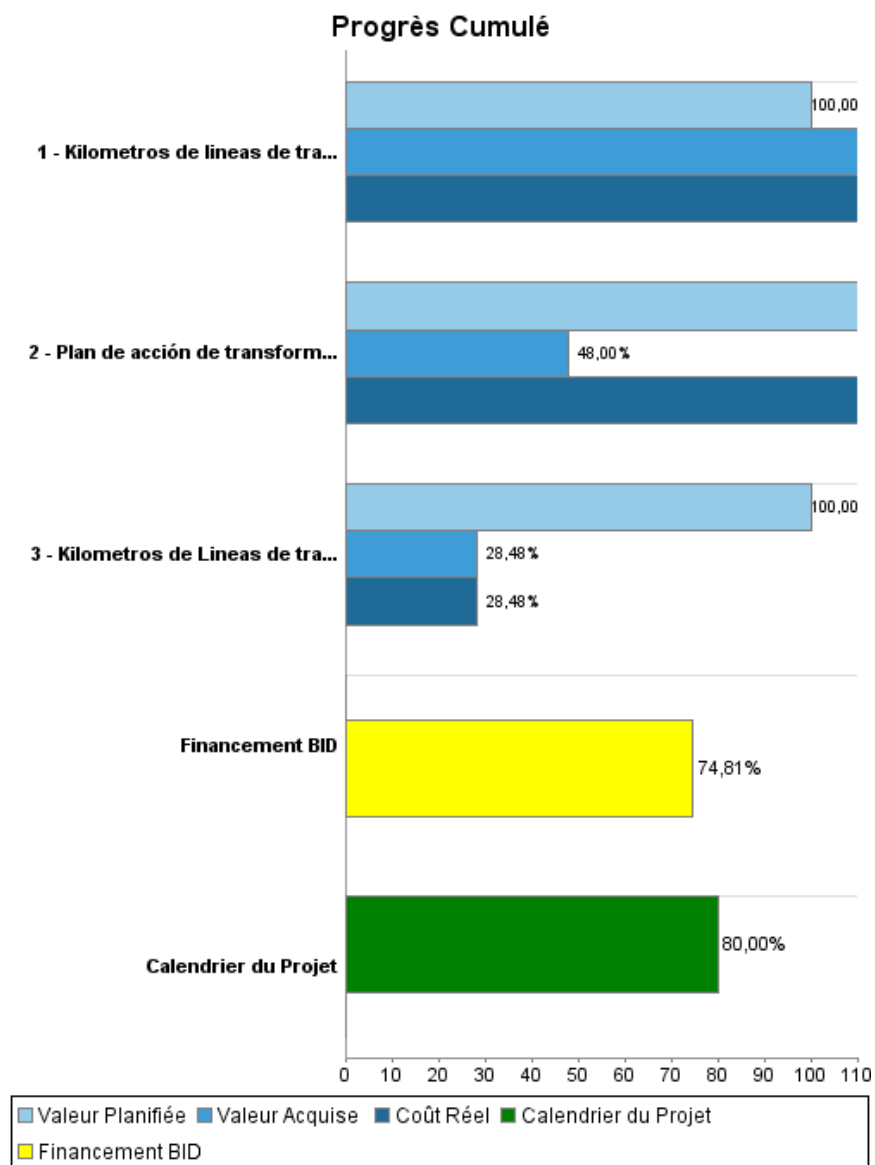

Résultats

Résultat:	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
Suposições:	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional	Gwh	8,412.90	2008	P A	8,881.90
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional.	MW	1,356.50	2008	P A	1,431.20

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II									
Kilometros de Lineas de transmisión construidas (Proyecto Colón Fase II)	Kilometers	15,00			48,00	2.940.000,00			12.550.000,00
Componente 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers	36,00			121,00	2.104.000,00	2.486.568,62		9.030.000,00
Componente 2 - Actividades de transformación corporativa									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan	1,00			1,00		189.298,75		100.000,00
Gastos sin Asignación Específica									
Gastos sin asignación específica	N/A								1.810.000,00
Gastos Financieros									
Costos Financieros	N/A								1.510.000,00
TOTAL						5.044.000,00	2.675.867,37		25.000.000,00
