
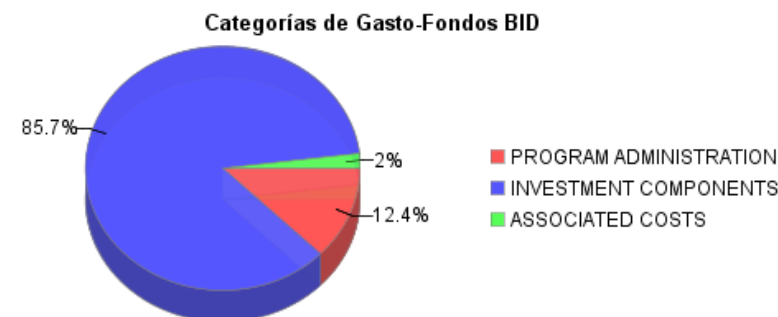
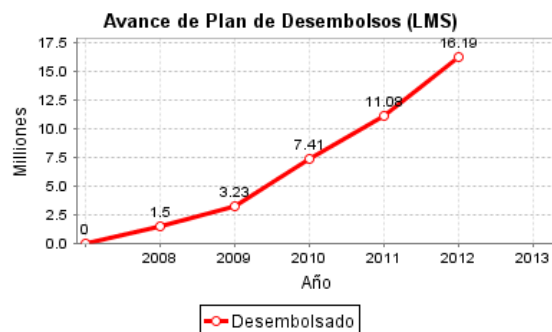



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Número(s) de Préstamo:	1960/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	19.382.000,00	BID Original:	19.382.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	14.464.831,43	Actual BID:	19.382.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	74,63	Pari-passu:	50,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-L1043, BR-T1225	Saldo:	4.917.168,57	Co-financiamiento/País:	19.382.000,00
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples			Estimado Original:	38.764.000,00
				Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	21-sep-2012
		Validado por Representante de País:	28-sep-2012

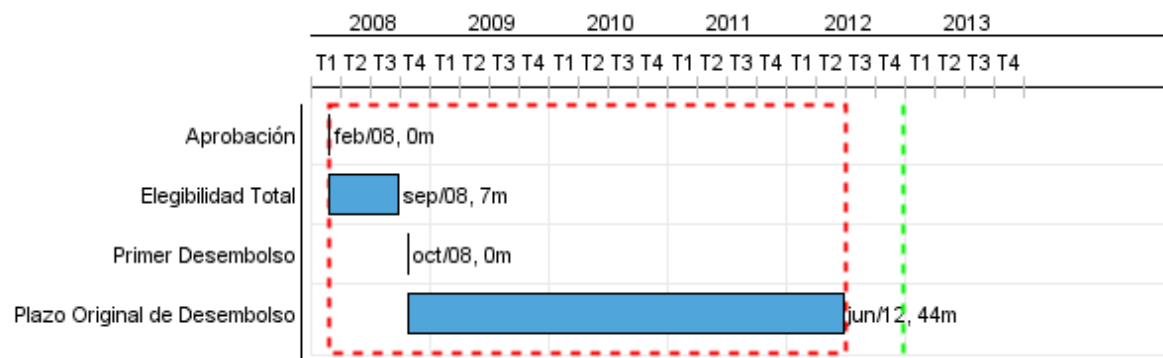

Progreso Acumulado al 2012

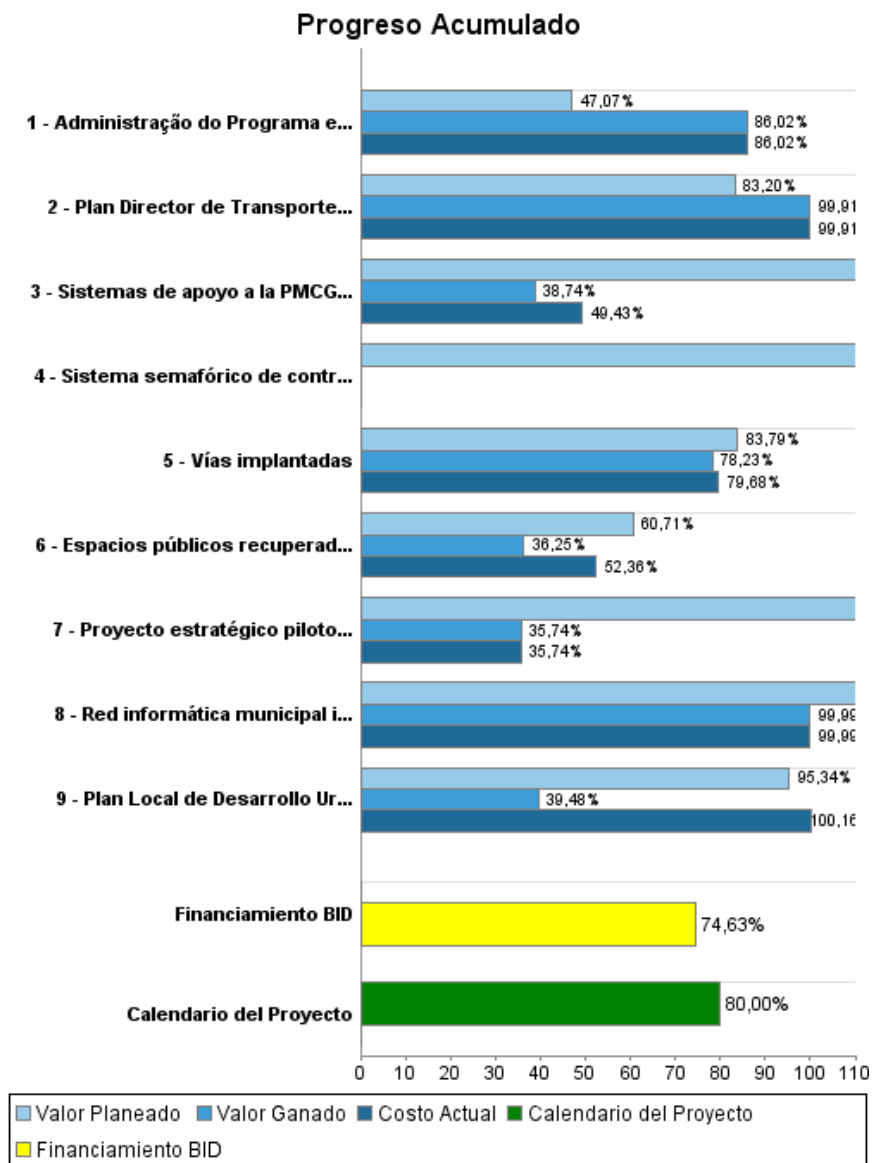

Resultados

Resultado: Área central de la ciudad revitalizada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Valor promedio de los inmuebles residenciales en el Centro.	Valor en R\$/ m2	75.12	2007	P A		97.65
Número de licencias de funcionamiento concedidas anualmente para comercio y servicios en el Centro.	Licencias de funcionamiento anuales	172.00	2006	P A		189.00

Resultado: Movilidad de la ciudad mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Tiempo de viaje para usuarios del transporte colectivo entre el área Oeste y el Centro	Minutos	9.32	2007	P A	7.02	6.99
Tiempo de viaje para usuarios del transporte privado entre el área Oeste y el Centro	Minutos	8.25	2007	P A	5.29	6.19
Tiempo de viaje para usuarios del transporte colectivo dentro del Centro en la Calle Alfonso Pena	Minutos	8.15	2007	P A		6.11
Tiempo de viaje para usuarios del transporte particular dentro del Centro en la Calle Alfonso Pena	Minutos	7.20	2007	P A		5.04
Tiempo de viaje para usuarios del transporte colectivo entre el área Oeste y el Centro	Minutos	14.30	2007	P A		10.72
Tiempo de viaje para usuarios del transporte particular entre el área Oeste y el Centro	Minutos	10.38	2007	P A		7.78

Resultado: Gestión administrativa de la Prefeitura Municipal de Campo Grande mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Gastos de comunicación de la Prefeitura.	US\$ millones anuales	2.70	2007	P A	1.27	1.35
Tiempo de trámite de licenciamiento ambiental.	Días	120.00	2007	P A		96.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Revitalización del Centro									
Plan Local de Desarrollo Urbano del Centro desarrollado y aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano (CMDU)	Plan Local de Desarrollo Urbano				1,00				472.000,00
Espacios públicos recuperados (parques lineares)	Metros cuadrados	6.749,00	80.912,00		108.500,00	472,00	657.000,00		2.580.000,00
Proyecto estratégico piloto identificado en el Plan Local de Desarrollo Urbano del Centro desarrollado e implantado	Proyecto				1,00	1.386.640,00			1.706.000,00
Movilidad Urbana									
Vías implantadas	Km		3,00		25,80		5.444.000,00		29.031.000,00
Sistema semafórico de control centralizado sirviendo a 180 intersecciones semaforizadas implantado	Sistema semafórico centralizado	1,00			1,00	3.100.466,00			7.830.000,00
Plan Director de Transportes actualizado	Plan Director de Transportes				1,00				311.000,00
Fortalecimiento Institucional									
Red informática municipal instalada (con 6 estaciones básicas y conexión de 274 puntos clientes)	Red Informática				1,00				700.000,00
Sistemas de apoyo a la PMCG implantados (un software para la fiscalización de tráfico de la AGETTRAN, otro de licenciamiento ambiental y otro de control de obras para la SESOP)	Sistemas Implantados	1,00	1,00		3,00	142.000,00	54.000,00		600.000,00
Otros									
Administração do Programa e Gastos Correntes	No aplica					1.429.000,00	2.513.000,00		7.158.000,00
TOTAL						6.058.578,00	8.668.000,00		50.388.000,00
