
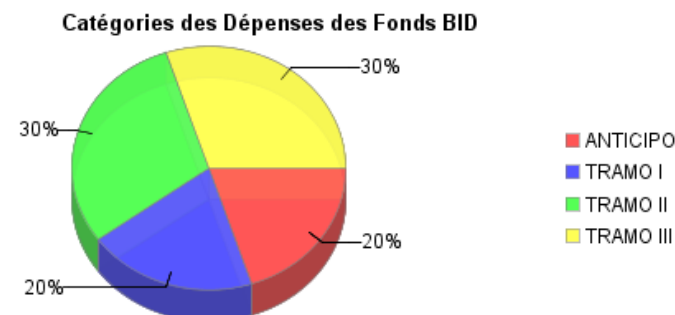
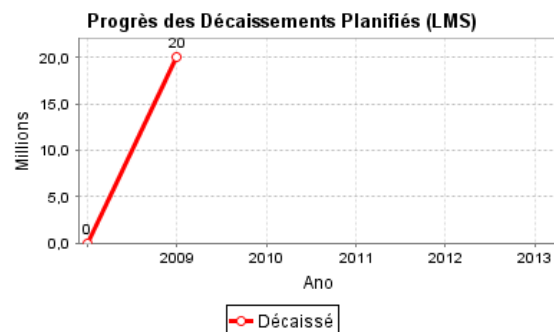



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL-MINTER		
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-SOLID WASTE MANAGEMENT		
Numéro(s) de Prêt(s):	1958/OC-CH	Montant Courant Approuvé:	100.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	20.000.000,00
Type d' Opération:	PDL - Performance Driven Loan	% Décaissé:	20,00
Opération(s) Connexe(s):	CH-X1001, CH-L1032, CH-L1033	Solde:	80.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PDL - Performance Driven Loan		
		Initial BID:	100.000.000,00
		Courant BID:	100.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	100.000.000,00
		Estimation Initiale:	200.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	48

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 29, 2011 Validé par le Représentant: Apr 29, 2011

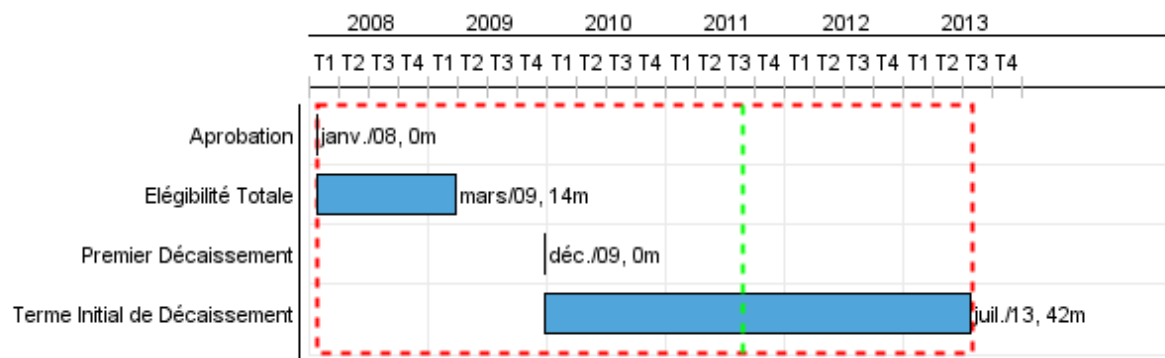

Progrès Cumulé à 2010

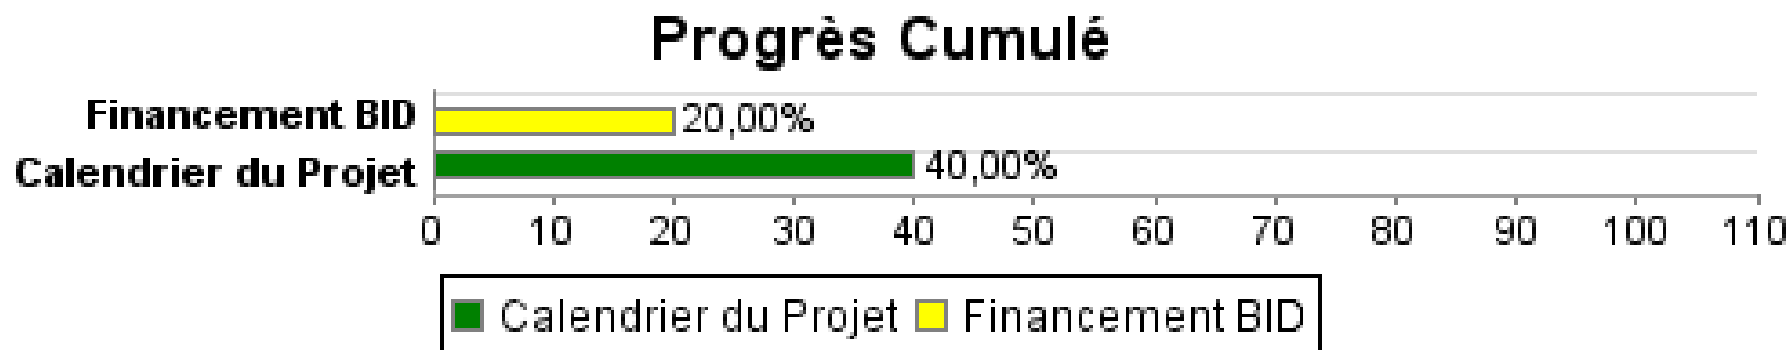

Résultats

Résultat:	Disposición final en instalaciones sanitaria y ambientalmente adecuadas de los residuos sólidos domiciliarios generados en municipios del país aumentada.
Observações:	La unidad básica de dimensionamiento y transacción de los residuos sólidos domésticos es la tonelada métrica.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Toneladas de residuos sólidos domiciliarios tratados y depositados en rellenos sanitarios con autorización sanitaria y ambiental	Millones de Toneladas	3,20	2007	P A	3,40	3,50	4,00	4,60	4,60

Résultat:	Instalaciones de disposición final sin autorización sanitaria y ambiental cerradas.
Observações:	Corresponde a vertederos no controlados con alto impacto ambiental y creación potencial de pasivos ambientales.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Vertederos (instalaciones) de disposición final sin autorización sanitaria o ambiental cerrados.	vertederos		2007	P A			30,00	60,00	60,00

Résultat:	Capacidad de planificación regional del manejo integral de residuos sólidos domiciliarios mejorada.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Número de regiones que cuentan con un plan regional de gestión integral de residuos sólidos aprobado	Número de regiones		2007	P A			5,00	15,00	15,00

Résultat:	Gestión financiera de los municipios participantes del Programa del manejo de sus residuos sólidos domiciliarios Mejorada
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Puntos porcentuales de aumento en la cobertura de los costos reales de aseo por Derechos de Aseo en cada uno de los municipios participantes del Programa.	Puntos Porcentuales		2007	P A				5,00	5,00

Résultat:	Capacidad de fiscalización y control sanitario y ambiental del Estado en materia de residuos sólidos domiciliarios fortalecida.
Observações:	Esta acción asegura la sustentabilidad de los nuevos proyectos creando un sistema de fiscalización sobre las obras que permite detectar problemas en la operación.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Número regiones donde las instalaciones de disposición final que son fiscalizadas y controladas por las autoridades regionales sanitarias de acuerdo con la formativa ambiental y sanitaria vigente	Nº de regiones	3,00	2007	P A		10,00	15,00		15,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

- Aucune information n'est disponible
