
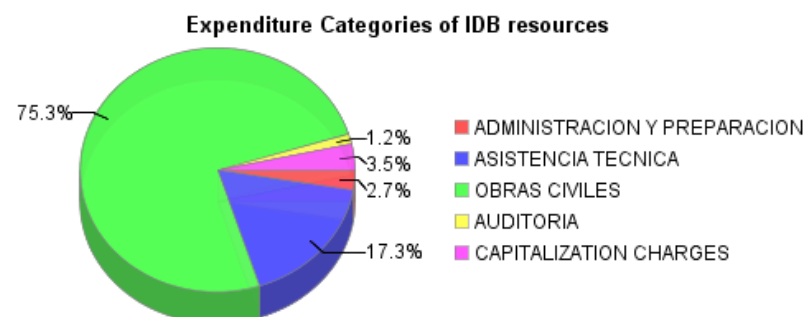
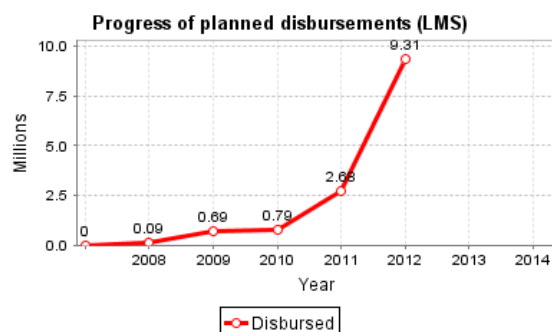


Summary Report


| Basic Data | | Available Funds (US\$) | | Total Cost and Source | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Executing Agency (EA): | FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL | | | | |
| Sector: | WATER AND SANITATION | | | | |
| Loan Number(s): | 1793/SF-HO | Current Approved Amount: | 30.000.000,00 | Original IDB: | 30.000.000,00 |
| Stage: | Approved | Disbursed Amount to Date: | 6.119.972,69 | Current IDB: | 30.000.000,00 |
| Operation Type: | INV - Investment | % Disbursed: | 20,40 | Pari-passu: | 92,00 |
| Related Operation(s): | TC0203009 | Balance: | 23.880.027,31 | Co-Financing/Country: | 2.540.000,00 |
| Operation Subtype: | SUP - Supplementary Financing | | | Original Estimate: | 32.540.000,00 |
| | | | | Amortization Period (months): | 354 |

| Project Environmental and Social Impact Category | Reformulation | Validation |
|--|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: B(R) | () Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: 27-sep-2012 Validated by Country Representative: 01-oct-2012 |

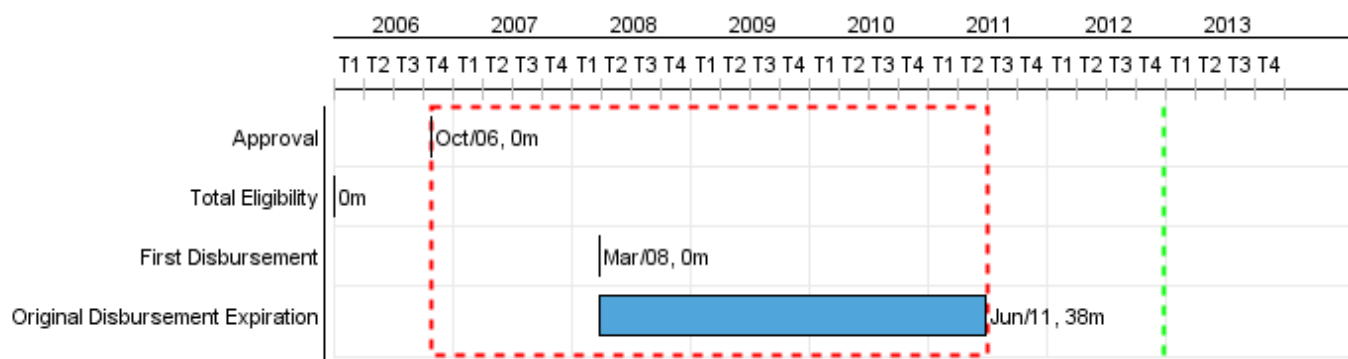

Accumulated Progress as of 2012

Accumulated Progress

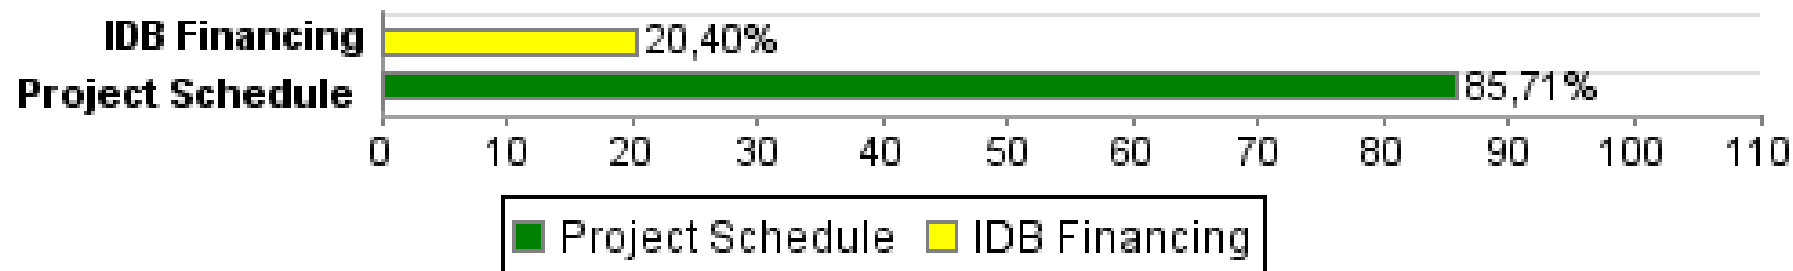

Outcomes

| | |
|----------------------|--|
| Outcome: | Cobertura de agua potable mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos |
| Suppositions: | 1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector. |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|----------|----------|----------------|
| Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable | Hogares | | 2009 | P A | | | | 4,841.00 | 2,074.00 | 11,470.00 |

| | |
|----------------------|--|
| Outcome: | Cobertura de saneamiento mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos |
| Suppositions: | 1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector. |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|----------|----------|----------|----------------|
| Hogares con acceso a saneamiento nuevo o mejorado | Hogares | | 2011 | P A | | | 1,833.00 | 3,455.00 | 1,482.00 | 8,694.00 |

| | |
|----------------------|--|
| Outcome: | Operadores de servicios de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a normativas locales |
| Suppositions: | 1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector. |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|------|-------|----------------|
| Operadores de Sevicios de Agua Potable y Saneamiento opererando de acuerdo a normativa de Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento | Operadores | | 2010 | P A | | | | 8.00 | 15.00 | 23.00 |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

| Description | Unit of Measure | Physical | | | |
|---|-----------------|----------|--------|-------------------|-----------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units |
| Componente I: Asistencia Tecnica para el cambio Institucional | | | | | |
| Estudios previos a la transferencia del sistema del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) al la Alcaldía Municipal realizados | Estudios | | | | 5,00 |
| Municipalidades con cambio institucional implementado | Municipios | 8,00 | 6,00 | | 23,00 |
| Plan de Fortalecimiento del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento implementado | N/A | | | | |
| Equipamiento instalado en SANAA para revisión de diseños de obra | N/A | | | | |
| Componente II. Obras Civiles construidas | | | | | |
| Sistemas de Saneamiento construidos | Sistemas | 8,00 | 3,00 | | 23,00 |
| Sistemas de Agua Potable Construidos | Sistema | | | | 3,00 |
| Gestión del Programa | | | | | |
| Monitoreo y evaluación | N/A | | | | |
| Coordinación | N/A | | | | |
