
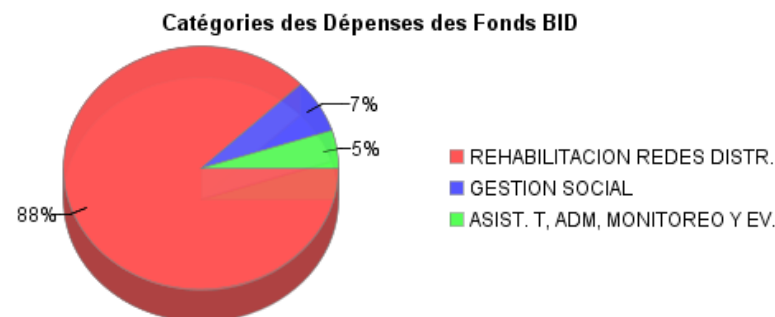
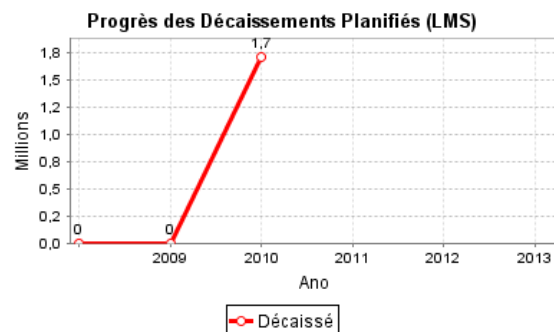



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD				
Secteur:	ENERGY-POWER DISTRIBUTION				
Numéro(s) de Prêt(s):	2042/OC-DR	Montant Courant Approuvé:	40.000.000,00	Initial BID:	40.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	1.700.000,00	Courant BID:	40.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	4,25	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	38.300.000,00	Cofinancement/Pays:	12.730.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	52.730.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	240

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Apr 28, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 29, 2011

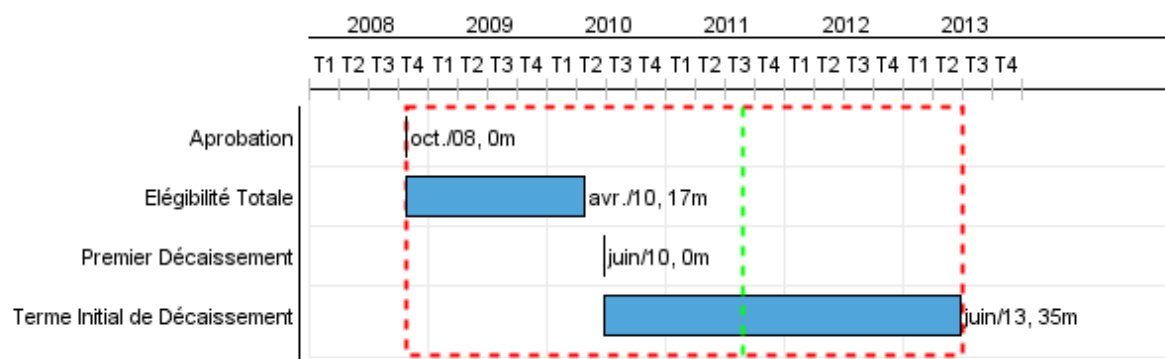

## Progrès Cumulé à 2010

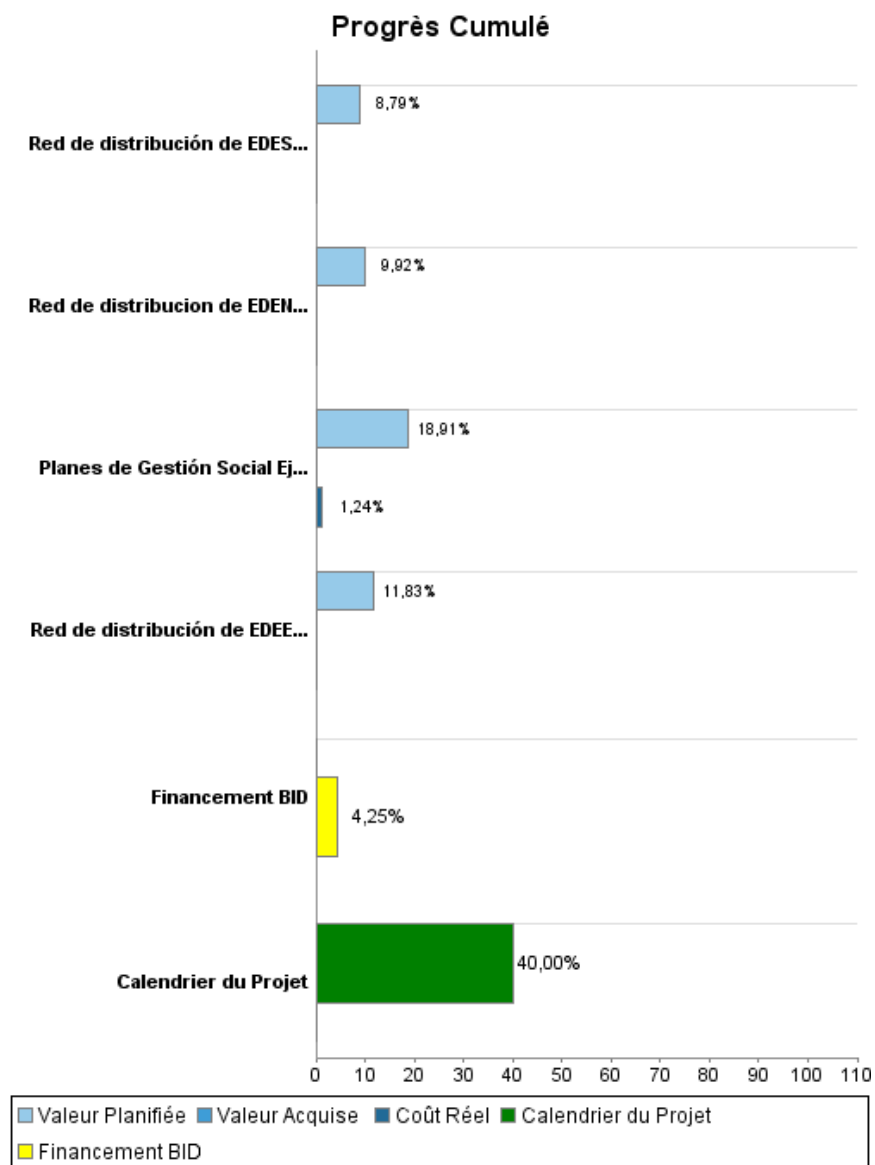

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Eficiencia mejorada
------------------	---------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Indice de recaudación EdeNorte	%	89,45	2009	P	90,06	94,00	95,00	96,00	96,00
				A	88,96				
Indice de Recaudación EdeSur	%	92,48	2009	P	93,16	97,46	97,70	98,10	98,10
				A	85,91				
Indice de Recaudación EdeEste	%	94,76	2009	P	93,60	94,40	95,30	96,10	96,10
				A	93,79				
Porcentaje de pérdidas EdeNorte	%	27,10	2009	P	23,75	25,00	23,00	21,00	21,00
				A	29,58				
Porcentaje de pérdidas EdeSur	%	22,51	2009	P	18,38	28,18	22,08	18,50	18,50
				A	25,37				
Porcentaje de pérdidas EdeEste	%	44,32	2009	P	42,20	35,20	30,20	25,20	16,20
				A	41,80				
Indice de recuperacion de efectivo CRI EdeNorte	%	65,21	2009	P	68,67	70,50	73,50	76,50	76,50
				A	62,65				
Indice de recuperacion de efectivo CRI EdeSur	%	66,92	2009	P	76,04	70,00	76,13	79,95	79,95
				A	64,11				
Indice de recuperacion de efectivo CRI, EdeEste	%	52,76	2009	P	54,10	61,20	66,50	71,90	71,90
				A	53,20				

<b>Résultat:</b>	Disponibilidad de energía a nivel nacional incrementada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Promedio ponderado anual de horas de servicio en EdeNORTE	horas	3.522,00	2006	P					0,00
				A					
Promedio ponderado anual de horas de servicio EdeSUR	horas	3.348,00	2006	P					0,00
				A					
Promedio ponderado anual de horas de servicio EdeEste	horas	3.396,00	2006	P					0,00
				A					

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Rehabilitación de redes de distribución</b>									
Red de distribución de EDENORTE rehabilitada	Kilómetros				300,00	1.860.000,00			18.754.000,00
Red de distribución de EDESUR rehabilitada	Kilómetros				163,00	1.374.000,00			15.640.000,00
Red de distribución de EDEESTE rehabilitada	Kilómetros				90,00	1.408.000,00			11.905.000,00
<b>Resumen Gestión Social por empresa distribuidora</b>									
Planes de Gestión Social Ejecutados EdeNorte	planes	2,00			6,00	265.000,00	6.000,00		959.000,00
Planes de Gestión Social Ejecutados EdeSur	planes	2,00			12,00	152.000,00	10.000,00		804.000,00
Planes de Gestión Social Ejecutados EdeEste	planes	2,00			7,00	273.000,00	4.000,00		871.000,00
<b>Asistencia técnica, administración, monitoreo y evaluación</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>5.332.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>48.933.000,00</b>
