
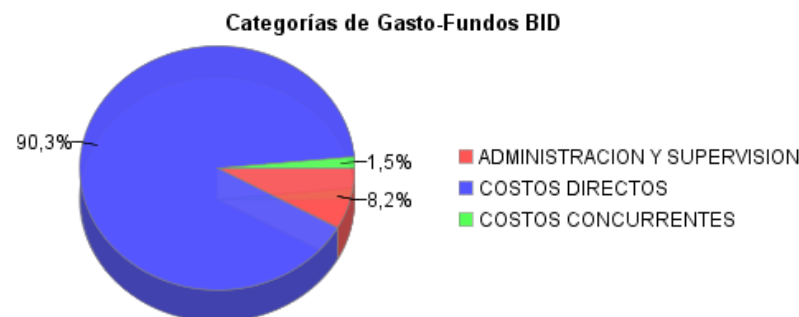
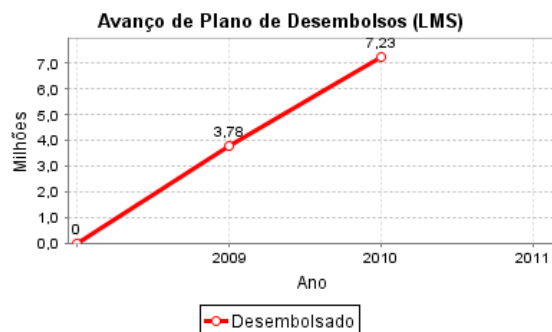



Relatório Resumido

| Dados Gerais | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| Executor: SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION ARGENTINA | | |
| Sector: TOURISM-DEVELOPMENT & MNGMT TOURISM DESTIN | | |
| Número da Operação: 1648/OC-AR | Atual: 33.000.000,00 | Original BID: 33.000.000,00 |
| Estágio: Approved | Desembolsado: 14.659.039,61 | Corrente BID: 33.000.000,00 |
| Tipo Operação: INV - Investimento | % Desembolsado: 44,42 | Pari-passu: 64,63 |
| Operação Relacionada: | Saldo: 18.340.960,39 | Cofinanciamento/País: 23.000.000,00 |
| Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation | | Original Estimado: 56.000.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): 162 |


| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|--------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: B | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 22, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011 |

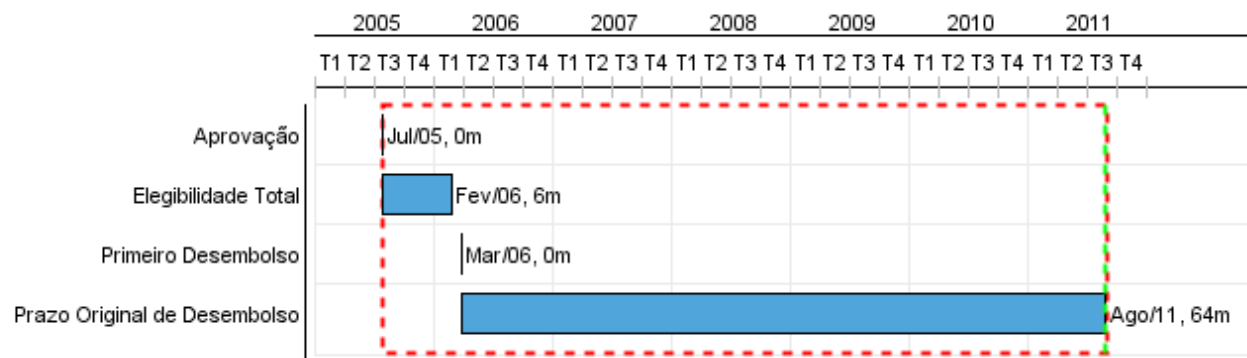

Progresso Acumulado até 2010

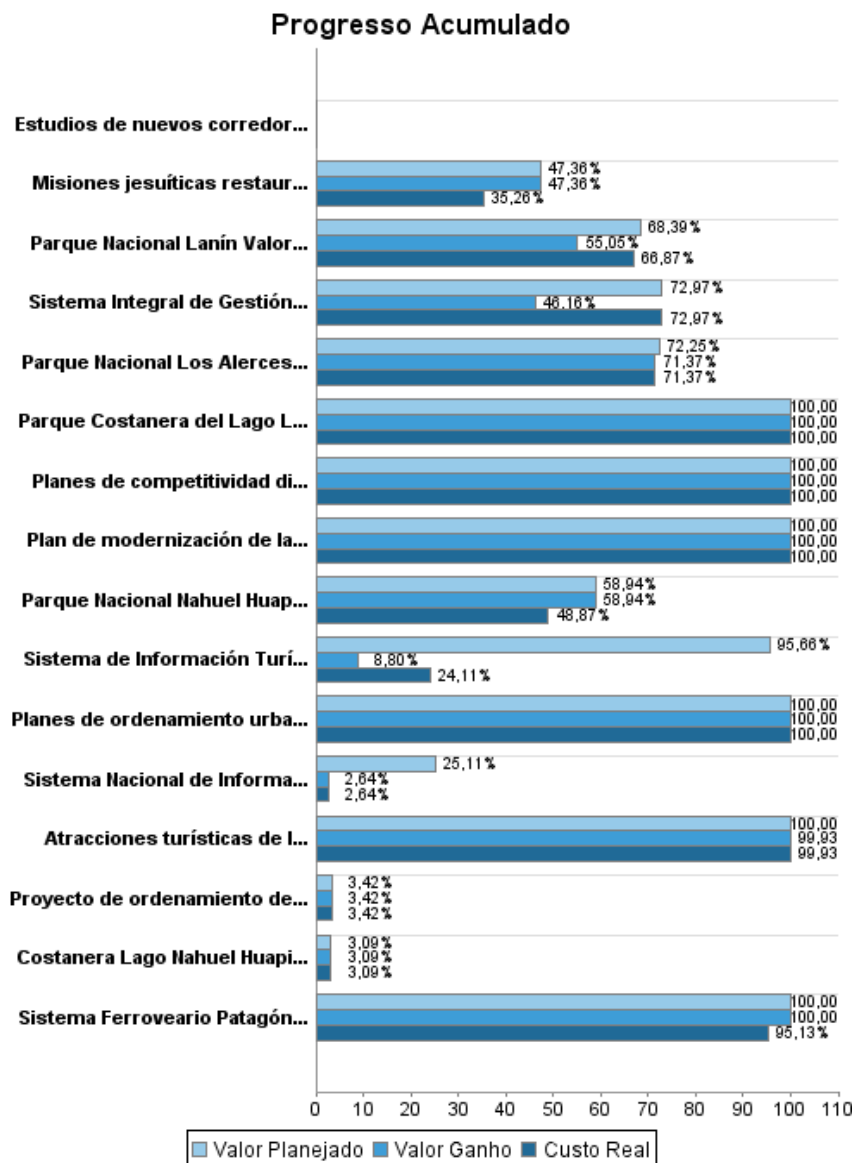

Progresso Acumulado

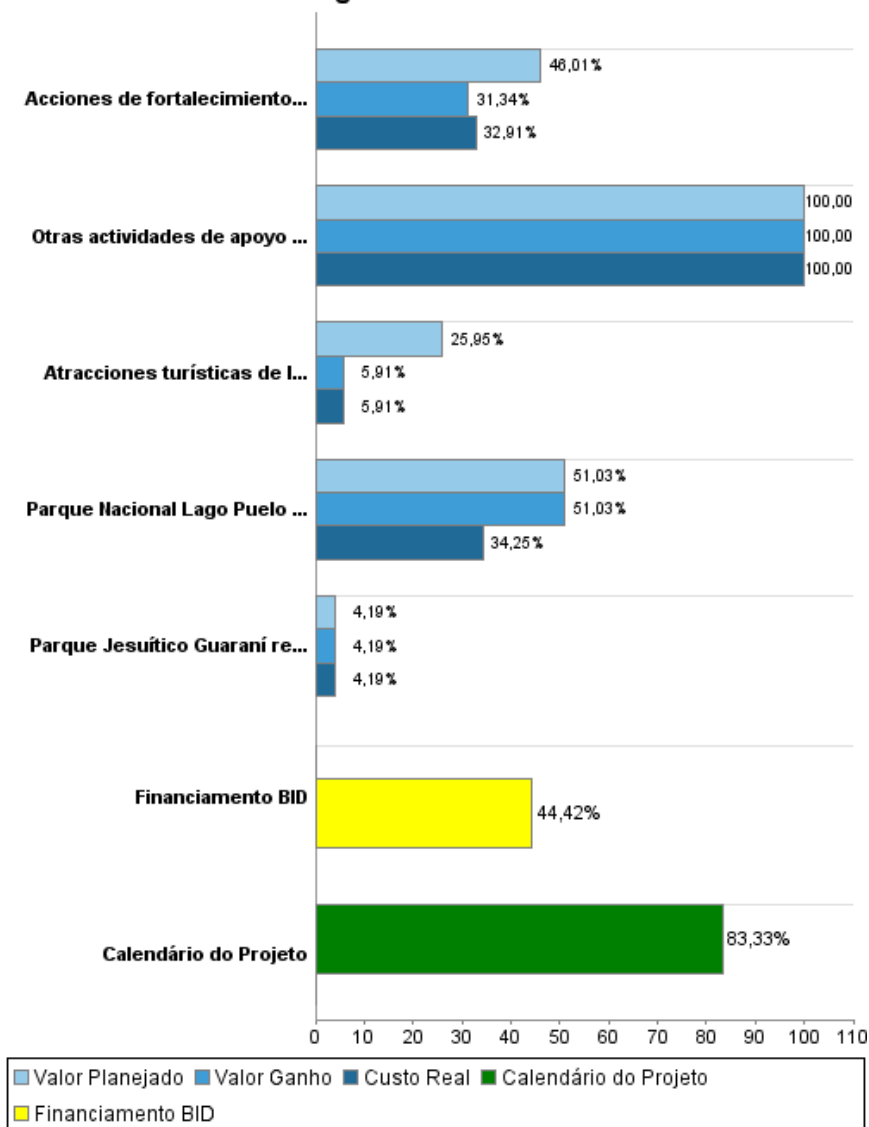

Resultados

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Generación de divisas provenientes de la actividad turística en los Corredores de los Lagos e Iguazú-Misiones incrementada. |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | Final do Projeto |
|---|----------------|--------------|----------------|--------|--------------------------|------------------|
| Visitantes a Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Esquel | visitantes | 990.250,00 | 2004 | P A | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| Ingresos generados por los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi-Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. | US\$ | 1.130.000,00 | 2004 | P A | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |
| Visitantes a San Ignacio Miní, en el área de las Misiones Jesuíticas Guaraníes. | visitantes | 202.831,00 | 2004 | P A | 368.400,00 113.120,00 | 368.400,00 |
| Tarifa de entrada para visitante extranjero a las Misiones Jesuíticas. | US\$ | 4,00 | 2004 | P A | 5,30 7,50 | 5,30 |
| Ingresos totales provenientes de recaudación de uso (pasajeros), servicios especiales y concesiones del Viejo Expreso Patagónico. | US\$ | 224.160,00 | 2004 | P A | 991.600,00 | 991.600,00 |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|--|----------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Valorización y gestión de atracciones turísticas públicas | | | | | | | | | |
| Parque Nacional Lanín Valorizado | Obras | 7,00 | 2,00 | | 13,00 | 650.000,00 | 596.998,00 | | 3.480.273,00 |
| Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque Nacional Arrayanes valorizados | Obras | 10,00 | 10,00 | | 22,00 | 1.000.000,00 | 460.674,00 | | 5.358.083,00 |
| Parque Nacional Los Alerces valorizado | Obras | | | | 11,00 | 72.000,00 | 52.586,00 | | 2.216.055,00 |
| Parque Nacional Lago Puelo valorizado | Obras | 1,00 | 1,00 | | 5,00 | 460.000,00 | 117.262,00 | | 2.042.226,00 |
| Atracciones turísticas de la provincia de Misiones valorizadas | Obras | | | | 4,00 | 289.222,00 | 45.667,00 | | 1.215.407,00 |
| Atracciones turísticas de la provincia del Neuquén valorizadas | Obras | | | | 5,00 | 25.000,00 | 24.319,00 | | 1.007.731,00 |
| Atracciones turísticas de la provincia de Río Negro valorizadas | Obras | | | | 2,00 | | | | 200.000,00 |
| Atracciones turísticas de la provincia del Chubut valorizadas | Obras | | | | 11,00 | | | | 801.801,00 |
| Sistema Ferrovieario Patagónico La Trochita restaurado | Expresos reaccionicionados | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 170.000,00 | 72.478,00 | | 2.004.404,00 |
| Parque Costanera del Lago Lácar construído | Parques costeros | | | | 1,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 1.559.517,00 |
| Acceso a Cerro Catedral mejorado | Accesos | | | | 1,00 | | | | 1.351.674,00 |
| Misiones jesuíticas restauradas (San Ignacio Mini y Santa Ana) | Misiones | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | 600.000,00 | 232.018,00 | | 3.039.676,00 |
| Parque Jesuítico Guaraní rehabilitado y ampliado | Parques | | | | 1,00 | 43.686,00 | 43.686,00 | | 1.043.686,00 |
| Costanera Lago Nahuel Huapi construída | Costaneras | | | | 1,00 | 27.692,00 | 27.692,00 | | 2.063.721,00 |
| Parque lineal Pocahullo construído | Parques | | | | 1,00 | | | | 2.017.676,00 |
| Proyecto de ordenamiento del entorno de las ruinas de San Ignacio implementado | Reordenamientos | | | | 1,00 | 70.757,00 | 70.757,00 | | 2.070.757,00 |
| Apoyo a la estructuración y promoción de los corredores | | | | | | | | | |
| Planes de competitividad diseñados (Corredor Los Lagos y Corredor Iguazú-Misiones) | Planes | | | | 2,00 | | | | 278.164,00 |
| Acciones de fortalecimiento, capacitación y sensibilización realizadas | Proyectos | 1,00 | | | 5,00 | 125.000,00 | 13.376,00 | | 852.081,00 |
| Sistema de Información Turística (SITU) implementado | Sistemas | 1,00 | | | 1,00 | 300.000,00 | 52.896,00 | | 345.386,00 |
| Planes de ordenamiento urbano elaborados | Planes | | | | 15,00 | | | | 167.659,00 |
| Estudios de nuevos corredores completados | Estudios | | | | 5,00 | | | | |
| Otras actividades de apoyo a la estructuración y promoción de los corredores | Actividades | 1,00 | 1,00 | | 7,00 | | | | 796.600,00 |

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1004 - Improvement of the Competitiveness of Tourism
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 22/03/2011

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Fortalecimiento de la administración turística nacional | | | | | | | | | |
| Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGINA) implementado | Sistemas | 1,00 | | | 2,00 | 297.462,00 | 297.462,00 | | 1.109.694,00 |
| Plan de modernización de la gestión de los Recursos Humanos de la SECTUR implementado | Planes | | | | 4,00 | 60.201,00 | 60.201,00 | | 321.361,00 |
| Sistema Nacional de Información Turística (SITA) desarrollado | Sistemas | | | | 1,00 | 300.000,00 | | | 1.335.242,00 |
| Administración, auditoría y costos financieros | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.641.020,00 | 2.318.072,00 | | 36.678.874,00 |
