
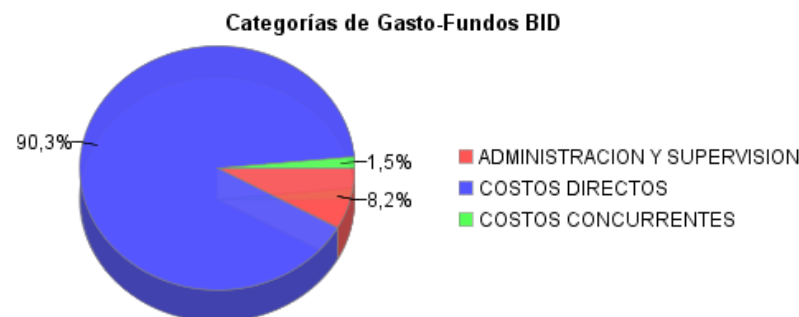
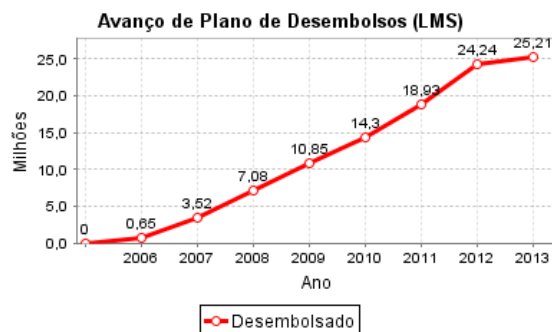


Relatório Resumido

| Dados Gerais | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| Executor: SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION ARGENTINA | | |
| Sector: SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT | | |
| Número da Operação: 1648/OC-AR | Atual: 33.000.000,00 | Original BID: 33.000.000,00 |
| Estágio: Approved | Desembolsado: 25.212.688,90 | Corrente BID: 33.000.000,00 |
| Tipo Operação: INV - Investimento | % Desembolsado: 76,40 | Pari-passu: 59,00 |
| Operação Relacionada: RG-T1674 | Saldo: 7.787.311,10 | Cofinanciamento/País: 23.000.000,00 |
| Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation | | Original Estimado: 56.000.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): 162 |


| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|-----------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: B(R) | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 07-may-2013 Validado pelo Representante do País: |

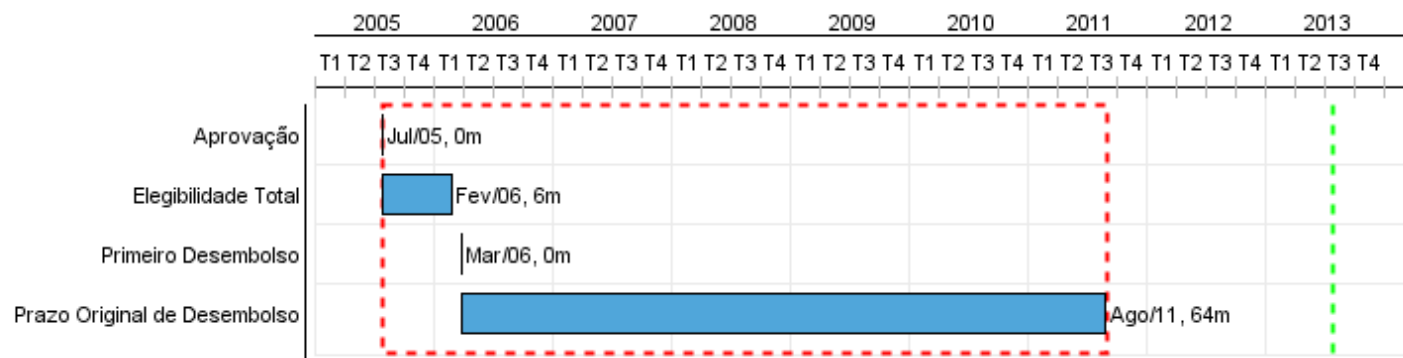

Progresso Acumulado até 2012



Progresso Acumulado

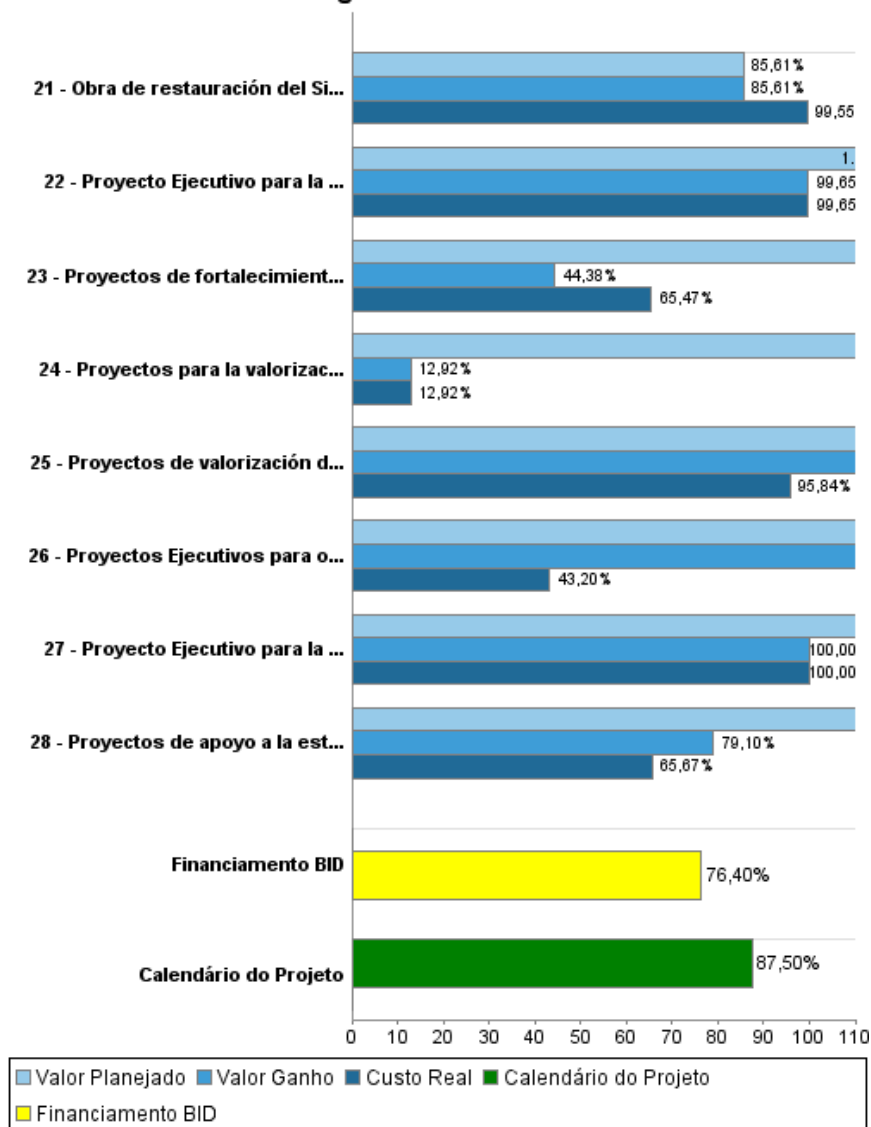

Resultados

| | |
|---------------------|--|
| Resultado: | Generación de divisas provenientes de la actividad turística en los Corredores de los Lagos e Iguazú-Misiones incrementada. |
| Suposições: | Supone la no existencia de desastres naturales (como la erupción del Volcan Puyehue) u otros factores de crisis internacionales que afecten el flujo de turismo |
| Observações: | En el 2011, la erupción del Volcan Puyehue efectó directamente las áreas intervenidas por el programa causando daños materiales cuantiosos y parando por meses el flujo de turistas. |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | Final do Projeto |
|---|----------------|--------------|----------------|--------|--------------------------|------------------|
| Visitantes a Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Esquel | visitantes | 990.250,00 | 2004 | P A | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| Ingresos generados por los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi-Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. | US\$ | 1.130.000,00 | 2004 | P A | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |
| Visitantes a San Ignacio Miní, en el área de las Misiones Jesuíticas Guaraníes. | visitantes | 202.831,00 | 2004 | P A | 368.400,00 113.120,00 | 368.400,00 |
| Tarifa de entrada para visitante extranjero a las Misiones Jesuíticas. | US\$ | 4,00 | 2004 | P A | 5,30 7,50 | 5,30 |
| Ingresos totales provenientes de recaudación de uso (pasajeros), servicios especiales y concesiones del Viejo Expreso Patagónico. | US\$ | 224.160,00 | 2004 | P A | 991.600,00 | 991.600,00 |

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Areas Protegidas con gestión de manejo sostenible |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Porcentaje de áreas protegidas intervenidas con el Programa como proporción de la superficie total del país (sin incluir la porción insular y antártida argentina). | Porcentaje | | 2004 | P A | | 0,53 |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|--|----------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Valorización y gestión de atracciones turísticas públicas | | | | | | | | | |
| Proyectos para la valorización del Parque Nacional Lanin ejecutados | Proyectos | 2,00 | | | 19,00 | 175.027,00 | 31.509,00 | | 2.770.000,00 |
| Proyectos de valorización del Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque Nacional Arrayanes ejecutados. | Proyectos | 8,00 | 8,00 | | 29,00 | 1.694.688,00 | 403.000,00 | | 9.163.000,00 |
| Proyectos de valorización del Parque Nacional Los Alerces ejecutados | Proyectos | 1,00 | 1,00 | | 9,00 | | | | 1.626.000,00 |
| Proyectos de valorización del Parque Nacional Lago Puelo ejecutadas | Proyectos | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | 1.993.550,00 | 730.000,00 | | 2.111.000,00 |
| Proyectos Ejecutivos para obras de valorización de atracciones turísticas de la provincia de Misiones elaborados | Proyectos Ejecutivos | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 320.550,00 | 26.153,00 | | 279.000,00 |
| Obras de valorización de atracciones turísticas de la provincia del Neuquén ejecutadas | Obras | | | | 3,00 | 355.070,00 | | | 1.192.000,00 |
| Proyecto Ejecutivo para la valorización de atracciones turísticas de la provincia de Río Negro elaborado | Proyecto Ejecutivo | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 120.000,00 |
| Obras de valorización de atracciones turísticas de la provincia del Chubut ejecutadas | Obras | | | | 1,00 | 596.869,00 | | | 1.003.000,00 |
| Obra de restauración del Sistema Ferroviario Patagónico La Trochita ejecutada | Obra | | | | 1,00 | | | | 2.374.000,00 |
| Obra de construcción del Parque Costanera del Lago Lácar ejecutada | Obra | | | | 1,00 | | | | 1.741.000,00 |
| Obra para la mejora de acceso a Cerro Catedral ejecutada | Obras | | | | 1,00 | | | | 2.107.000,00 |
| Obras de restauración de Misiones jesuíticas (San Ignacio Mini, Santa Ana, Santa Maria y Loreto) ejecutadas | Obras | | | | 4,00 | 1.476.980,00 | 369.000,00 | | 4.078.000,00 |
| Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del Parque Jesuítico Guaraní elaborado | Proyecto Ejecutivo | | | | 1,00 | | | | 239.000,00 |
| Proyecto Ejecutivo para la construcción de la Costanera Lago Nahuel Huapi elaborado | Proyecto Ejecutivo | | | | 1,00 | | | | 108.000,00 |
| Proyecto Ejecutivo para construcción en el Parque lineal Pocahullo elaborado | Proyecto Ejecutivo | | | | 1,00 | | | | 76.000,00 |
| Proyectos Ejecutivos para el ordenamiento del entorno de las ruinas de San Ignacio elaborados | Proyecto Ejecutivo | 1,00 | | | 2,00 | 655.550,00 | 148.000,00 | | 766.000,00 |

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|--|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Proyectos para la valorización del Parque Nacional Iguazú ejecutados | Proyectos | | | | 1,00 | 1.068.550,00 | 341.000,00 | | 3.708.000,00 |
| Obras en respuesta a la emergencia por la erupción del volcán Puyehue ejecutadas | Obras | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | 4.417.782,00 | 4.189.000,00 | | 7.155.000,00 |
| Apoyo a la estructuración y promoción de los corredores | | | | | | | | | |
| Planes de competitividad diseñados (Corredor Los Lagos y Corredor Iguazú-Misiones) | Planes | | | | 2,00 | | | | 363.000,00 |
| Proyectos de fortalecimiento, capacitación y sensibilización ejecutados | Proyectos | 2,00 | 2,00 | | 7,00 | 570.878,00 | 408.000,00 | | 1.888.000,00 |
| Sistema de Información Turística (SITU) implementado | Sistemas | | | | 2,00 | 36.064,00 | 38.000,00 | | 664.000,00 |
| Planes de ordenamiento urbano elaborados | Planes | | | | 13,00 | | | | 167.659,00 |
| Proyectos de apoyo a la estructuración y promoción de los corredores ejecutados | Proyectos | 1,00 | | | 13,00 | 341.736,00 | 17.000,00 | | 1.399.000,00 |
| Planes de Manejo de APN elaborados | Planes | 18,00 | 7,00 | | 20,00 | 299.546,00 | 148.044,55 | | 380.000,00 |
| Fortalecimiento de la administración turística nacional | | | | | | | | | |
| Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGINA) implementado | Sistemas | 1,00 | | | 2,00 | 297.462,00 | | | 985.000,00 |
| Plan de modernización de la gestión de los Recursos Humanos del MINTUR implementado | Planes | | | | 3,00 | | | | 320.261,00 |
| Sistema Nacional de Información Turística (SITA) y Sistema de Información y Estadísticas Turísticas (SIET) desarrollados | Sistemas | | | | 1,00 | 549.936,00 | 70.000,00 | | 415.000,00 |
| Planes de fortalecimiento en respuesta a la erupción del volcán Puyehue desarrolladas | Planes | 3,00 | 3,00 | | 4,00 | 358.442,00 | 431.000,00 | | 2.708.000,00 |
| Administración, auditoría y costos financieros | | | | | | | | | |
| Administración, auditoría y costos financieros | N/A | | | | | 1.562.000,00 | 1.132.000,00 | | 6.093.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 16.770.680,00 | 8.481.706,55 | | 55.998.920,00 |
