

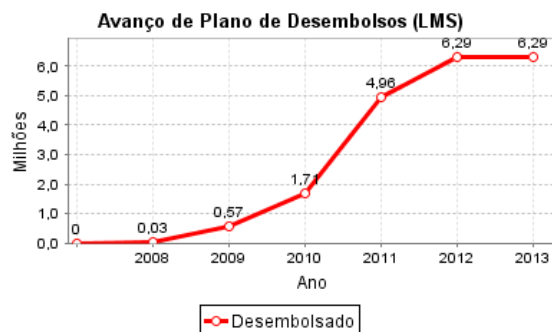



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION				
Número da Operação:	1839/SF-BO	Atual:	10.000.000,00	Original BID:	10.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	6.286.216,17	Corrente BID:	10.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	62,86	Pari-passu:	95,00
Operação Relacionada:	BO-T1045, RS-T1341, BO-T1114	Saldo:	3.713.783,83	Cofinanciamento/País:	558.000,00
Subtipo de Operação:	INO - Innovation Operation			Original Estimado:	10.558.000,00
				Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?
		Validado pelo Chefe de Divisão: 13-mar-2013
		Validado pelo Representante do País: 13-mar-2013

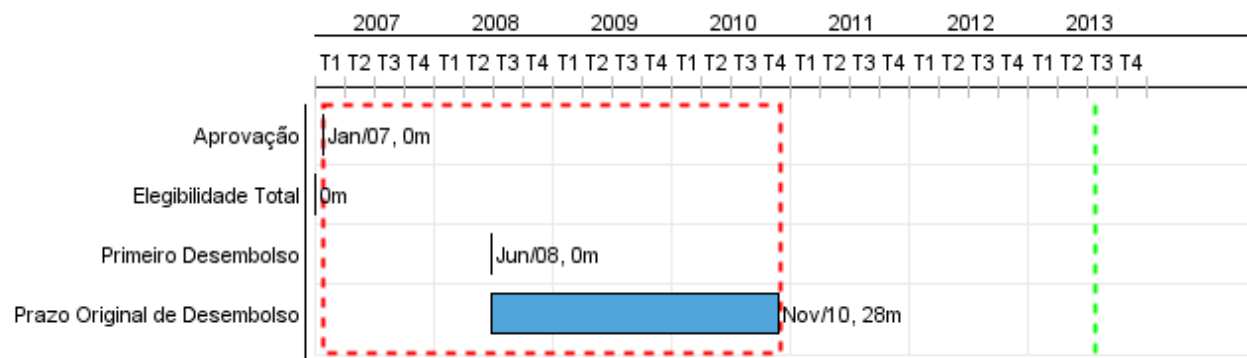

Progresso Acumulado até 2012

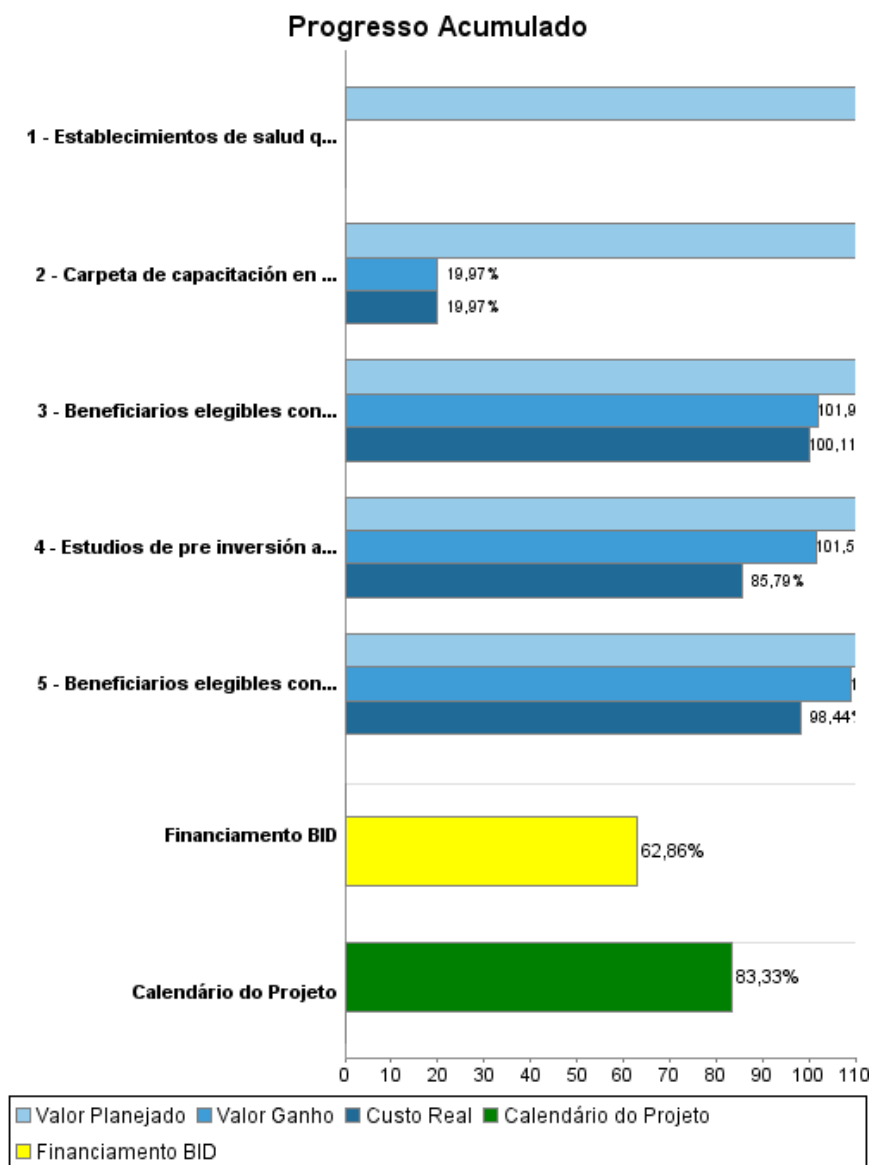

Resultados

Resultado:	Oferta de servicios integrales de salud materno-infantil con calidad y pertinencia cultural aumentada en los municipios priorizados
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Partos atendidos por personal calificado en los municipios priorizados	Personas	1.274,00	2011	P	1.274,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
				A	1.404,00	1.277,00		
Partos atendidos por personal calificado sobre el total de los partos proyectados en los municipios priorizados.	Porcentaje	64,00	2011	P	64,00	66,00	69,00	69,00
				A	66,40	63,00		

Resultado:	Habitabilidad y higiene doméstica de hogares pobres mejorada en los municipios priorizados
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Hogares indígenas con casas nuevas	Hogares		2010	P	2.119,00			2.119,00
				A	2.109,00			

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 2.1: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Salud)									
Establecimientos de salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes	Establecimientos	4,00			15,00	1.582.891,77			5.964.855,00
Carpeta de capacitación en Salud Familiar Comunitaria Intercultural elaborada	Carpeta				1,00	100.000,00	39.942,00		200.000,00
Administración (fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud y Deportes + costo administrativo del Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social)	N/A					169.699,00	102.647,00		356.304,04
Estudios de pre inversión a diseño final de establecimientos de salud, incluyendo casas maternas, finalizados	Estudios	60,00	61,00		60,00	170.232,12	146.227,00		170.450,00
Fortalecimiento del FPS	N/A					65.868,00	62.600,00		160.496,00
Costos Administrativos y Convenio subsidiario con FPS por producto	N/A					96.698,00	87.890,00		307.766,40
Componente 2.2: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Vivienda)									
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de ayudante recibidas según manual operativo	Personas				4.238,00				1.718.511,14
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de albañil recibidas según manual operativo	Personas				2.119,00				1.234.631,61
Administración (fortalecimiento institucional del Viceministerio de Vivienda y Urbanizacion)	N/A								7.762,00
Auditoría (de procesos) del componente 2.2	N/A					20.000,00	20.000,00		20.000,00
Componente 3: Seguimiento, Monitoreo y Auditoría									
Administratacion (equipo de coordinación y seguimiento del Ministerio de Planificacion del Desarrollo)	N/A					35.342,32	18.003,00		81.429,00
Evaluación final	N/A								25.000,00
Auditoria (financiera+operativa)	N/A					10.000,00	10.770,00		35.795,00
Convenio con FPS (costos administrativo) por producto	N/A					11.667,00			10.000,00
Costos financieros									
Costos financieros	N/A								35.000,00
Intereses									
Intereses	N/A								130.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BO-L1012 - Social Protection and Community Integral Development
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 12/03/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
FIV									
FIV	N/A								100.000,00
TOTAL						2.262.398,21	488.079,00		10.558.000,19
