
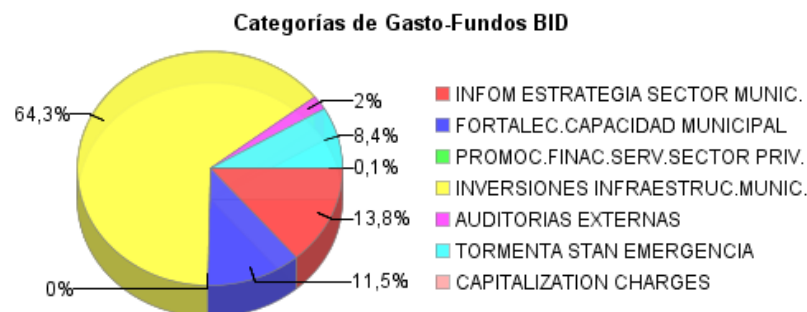
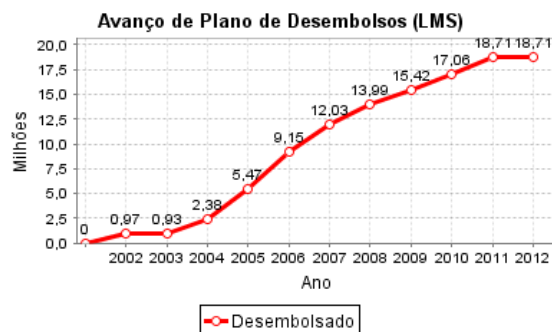



Relatório Resumido

| Dados Gerais | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Executor: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL | | |
| Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | | |
| Número da Operação: 1217/OC-GU-2;1217/OC-GU-1 | Atual: 18.709.656,17 | Original BID: 19.531.800,00 |
| Estágio: Approved | Desembolsado: 18.709.656,17 | Corrente BID: 18.709.656,17 |
| Tipo Operação: INV - Investimento | % Desembolsado: 100,00 | Pari-passu: 80,00 |
| Operação Relacionada: TC9910054, TC9912052 | Saldo: | Cofinanciamento/País: 5.000.000,00 |
| Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation | | Original Estimado: 24.531.800,00 |
| | | Período de Amortização (meses): 192 |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria do impacto social: B(R) | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 10-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 15-abr-2013 |

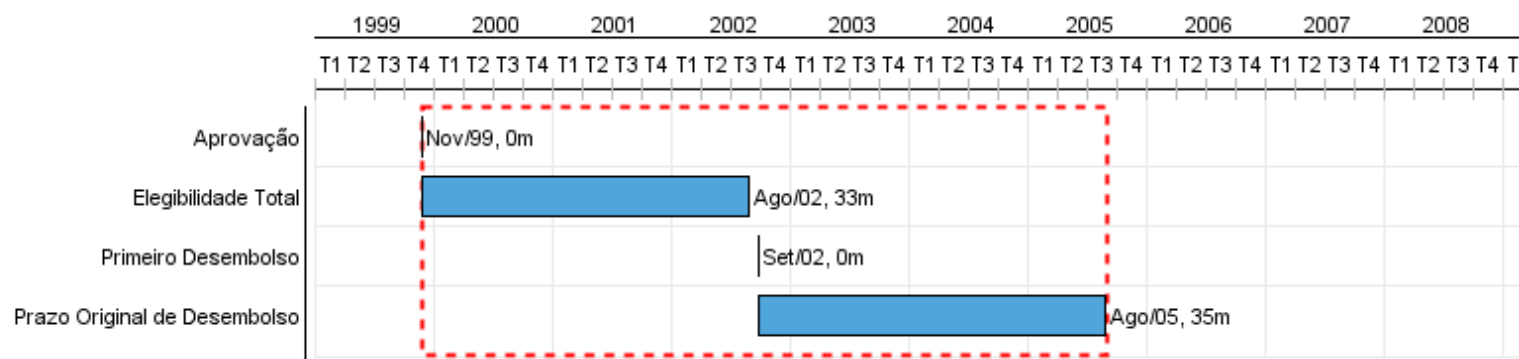

Progresso Acumulado até 2012

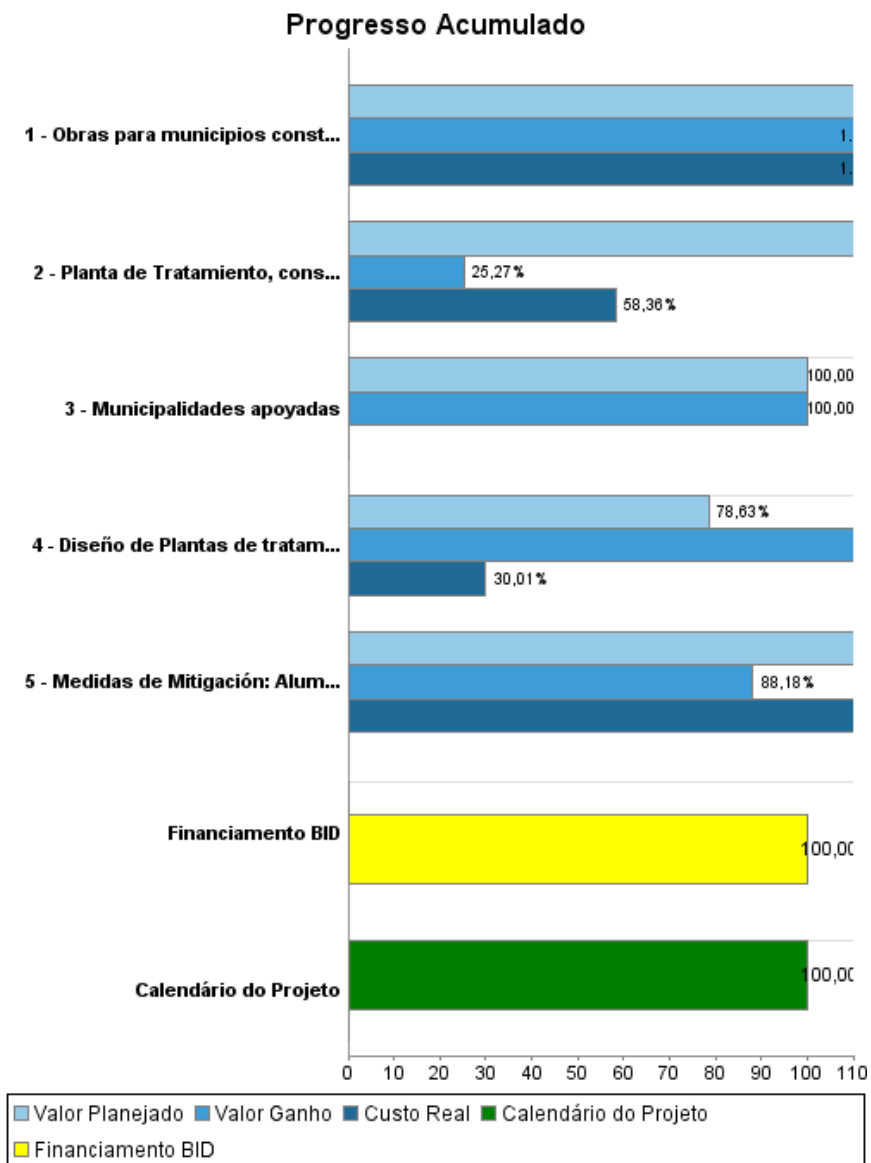

Resultados

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Resultado: | Proceso de descentralización en Guatemala fortalecido |
| Observações: | Con el desarrollo municipal |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2008 | 2009 | 2011 | Final do Projeto |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|---|-------|-------|------|------------------|
| Municipalidades mantienen y aplican procesos de reforma interna. | Municipalidades | 36,00 | 2007 | P | 36,00 | 36,00 | | 76,00 |
| | | | | A | 36,00 | | | |
| Gasto público administrado al nivel descentralizado incrementado | Porcentaje | 0,01 | 2000 | P | | | | 0,02 |
| | | | | A | | | | |

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Resultado: | Establecer mecanismos equitativos |
|-------------------|-----------------------------------|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2008 | 2009 | 2011 | Final do Projeto |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---|------|------|------|------------------|
| Tasa de interés | Diferencia tasa INFOM versus tasa de mercado | 12,00 | 2000 | P | | | | 10,00 |
| | | | | A | 1,00 | 1,00 | | |

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado: | Establecer financiamiento de los servicios publicos municipales |
| Suposições: | Todas las municipalidades que se beneficiaron de la construccion de mercados, plantas de tratamiento de agua; desarrollaron un pliego tarifario que esta siendo utilizado. |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2008 | 2009 | 2011 | Final do Projeto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|---|------|------|------|------------------|
| Municipalidades que se beneficiaron de inversiones publicas como mercados, plantas de tratamiento de agua, alcantarillados, etc., que estan cobrando tarifas adecuadas. | Municipalidades | 36,00 | 2000 | P | | | | 36,00 |
| | | | | A | | | | |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Componente 1: INFOM y la Estrategia para el Sector Municipal | | | | | | | | | |
| Diseño de Plantas de tratamiento, preparadas | Diseños | | | | 2,00 | | | | 139.976,51 |
| Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidad Municipal, Implementada | | | | | | | | | |
| Municipalidades apoyadas | Gobiernos | | | | 36,00 | | | | 4.005,00 |
| Componente 3: Promoción del Financiamiento y Servicios por parte del Sector Privado. | | | | | | | | | |
| Componente 4: Financiamiento de Inversiones en Infraestructura | | | | | | | | | |
| Obras para municipios construidas | Obras | 1,00 | 1,00 | | 38,00 | | | | 436.329,94 |
| Componente 5: Atención Emergencia Stan | | | | | | | | | |
| Planta de Tratamiento, construida | Planta de tratamiento | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 230.000,00 | 210.000,00 | | 1.081.849,39 |
| Medidas de Mitigación: Alumbrado y Adoquinamiento | medidas | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 34.703,49 | | 39.355,64 |
| Gestión del Programa | | | | | | | | | |
| Auditoría | N/A | | | | | 15.512,45 | 15.000,00 | | 80.000,01 |
| Administración de las Obras | N/A | | | | | 45.000,00 | 40.000,00 | | 168.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 290.512,45 | 299.703,49 | | 1.949.516,49 |
