

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.
Sector:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS
Número da Operação:	2024/OC-PN
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	12.500.000,00
Desembolsado:	11.342.330,40
% Desembolsado:	90,74
Saldo:	1.157.669,60

Custo Total e Fonte

Original BID:	12.500.000,00
Corrente BID:	12.500.000,00
Pari-passu:	50,00
Cofinanciamento/País:	12.500.000,00
Original Estimado:	25.000.000,00
Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social



Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação


Validado pelo Chefe de Divisão: 11-abr-2013
Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013

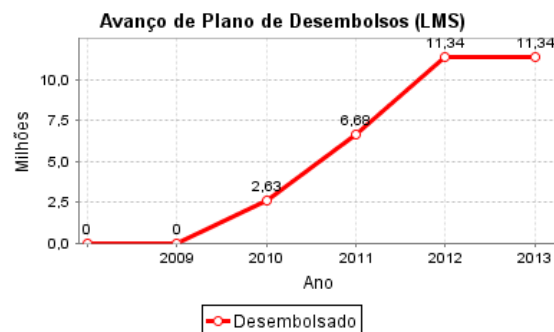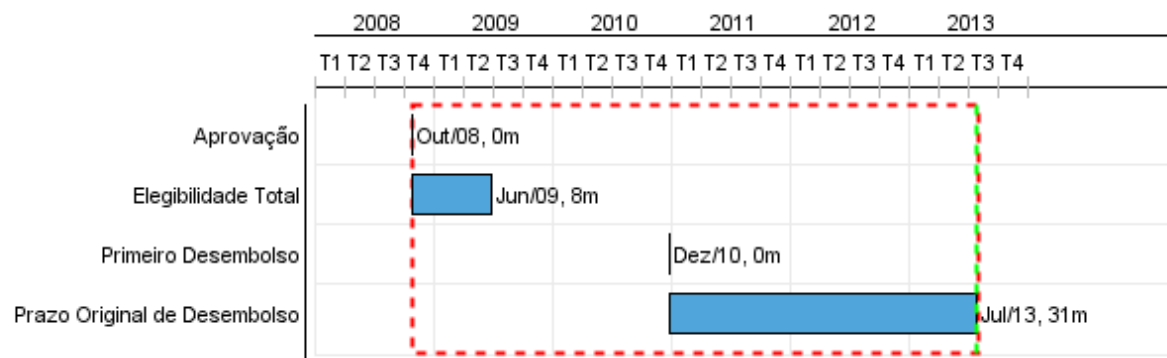

Categorias de Gasto-Fundos BID

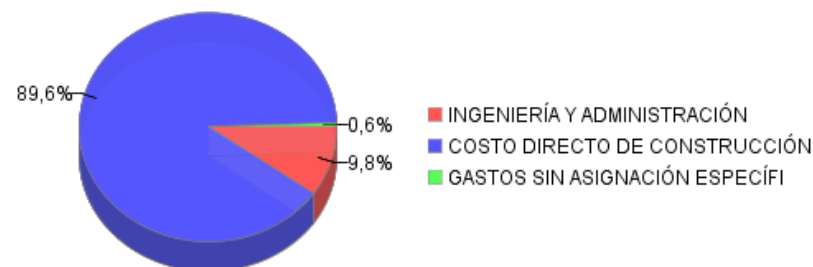

Progresso Acumulado até 2012

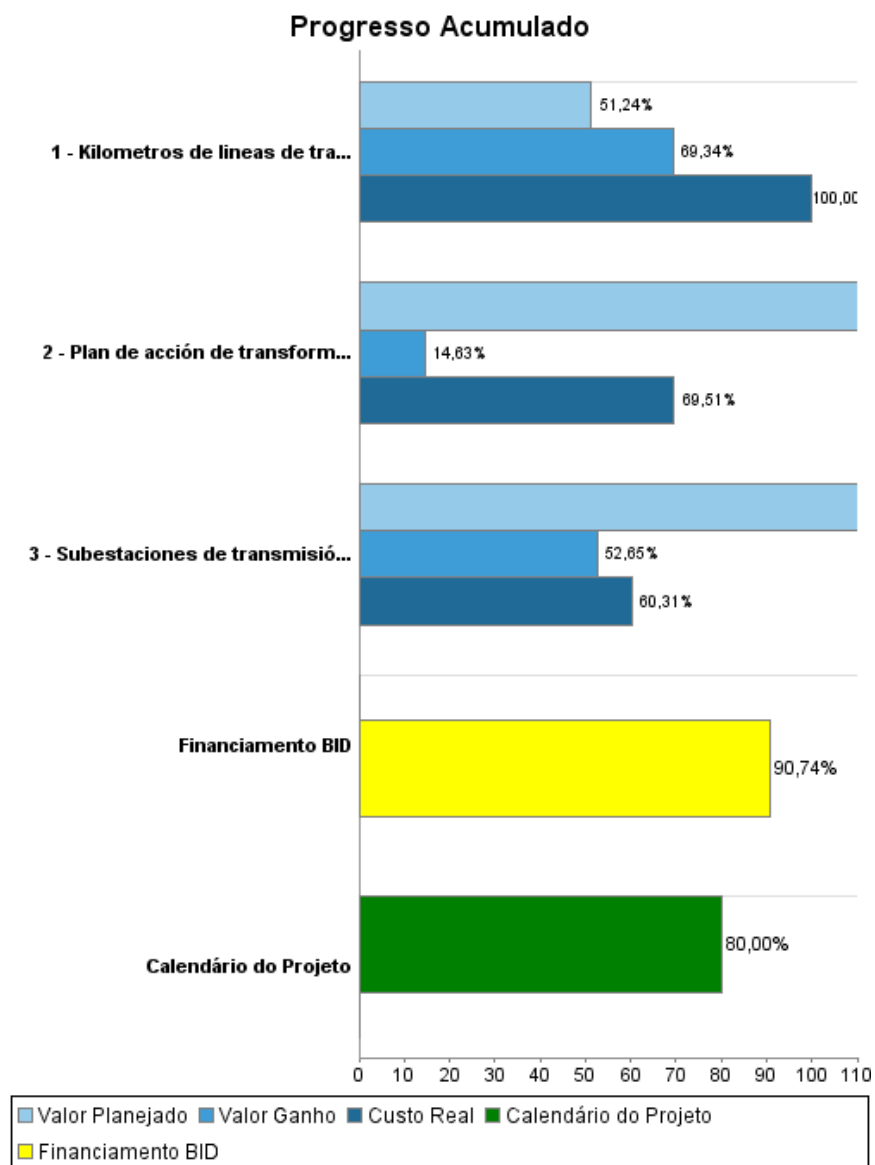

Resultados

Resultado:	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
Suposições:	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional	Gwh	8.412,90	2008	P A	8.881,90
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional.	MW	1.356,50	2008	P A	1.431,20

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II									
Subestaciones de transmisión ampliadas (Proyecto Colón Fase II, Subestación de Santa Rita y Pedregal)	Subestaciones	15,00			2,00	2.940.000,00	520.000,00		6.789.000,00
Componente 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers	36,00	1,00		121,00	2.104.000,00	5.462.000,00		17.622.000,00
Componente 2 - Actividades de transformación corporativa									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan	1,00			1,00		180.000,00		328.000,00
Gastos sin Asignación Específica									
Gastos sin asignación específica	N/A								1.810.000,00
Gastos Financieros									
Costos Financieros	N/A								1.527.000,00
TOTAL						5.044.000,00	6.162.000,00		28.076.000,00
