
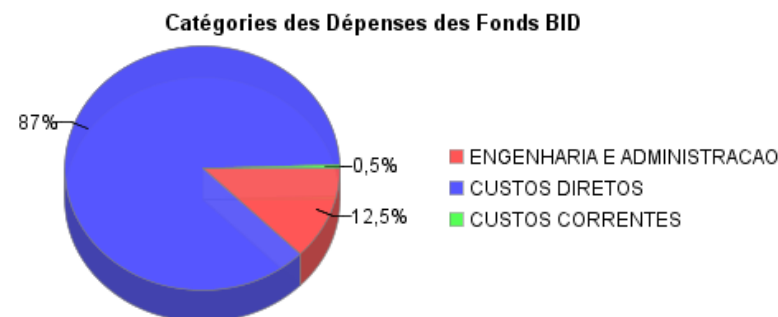
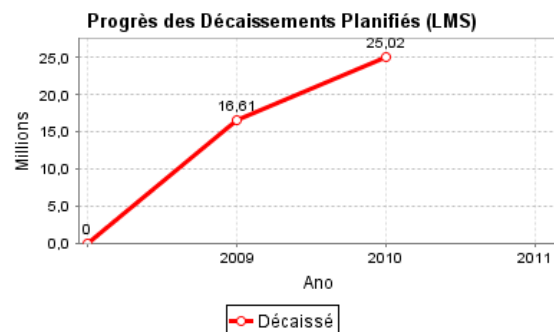



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING				
Numéro(s) de Prêt(s):	1563/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	46.500.000,00	Initial BID:	46.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	45.863.984,50	Courant BID:	46.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	98,63	Pari Passu:	43,43
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	636.015,50	Cofinancement/Pays:	31.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	77.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 24, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 24, 2011

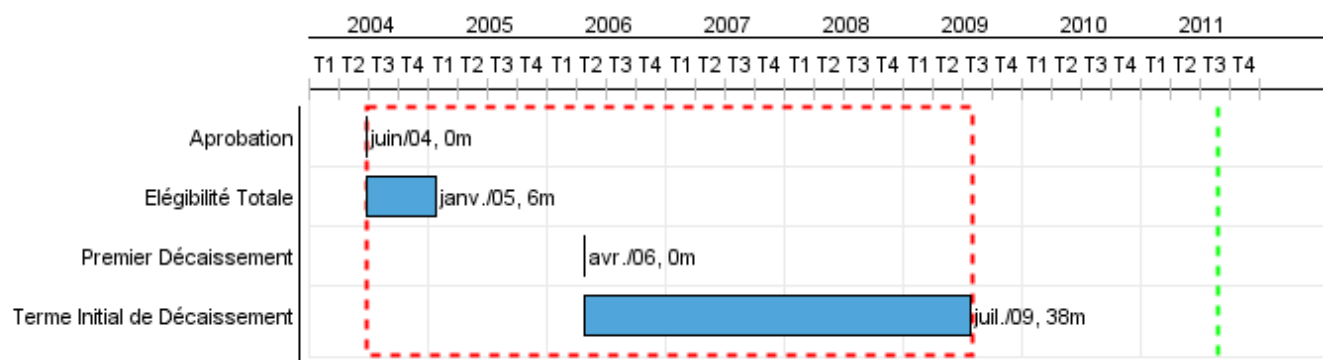

Progrès Cumulé à 2010

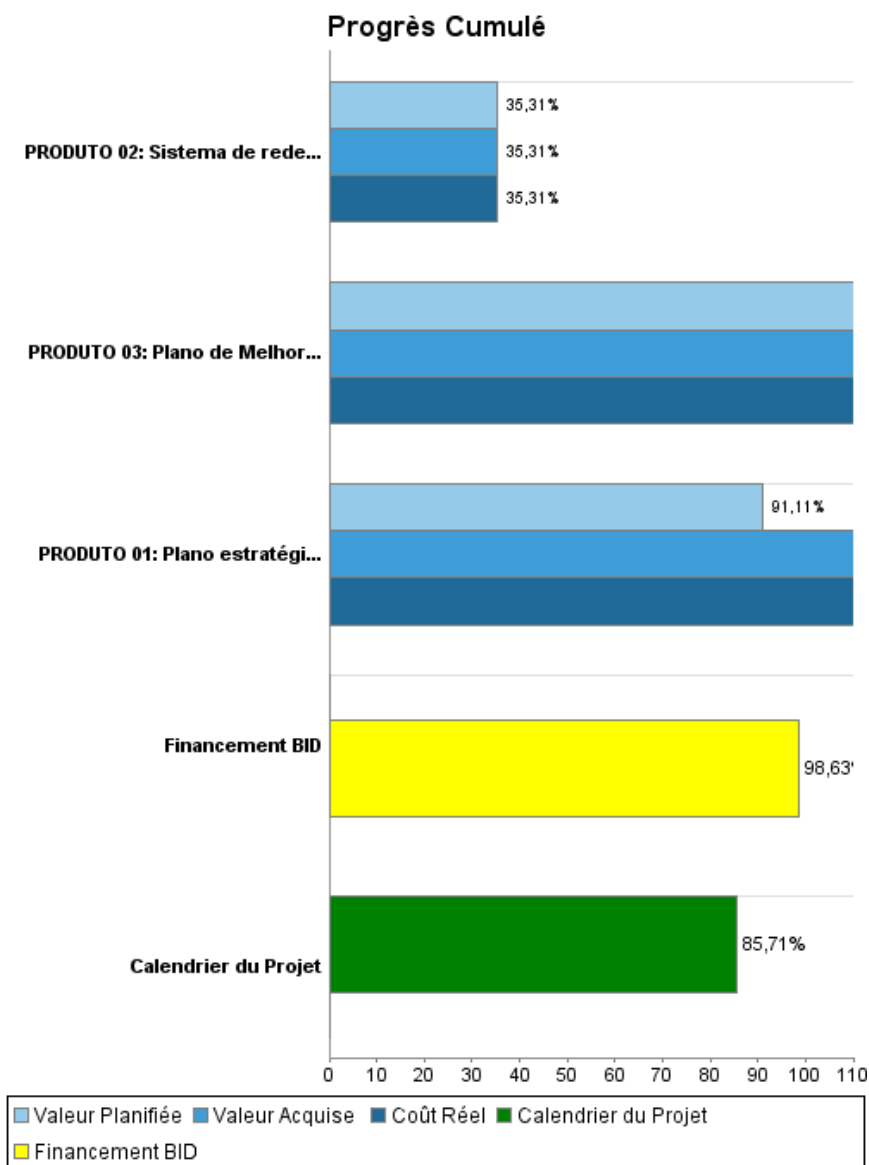

Résultats

Résultat:	Serviços de tratamento de água no Município de Belo Horizonte melhorados.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Interceptação de carga contaminante de 3620, medida em kg/DBO/dia removida, nas seguintes quantidades e cursos d'água (final do projeto / em 15.09.09): 1.2.1 - 1º de Maio - 160 / 158; 1.2.2 - N.S. da Piedade - 360 / 359; 1.2.3 - Baleares - 200 / 188;	kb/DBO/dia	3.620,00	2004	P	714,66
Reposição irregular de resíduos sólidos de 476 m3/ano em 2003 a 100m3/ano ao final do Programa (final do Programa / em 15.09.09): 1.3.1 - Baleares - 196 / 46; 1.3.2 - 1º de Maio - 5 / 2; 1.3.3 - N. S. da Piedade - 5 / 2; 1.3.4 - Engenho No	m3/ano	372,00	2004	P	100,00
				A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Redução do Risco de Inundação									
PRODUTO 01: Plano estratégico para redução de riscos de incundações nas regiões do Programa, implementado.	Plano				1,00	41.284.819,56	70.900.567,70		45.315.000,00
Melhoria da Qualidade dos Cursos D'água									
PRODUTO 02: Sistema de rede de esgoto na cidade de Belo Horizonte, reabilitado.	Sistema				1,00	1.122.957,89	1.122.957,89		3.180.000,00
Melhoria da Gestão Urbana e Ambiental									
PRODUTO 03: Plano de Melhoria da Gestão Urbana e Ambiental na cidade de Belo Horizonte, implementado.	Plano				1,00		3.344.106,99		2.785.000,00
Outros									
TOTAL						42.407.777,45	75.367.632,58		51.280.000,00
