
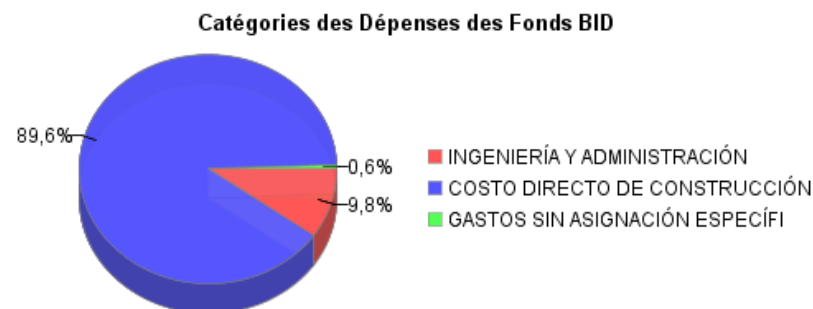
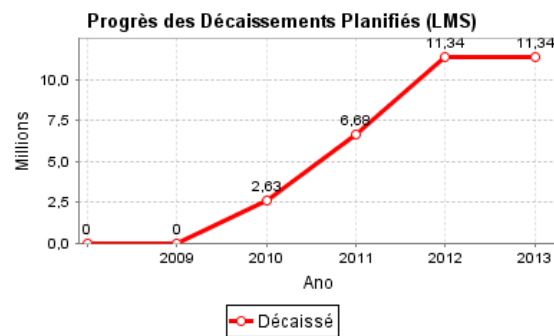



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.				
Secteur:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2024/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	12.500.000,00	Initial BID:	12.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	11.342.330,40	Courant BID:	12.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	90,74	Pari Passu:	50,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	1.157.669,60	Cofinancement/Pays:	12.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	25.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 11-abr-2013 Validé par le Représentant: 12-abr-2013

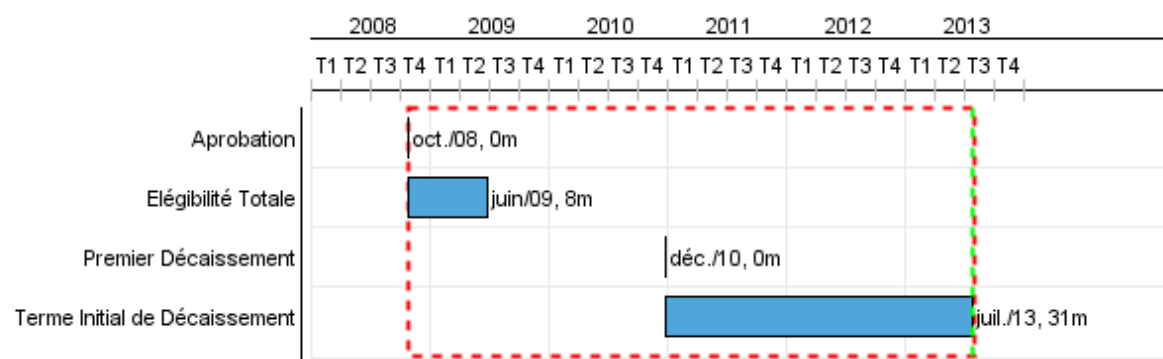

Progrès Cumulé à 2012

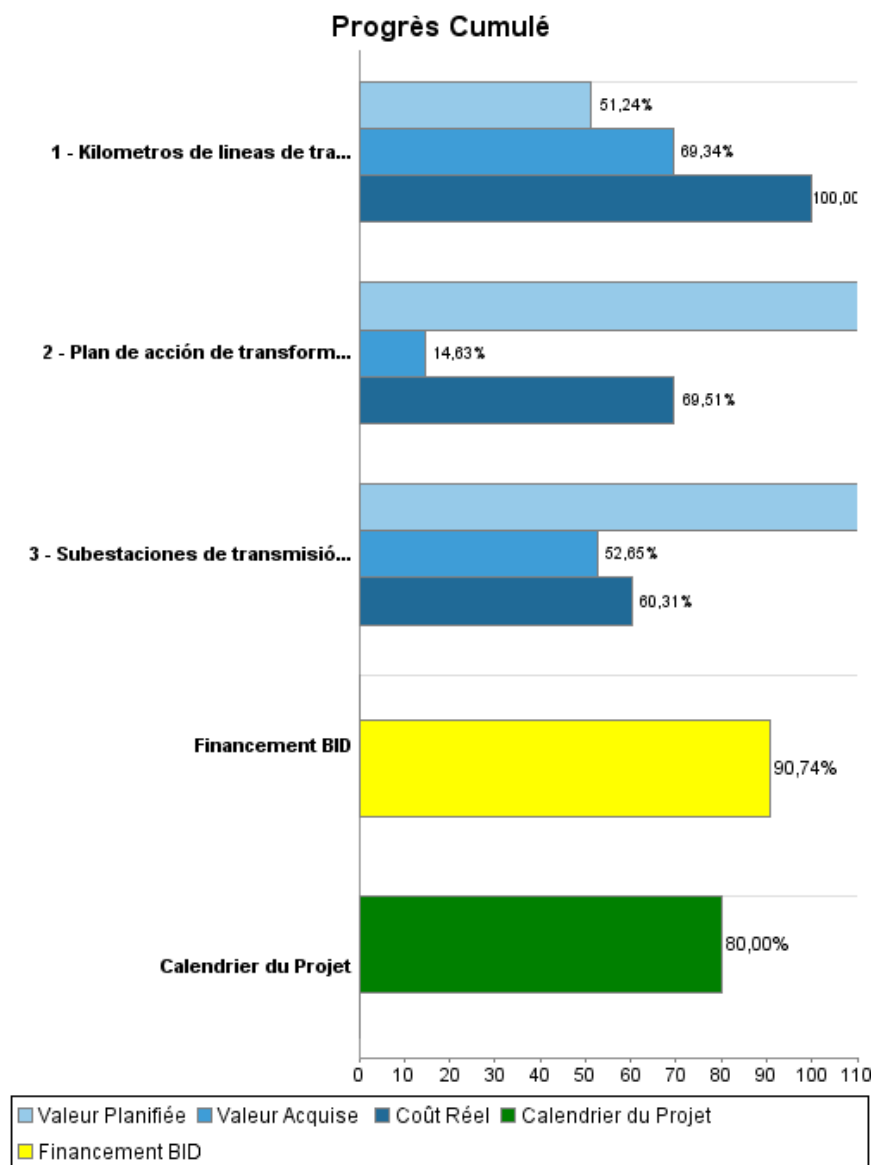

Résultats

Résultat:	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
Suposições:	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional	Gwh	8.412,90	2008	P A	8.881,90
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional.	MW	1.356,50	2008	P A	1.431,20

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II									
Subestaciones de transmisión ampliadas (Proyecto Colón Fase II, Subestación de Santa Rita y Pedregal)	Subestaciones	15,00			2,00	2.940.000,00	520.000,00		6.789.000,00
Composante 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers	36,00	1,00		121,00	2.104.000,00	5.462.000,00		17.622.000,00
Composante 2 - Actividades de transformación corporativa									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan	1,00			1,00		180.000,00		328.000,00
Gastos sin Asignación Específica									
Gastos sin asignación específica	N/A								1.810.000,00
Gastos Financieros									
Costos Financieros	N/A								1.527.000,00
TOTAL						5.044.000,00	6.162.000,00		28.076.000,00
