

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT
Número(s) de Préstamo:	2522/OC-PN
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1442
Subtipo de Operación:	ERF - Facilidad de Respuesta Inmediata a Emergencias

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	17.210.476,79
Monto Desembolsado a la fecha:	17.210.476,79
% Desembolsado:	100,00
Saldo:	

Costo total y Fuente

BID Original:	20.000.000,00
Actual BID:	17.210.476,79
Pari-passu:	97,00
Co-financiamiento/País:	600.000,00
Estimado Original:	20.600.000,00
Período de Amortización (meses):	168

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B
---	---

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
--

Validación

Validado por el Jefe de División:	25-sep-2012
Validado por Representante de País:	26-sep-2012

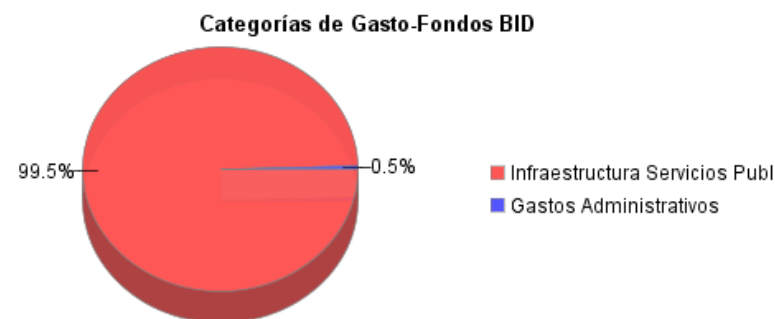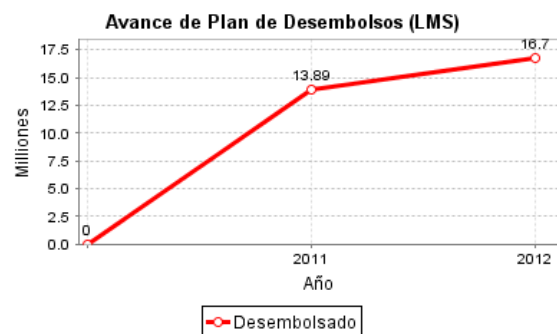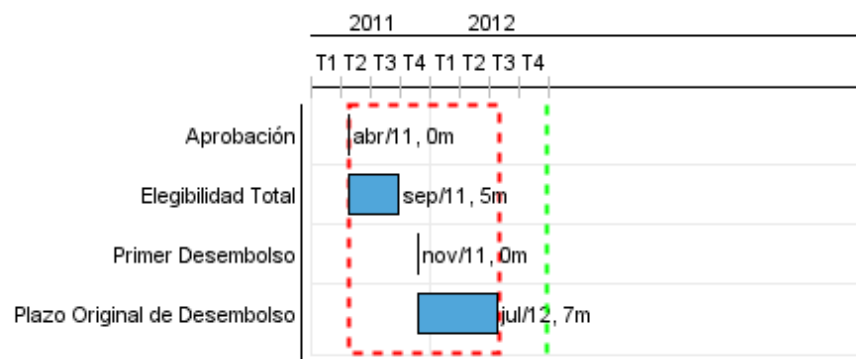

Progreso Acumulado al 2012

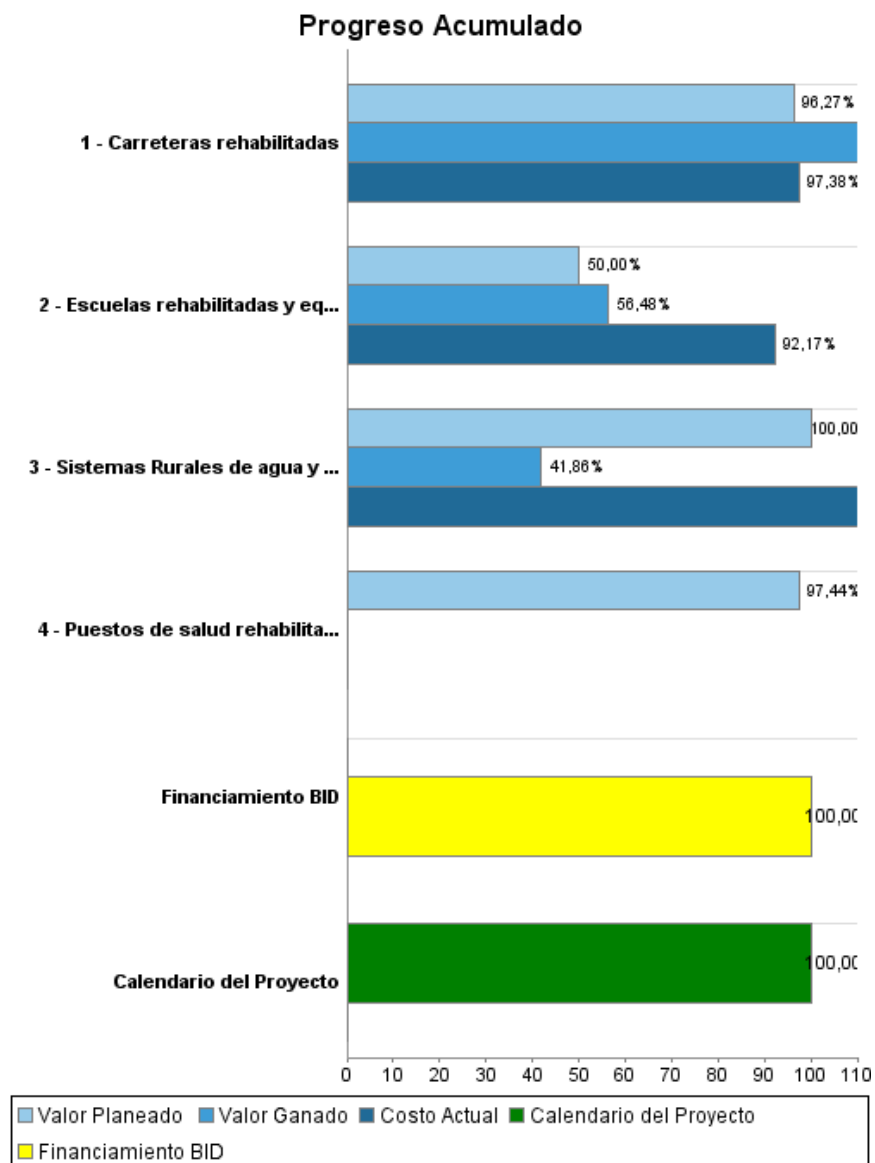

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PN-L1071 - Programa de Emergencia para Respuesta Inmediata por las Inundaciones en Panamá
2012 1º periodo con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2012

Resultados

Resultado: Carreteras rehabilitadas y puestas en operación.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	Fin de Proyecto
Kms de carreteras rehabilitadas	km		2011	P A	60.00	30.00 93.00	93.00

Resultado: Población con servicios de agua y saneamiento restablecido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	Fin de Proyecto
Hogares beneficiados con sistemas de agua y saneamiento operativos.	Hogares		2011	P A			3,600.00

Resultado: Población de escolares beneficiada que puede regresar a las escuelas afectadas por la emergencia

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	Fin de Proyecto
Número de escolares beneficiados	Escolar		2011	P A			10,160.00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PN-L1071 - Programa de Emergencia para Respuesta Inmediata por las Inundaciones en Panamá
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2012

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Infraestructura vial									
Carreteras rehabilitadas	Kilómetros		33,00		60,00	5.687.000,00	5.098.969,00		12.140.000,00
Agua potable y saneamiento									
Sistemas Rurales de agua y saneamiento rehabilitados.	Acueducto/ Sistema	43,00	18,00		18,00	2.100.000,00	3.065.800,00		2.100.000,00
Salud									
Puestos de salud rehabilitados.	Puesto de Salud	18,00			18,00	3.118.000,00			3.200.000,00
Educación									
Escuelas rehabilitadas y equipadas	Escuela				54,00				2.400.000,00
Gastos Administrativos									
Coordinación y supervisión, así como la auditoría concurrente y financiera	N/A					760.000,00	159.715,00		760.000,00
TOTAL						11.665.000,00	8.324.484,00		20.600.000,00
