
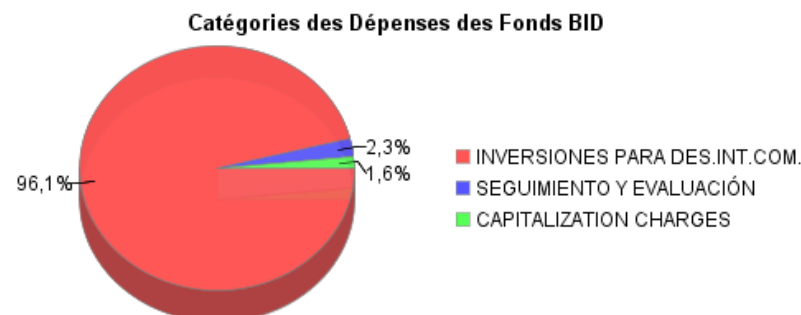
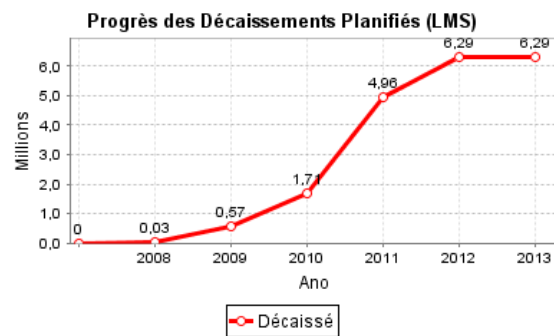



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	1839/SF-BO	Montant Courant Approuvé:	10.000.000,00	Initial BID:	10.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	6.286.216,17	Courant BID:	10.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	62,86	Pari Passu:	95,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-T1045, RS-T1341, BO-T1114	Solde:	3.713.783,83	Cofinancement/Pays:	558.000,00
Sous-Type de l'Opération:	INO - Innovation Operation			Estimation Initiale:	10.558.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 13-mar-2013 Validé par le Représentant: 13-mar-2013

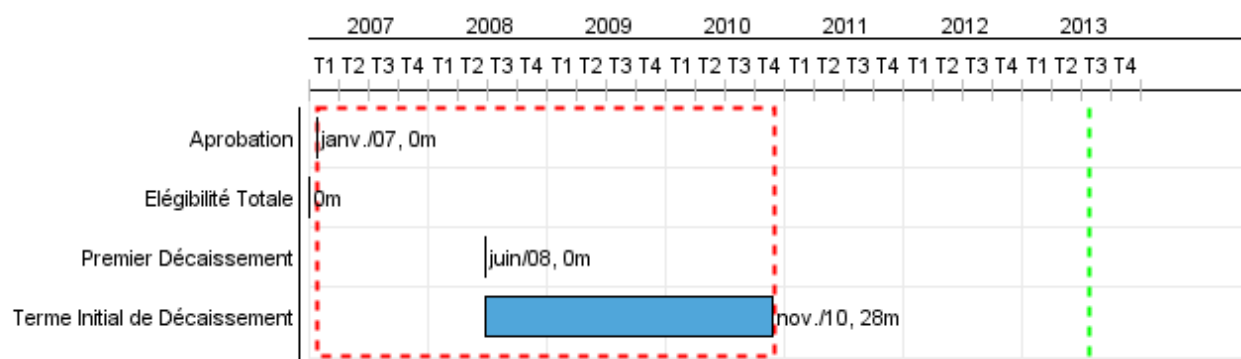

Progrès Cumulé à 2012

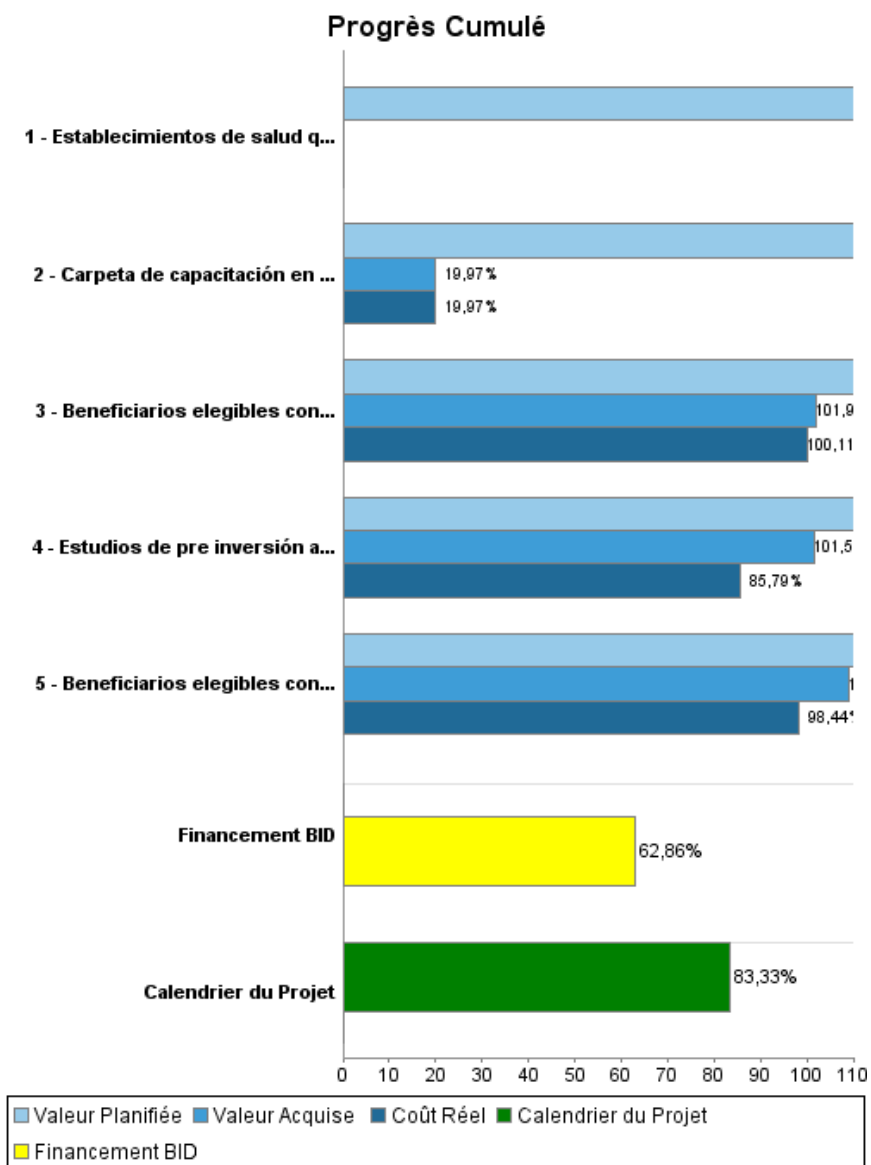

Résultats

Résultat:	Oferta de servicios integrales de salud materno-infantil con calidad y pertinencia cultural aumentada en los municipios priorizados
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	Fin du Projet
Partos atendidos por personal calificado en los municipios priorizados	Personas	1.274,00	2011	P	1.274,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
				A	1.404,00	1.277,00		
Partos atendidos por personal calificado sobre el total de los partos proyectados en los municipios priorizados.	Porcentaje	64,00	2011	P	64,00	66,00	69,00	69,00
				A	66,40	63,00		

Résultat:	Habitabilidad y higiene doméstica de hogares pobres mejorada en los municipios priorizados
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	Fin du Projet
Hogares indígenas con casas nuevas	Hogares		2010	P	2.119,00			2.119,00
				A	2.109,00			

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante 2.1: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Salud)									
Establecimientos de salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes	Establecimientos	4,00			15,00	1.582.891,77			5.964.855,00
Carpeta de capacitación en Salud Familiar Comunitaria Intercultural elaborada	Carpeta				1,00	100.000,00	39.942,00		200.000,00
Administración (fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud y Deportes + costo administrativo del Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social)	N/A					169.699,00	102.647,00		356.304,04
Estudios de pre inversión a diseño final de establecimientos de salud, incluyendo casas maternas, finalizados	Estudios	60,00	61,00		60,00	170.232,12	146.227,00		170.450,00
Fortalecimiento del FPS	N/A					65.868,00	62.600,00		160.496,00
Costos Administrativos y Convenio subsidiario con FPS por producto	N/A					96.698,00	87.890,00		307.766,40
Composante 2.2: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Vivienda)									
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de ayudante recibidas según manual operativo	Personas				4.238,00				1.718.511,14
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de albañil recibidas según manual operativo	Personas				2.119,00				1.234.631,61
Administración (fortalecimiento institucional del Viceministerio de Vivienda y Urbanización)	N/A								7.762,00
Auditoría (de procesos) del componente 2.2	N/A					20.000,00	20.000,00		20.000,00
Composante 3: Seguimiento, Monitoreo y Auditoría									
Administración (equipo de coordinación y seguimiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo)	N/A					35.342,32	18.003,00		81.429,00
Evaluación final	N/A								25.000,00
Auditoría (financiera+operativa)	N/A					10.000,00	10.770,00		35.795,00
Convenio con FPS (costos administrativo) por producto	N/A					11.667,00			10.000,00
Costos financieros									
Costos financieros	N/A								35.000,00
Intereses									
Intereses	N/A								130.000,00

RAPPORT DE SUIVI

BO-L1012 - Social Protection and Community Integral Development
2012 2º período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 12/03/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
FIV									
FIV	N/A								100.000,00
TOTAL						2.262.398,21	488.079,00		10.558.000,19
