
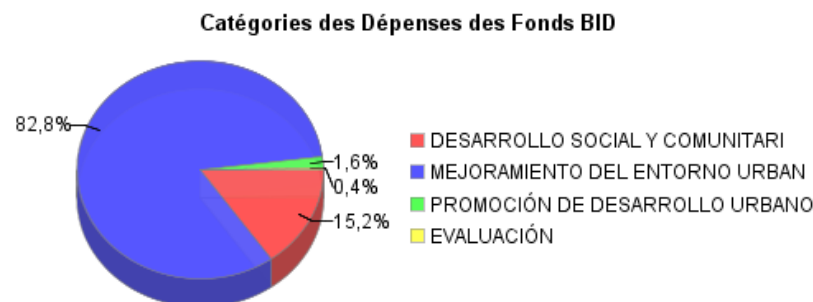
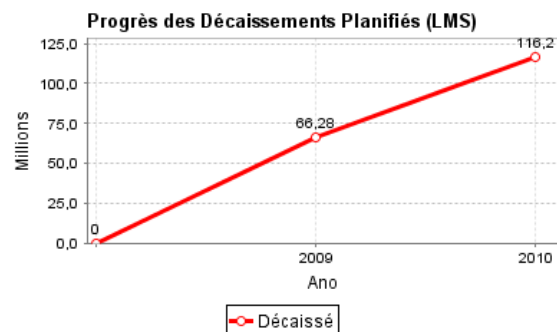



## Rapport Résumé

| Données Générales         |  | Fonds Disponibles (US\$)    |                | Coût Total et Source de Financement |                |
|---------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Agence d' Exécution (EA): | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                            |                             |                |                                     |                |
| Secteur:                  | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT |                             |                |                                     |                |
| Numéro(s) de Prêt(s):     | 1928/OC-ME   | Montant Courant Approuvé:   | 150.000.000,00 | Initial BID:                        | 150.000.000,00 |
| Étape:                    | Approved   | Montant Décaissé à ce Jour: | 150.000.000,00 | Courant BID:                        | 150.000.000,00 |
| Type d' Opération:        | INV - Investissement                                       | % Décaissé:                 | 100,00         | Pari Passu:                         | 49,75          |
| Opération(s) Connexe(s):  |  | Solde:                      |                | Cofinancement/Pays:                 | 150.000.000,00 |
| Sous-Type de l'Opération: | PFM - Multi-Phase Lending Project                          |                             |                | Estimation Initiale:                | 300.000.000,00 |
|                           |  |                             |                | Période d'Amortissement (mois):     | 258            |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet    | Reformulation                                       | Validation   |
|---|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B | ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: Apr 28, 2011<br>Validé par le Représentant: Apr 28, 2011 |

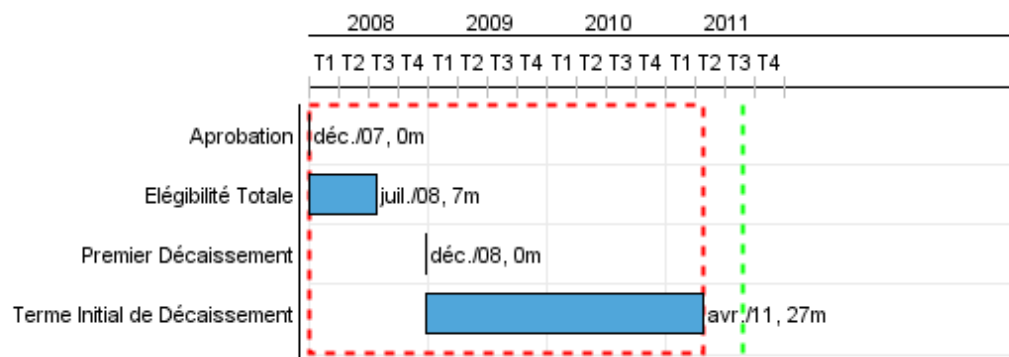

## Progrès Cumulé à 2010

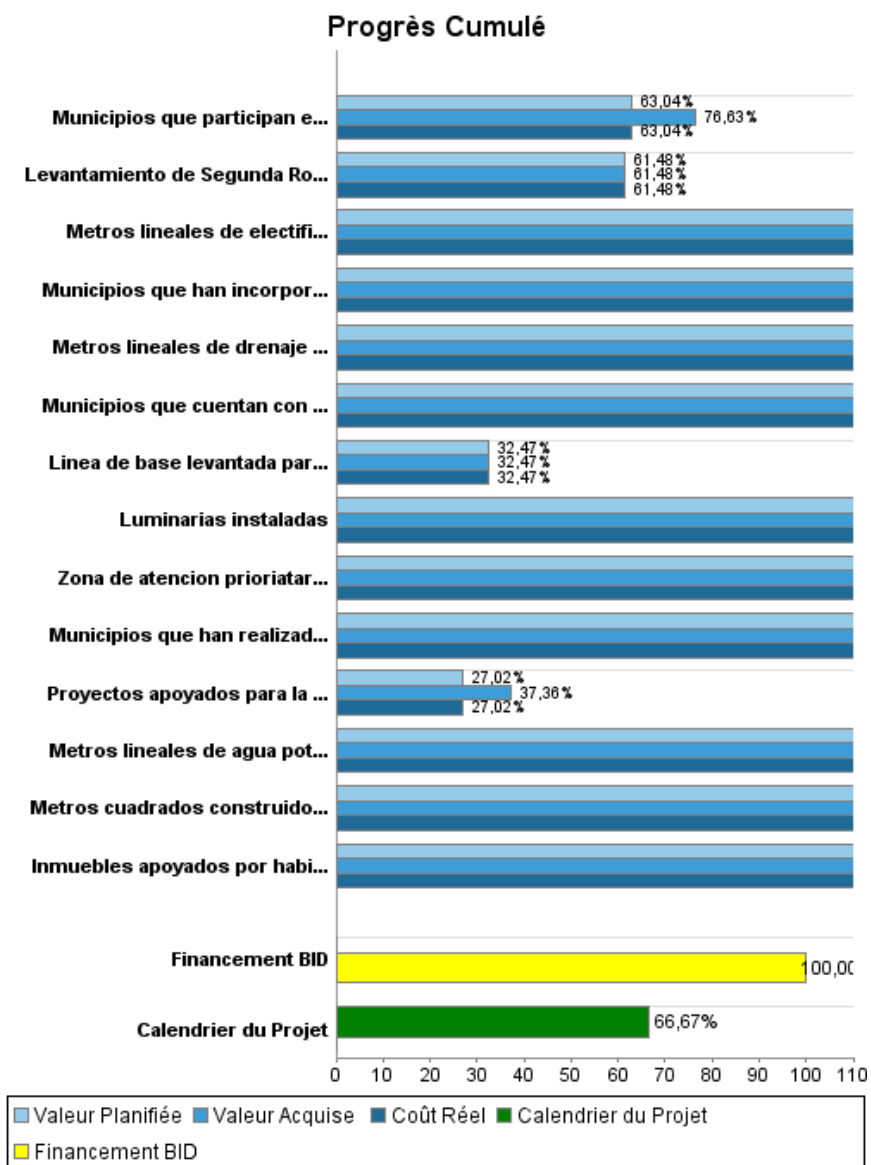

## Résultats

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Résultat:</b>    | Cobertura de los servicios básicos de las zonas urbano marginadas aumentado y vulnerabilidad de residentes en áreas urbano-marginadas reducida  |
| <b>Suposições:</b>  | Los supuestos para la evaluación de impacto se basaban en un nivel de inversiones en los polígonos de tratamiento que no se dio en el 2009. Por tanto, para no echar a perder todo el esfuerzo de evaluación se determinó hacer una medición de seguimiento un año después, en el 2012, para así permitir una acumulación de inversiones como la planeada originalmente. Cabe aclarar que el nivel de inversiones no depende del aporte del programa (sus desembolsos) sino en la asignación presupuestaria de México |
| <b>Observações:</b> | A nivel de resultados, no hay mediciones debido a que la línea de base de la evaluación de impacto--experimental--fue relevada en el 2009, y solo en el 2012 se realizó el segundo levantamiento. Por tanto es probable que el proyecto se termine de desembolsar y que haya que esperar un tiempo para verificar el impacto de los 3 indicadores que aquí se listan.   |

| Indicateur   | Unité de Mesure   | Ligne de Base | Année Ligne de Base |        | 2009 | 2010 | 2011 | Fin du Projet |
|--|---|---------------|---------------------|--------|------|------|------|---------------|
| Valor inmobiliario por m2 de los predios beneficiados en los polígonos, con relación al grupo de control definido para ese polígono. | valor inmobiliario del m2   | 917,00        | 2009                | P<br>A |      |      |      | 0,00          |
| Indice de capital social en grupo tratamiento  | indice de capital social  | 0,49          | 2009                | P<br>A |      |      |      | 0,00          |
| Indice de disponibilidad equipamiento urbano básico (pavimento, alumbrado, banquetas y electricidad) en los polígonos de tratamiento | indice de disponibilidad calculado a partir de la encuesta multitematica de hogares | 0,35          | 2009                | P<br>A |      |      |      | 0,00          |
| Indice de disponibilidad de servicios basicos (agua entubada, drenaje y electricidad) en grupo de tratamiento                        | indice de disponibilidad  | 0,73          | 2009                | P<br>A |      |      |      | 0,00          |
| Indice de capital social en grupo de control   | indice de capital social  | 0,50          | 2009                | P<br>A |      |      |      | 0,00          |
| Indice de disponibilidad de servicios basicos (agua entubada, drenaje y electricidad) en grupo de control                            | Indice de disponibilidad de servicios basicos                                       | 0,79          | 2009                | P<br>A |      |      |      | 0,00          |
| Indice de disponibilidad de equipamiento urbano básico (pavimento, alumbrado, banquetas y electricidad) en los polígonos de control  | Indice de disponibilidad de equipamiento urbano básico                              | 0,42          | 2009                | P<br>A |      |      |      | 0,00          |

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

| Description  | Unité de Mesure     | Physique     |              |                 |               | Financier |               |                |               |
|--|---------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
|  |                     | Planifié     | Réel         | Unités Cumulées | Unités FDP    | Planifié  | Réel          | Coûts Cumulées | Coûts FDP     |
| <b>Composante 1: Desarrollo Social y Comunitario</b>   |                     |              |              |                 |               |           |               |                |               |
| Inmuebles apoyados por habitat para la prestación de servicios sociales  | inmuebles           | 306,00       | 306,00       |                 | 951,00        |           | 3.933.000,00  |                | 19.000.000,00 |
| Zona de atencion prioritaria (ZAPU) atendidos por el Programa Habitat que cuentan al menos con una contraloría social  | zonas de atencion   | 596,00       | 596,00       |                 | 690,00        |           | 491.000,00    |                | 1.200.000,00  |
| Municipios que cuentan con un diagnostico comunitario  | Gobiernos           | 37,00        | 37,00        |                 | 102,00        |           | 492.000,00    |                | 1.200.000,00  |
| <b>Composante 2: Mejoramiento del Entorno Urbano</b>   |                     |              |              |                 |               |           |               |                |               |
| Metros cuadrados construidos o rehabilitados de pavimentación (concreto hidráulico, asfalto, mixto, reconstrucción)  | M2 de pavimentacion | 4.778.000,00 | 4.778.000,00 |                 | 12.000.000,00 |           | 21.513.000,00 |                | 30.000.000,00 |
| Metros lineales de agua potable construida o rehabilitada  | metros lineales     | 315.650,00   | 315.650,00   |                 | 540.000,00    |           | 16.134.000,00 |                | 20.000.000,00 |
| Metros lineales de drenaje y alcantarillado, construidos o rehabilitados   | metros lineales     | 440.431,00   | 440.431,00   |                 | 540.000,00    |           | 10.756.000,00 |                | 20.000.000,00 |
| Metros lineales de electrificación construida o rehabilitada   | metros lineales     | 29.969,00    | 29.969,00    |                 | 80.000,00     |           | 16.134.000,00 |                | 15.000.000,00 |
| Luminarias instaladas  | luminarias          | 12.848,00    | 12.848,00    |                 | 48.000,00     |           | 16.134.000,00 |                | 10.000.000,00 |
| Municipios que han incorporado o realizado acciones de mejoramiento del entorno  | Gobiernos           | 20,00        | 20,00        |                 | 200,00        |           | 16.134.000,00 |                | 10.000.000,00 |
| Municipios que han realizado acciones para la gestion integral de riesgo de riesgo de desastres  | Gobiernos           | 65,00        | 65,00        |                 | 240,00        |           | 10.756.000,00 |                | 10.000.000,00 |
| <b>Composante 3: Promocion del Desarrollo Urbano</b>   |                     |              |              |                 |               |           |               |                |               |
| Proyectos apoyados para la instalacion o fortalecimiento de instancias locales de planificacion  | instalaciones       | 25,00        | 25,00        |                 | 60,00         |           |               |                | 5.000.000,00  |
| Municipios que participan en Habitat con planes o programas de desarrollo  | Gobiernos           | 40,00        | 40,00        |                 | 150,00        |           |               |                | 5.000.000,00  |
| <b>Composante 4: Apoyo a la Gestión</b>  |                     |              |              |                 |               |           |               |                |               |
| Municipios que participan en Hábitat que han elaborado perfiles ejecutivos para todas las ZAPU intervenidas, con estimación de las brechas en términos de infraestructura, mobiliario urbano, necesidades de mejora del entorno y servicios sociales | Gobiernos           | 1.136,00     | 1.136,00     |                 | 4.086,00      |           |               |                | 700.000,00    |

## RAPPORT DE SUIVI

ME-L1019 - Multiphase Program to Address Urban Poverty. Phase II  
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 28/04/2011

| Description   | Unité de Mesure | Physique |      |                 |            | Financier |                       |                |                       |
|---|-----------------|----------|------|-----------------|------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|   |                 | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié  | Réel                  | Coûts Cumulées | Coûts FDP             |
| Municipios que participan en Hábitat que solicitaron apoyo para proyectos de asistencia técnica | Gobiernos       | 6,00     | 3,00 |                 | 120,00     |           |                       |                | 700.000,00            |
| <b>Componente 5: Evaluacion del Programa</b>  |                 |          |      |                 |            |           |                       |                |                       |
| Linea de base levantada para los indicadores de Marco Logico                                    | linea de base   |          |      |                 | 1,00       |           |                       |                | 1.100.000,00          |
| Levantamiento de Segunda Ronda del Programa realizado   | levantamiento   |          |      |                 | 1,00       |           |                       |                | 1.100.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |                 |          |      |                 |            |           | <b>112.477.000,00</b> |                | <b>150.000.000,00</b> |
