
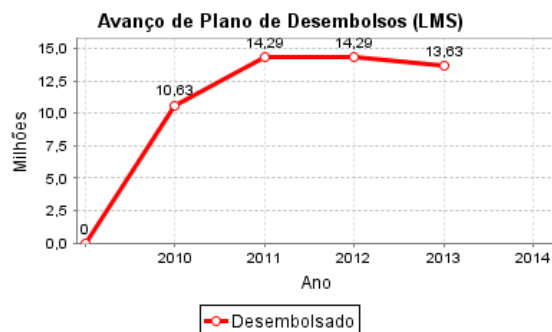



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: BANCO DEL ESTADO		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE		
Número da Operação: 2113/OC-EC;2114/BL-EC	Atual: 13.627.650,48	Original BID: 50.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 13.627.650,48	Corrente BID: 13.627.650,48
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 68,00
Operação Relacionada: EC-X1004	Saldo:	Cofinanciamento/País: 23.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 73.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 306

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013

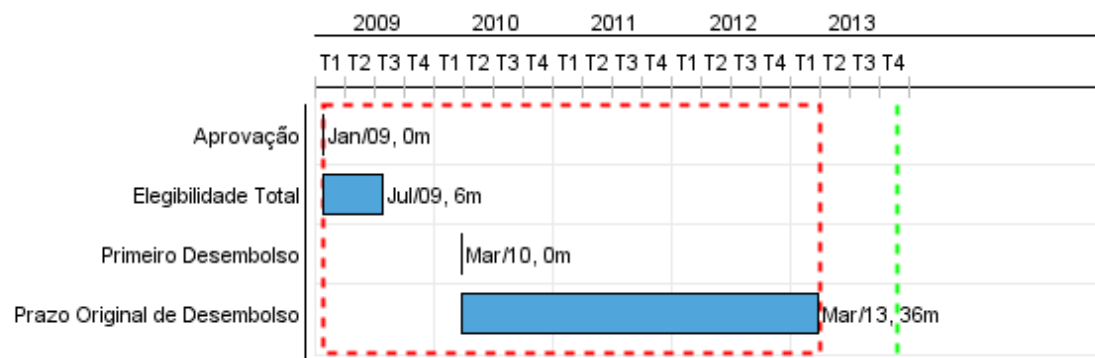

## Progresso Acumulado até 2013

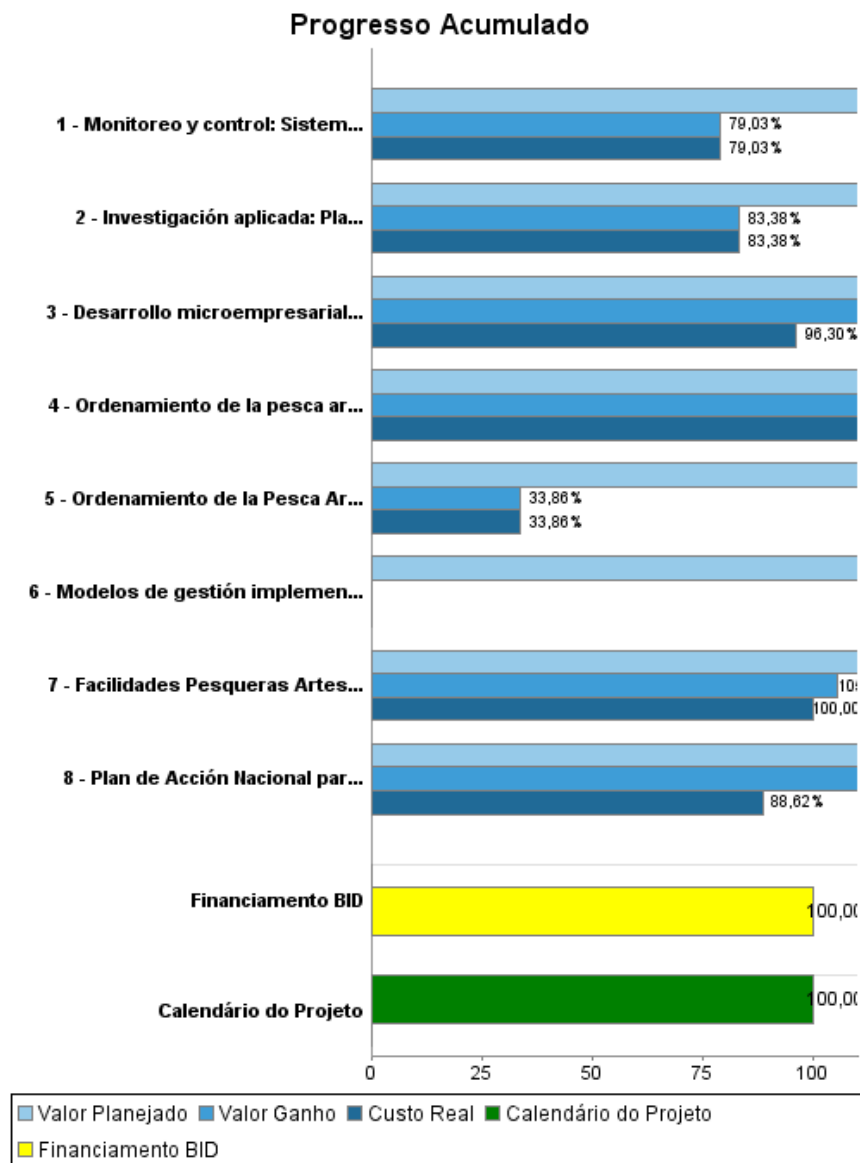

## Resultados

**Resultado:** Competitividad de la pesca artesanal de la costa continental del Ecuador (provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro), mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Volumen de capturas de la pesca artesanal del país que es desembarcada, procesada/eviscerada y puesta en camiones de transporte hacia los centros de consumo en condiciones sanitarias compatibles con normas internacionales sanitarias.	Ton		2009	P A	10.000,00	
Pescadores artesanales que adquieren insumos y servicios en las facilidades pesqueras con condiciones de seguridad "acceptables".	Pescadores		2009	P A	8.000,00	

**Resultado:** Sostenibilidad de la pesca artesanal de la costa continental del Ecuador (provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro), mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Facilidades construidas por el Proyecto que cubren sus costos de operación y mantenimiento con base en las tarifas pagadas por pescadores, comerciantes y proveedores de servicios que los utilizan.	Facilidades Pesqueras		2009	P A	15,00	15,00
Área de la costa manejado bajo principios de sostenibilidad a través de esquemas de co-manejo o manejo especial para la protección del recurso pesquero.	Ha	75.000,00	2009	P A	1.000.000,00	1.000.000,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 1. Mejoramiento de los Facilidades Pesqueras Artesanales</b>									
Facilidades Pesqueras Artesanales Construidas	Facilidades				4,00				20.429.295,92
Modelos de gestión implementado en las Facilidades Pesqueras Artesanales	Modelos	15,00			15,00	137.908,00			137.908,00
<b>Componente 2. Sistemas de Manejo de la Pesca Artesanal</b>									
Ordenamiento de la Pesca Artesanal: Esquema de zonificación de la actividad pesquera para toda la costa ecuatoriana cumplida.	Esquema de Zonificación	1,00			1,00	682.981,00			1.032.981,00
Ordenamiento de la pesca artesanal: Planes Piloto de Co-manejo desarrollados e implementados	Planes	7,00			7,00				164.196,00
Monitoreo y control: Sistema de monitoreo de pesquerías artesanales diseñado e implementado	Sistema	1,00			1,00	179.461,00			856.887,00
Investigación aplicada: Plan de investigación en Pesca Artesanal Costera aprobado por SRP	Plan	1,00			1,00	44.052,00			262.867,00
Desarrollo microempresarial: Microempresarios reciben asistencia técnica para la diversificación de las actividades productivas a través del proyecto	Microempresarios				80,00	59.486,00			1.610.302,00
Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones: Caletas que cuentan con monitoreo sistemático de la captura de tiburones	Caletas	1,00			12,00	76.860,00			681.875,00
<b>Administración del Programa</b>									
Administración del Programa	N/A					263.357,00			2.135.000,00
<b>Seguimiento, Evaluación y Auditorías</b>									
Seguimiento, Evaluación y Auditorías	N/A					117.000,00			145.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.561.105,00</b>			<b>27.456.311,92</b>
