
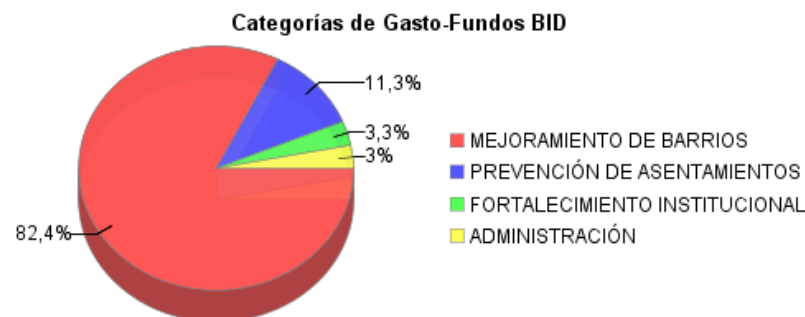
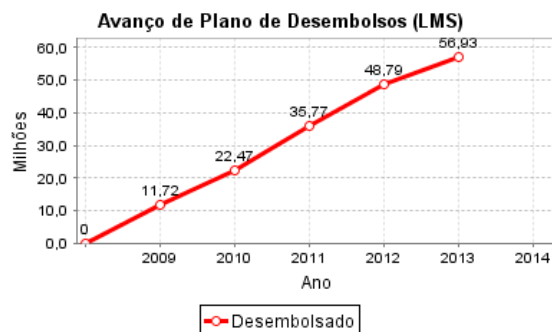



## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE		
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING		
Número da Operação:	2052/OC-UR;2052/OC-UR-1	Atual: 70.000.000,00	Original BID: 70.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado: 53.965.987,71	Corrente BID: 70.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado: 77,09	Pari-passu: 70,00
Operação Relacionada:	UR-T1032, UR-X1003, UR-L1084	Saldo: 16.034.012,29	Cofinanciamento/País: 30.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 100.000.000,00
			Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2013

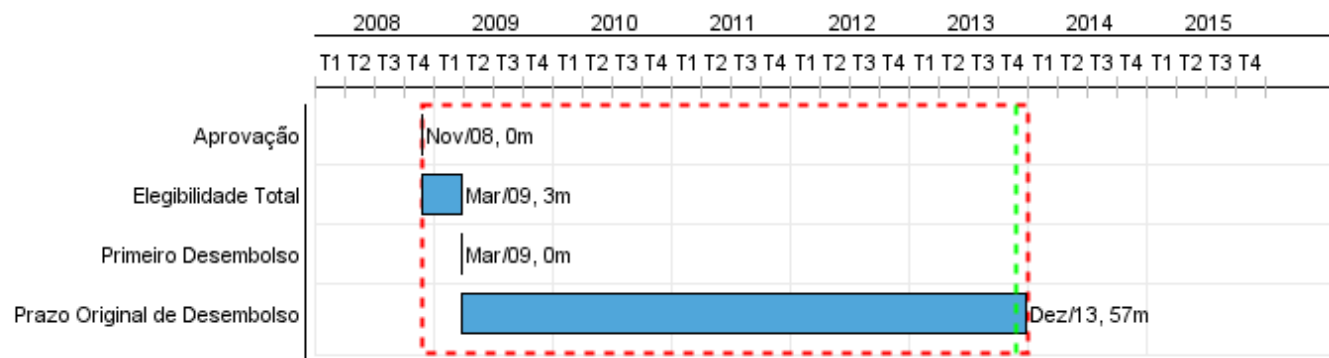

## Progresso Acumulado até 2013

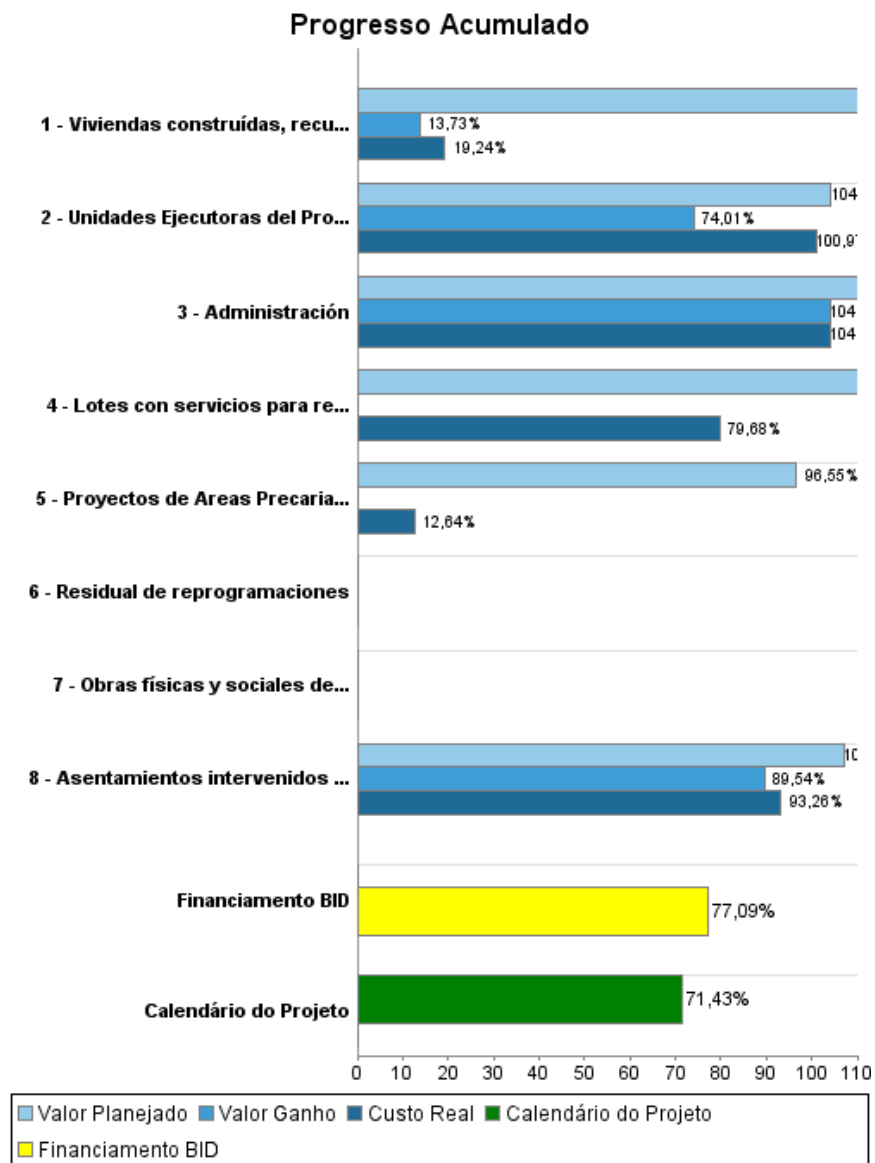

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Familias de los barrios intervenidos y familias re-asentadas con calidad de vida mejorada.
<b>Suposições:</b>	No existen variaciones importantes del tipo de cambio y/o aumentos en el costo de la construcción que impliquen disminución en la cobertura del programa
<b>Observações:</b>	A la finalización del programa, las familias de los asentamientos intervenidos tienen agua, electricidad, alcantarillado y drenajes pluviales, mejor vialidad en sus barrios, y mayor acceso a servicios sociales y espacios públicos.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Las familias de los asentamientos intervenidos cuentan con acceso a servicios básicos, sevicios sociales, espacios públicos al final del Programa.	Familias		2006	P A	7.348,00

<b>Resultado:</b>	Formación de nuevos asentamientos detenida
<b>Suposições:</b>	No existen crisis económicas de magnitud que determinen que un importante número de población cae por debajo de la línea de pobreza
<b>Observações:</b>	En 2006 el INE identificó la existencia de 696 asentamientos en todo el país. Este número se ha reducido por lo siguiente: i) 22 complejos habitacionales precarios que fueron contabilizados erróneamente como asentamientos irregulares; y ii) 106 asentamientos de dos categorías; a) 62 regularizados con financiamiento del préstamo 1186/OC-UR; y b) 44 que serán regularizados con financiamiento del programa UR-L1009. Por tanto, la línea de base resultante es de 568 asentamientos (696-128).

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Canitidad de asentamientos	Asentamientos	568,00	2006	P A	568,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Mejoramiento de Barrios</b>									
Obras físicas y sociales de regularización en áreas precarias.	Areas				2,00				8.552.000,00
Asentamientos intervenidos con obras de infraestructura (acceso a agua, electricidad, alcantarillado, vialidad, drenajes pluviales, mayor acceso a servicios sociales y espacios públicos)	Asentamientos	2,00			28,00	7.158.315,00	3.709.217,00		68.700.000,00
Proyectos de Areas Precarias formulados	Proyectos	2,00			2,00				1.448.000,00
<b>Prevención de asentamientos irregulares</b>									
Viviendas construídas, recuperadas y mejoradas en el ára del mercado agrícola y entorno del barrio GOES	Vivienda	200,00			500,00	5.787.000,00	249.645,00		8.900.000,00
Lotes con servicios para reasentamiento de familias	Lotes	103,00			250,00	6.657.000,00	3.320.650,00		5.500.000,00
<b>Fortalecimiento Institucional</b>									
Unidades Ejecutoras del Programa fortalecidas (DINAVI, UCN y Unidades Subnacionaes de las Intendencias)	Unidades	5,00			5,00	965.000,00	482.415,00		2.800.000,00
<b>Administración</b>									
Administración	n/a					1.423.000,00	708.708,00		4.100.000,00
Residual de reprogramaciones	0								
<b>TOTAL</b>						<b>21.990.315,00</b>	<b>8.470.635,00</b>		<b>100.000.000,00</b>
