
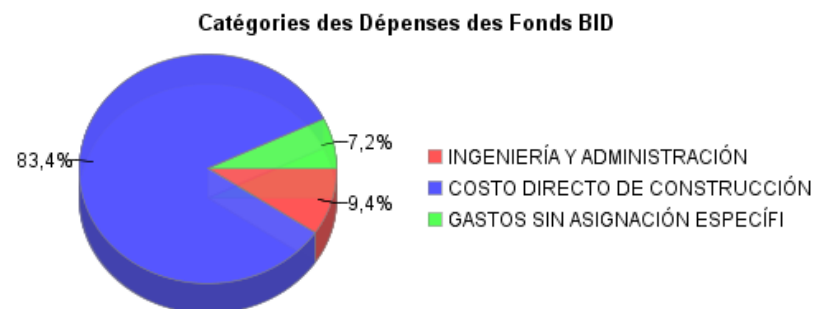
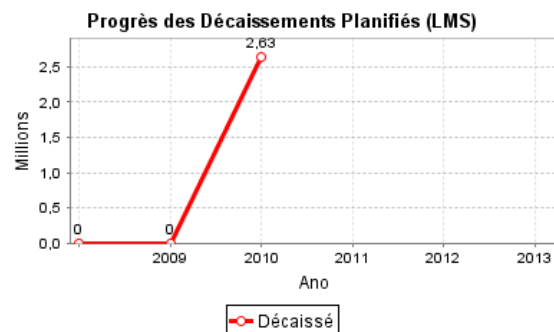



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.				
Secteur:	ENERGY-POWER LINES				
Numéro(s) de Prêt(s):	2024/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	12.500.000,00	Initial BID:	12.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	2.632.551,58	Courant BID:	12.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	21,06	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	9.867.448,42	Cofinancement/Pays:	12.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	25.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Apr 14, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 15, 2011

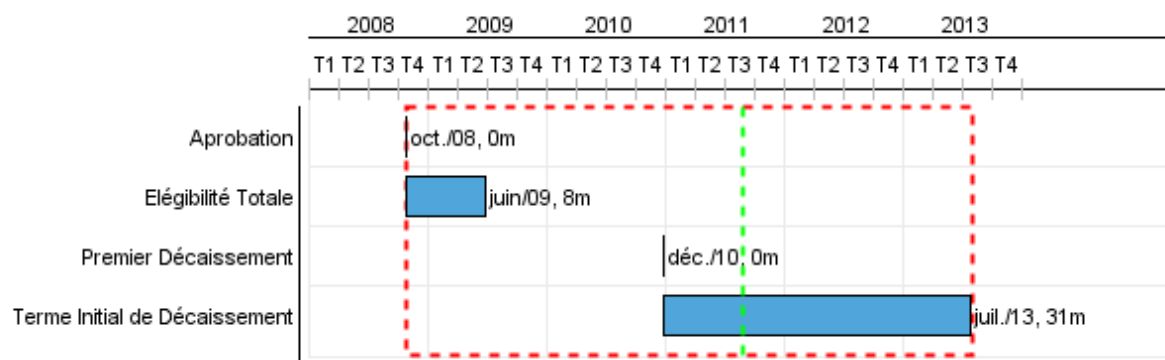

Progrès Cumulé à 2010

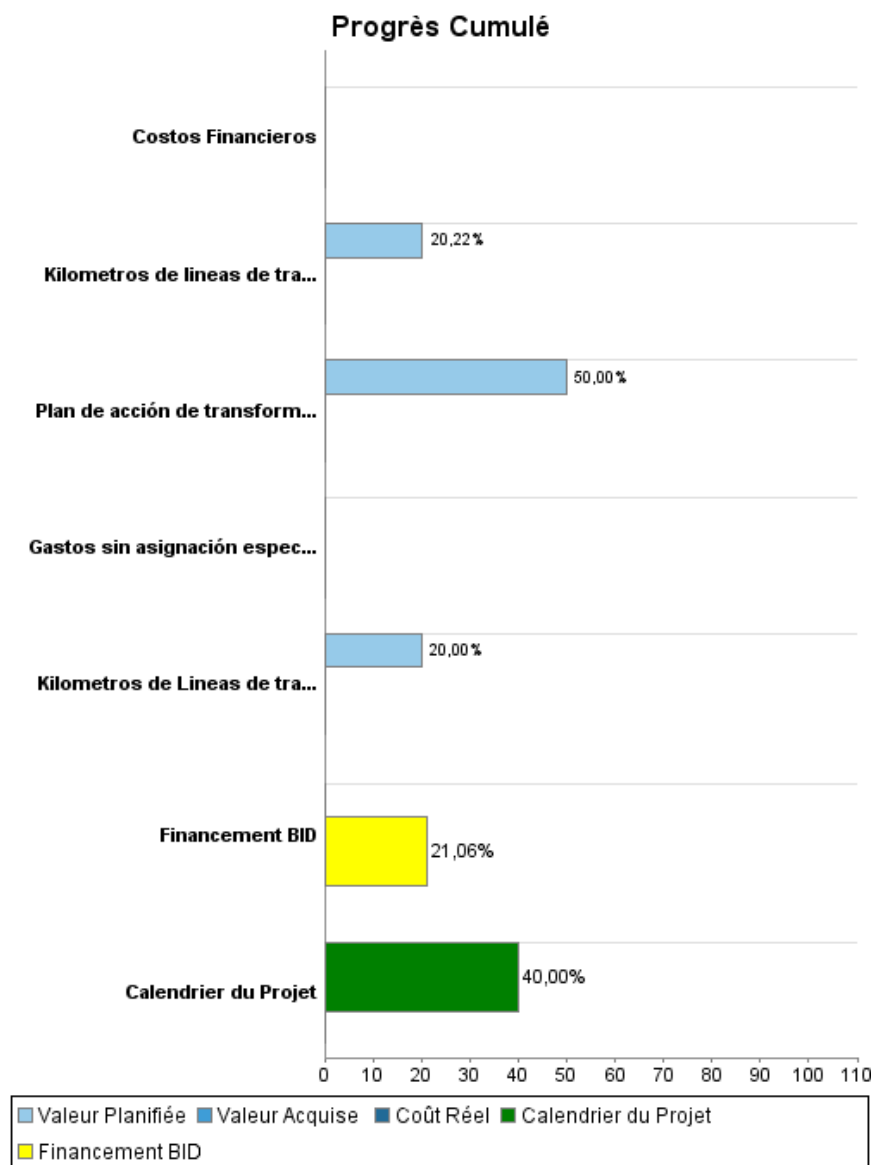

Résultats

Résultat:	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
Suposições:	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional incrementada.	Gwh	8.412,90	2008	P A	8.881,90
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional incrementada.	MW	1.356,50	2008	P A	1.431,20

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II									
Kilometros de Lineas de transmisión construidas (Proyecto Colón Fase II)	Kilometers				48,00	2.510.000,00			12.550.000,00
Componente 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers				121,00	1.826.000,00			9.030.000,00
Componente 2 - Actividades de transformación corporativa									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan				1,00	50.000,00			100.000,00
Gastos sin asignación específica	Global								1.810.000,00
Costos Financieros	Global								1.510.000,00
TOTAL						4.386.000,00			25.000.000,00
