
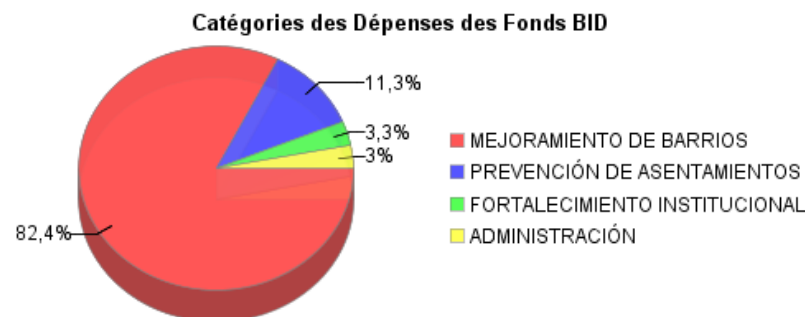
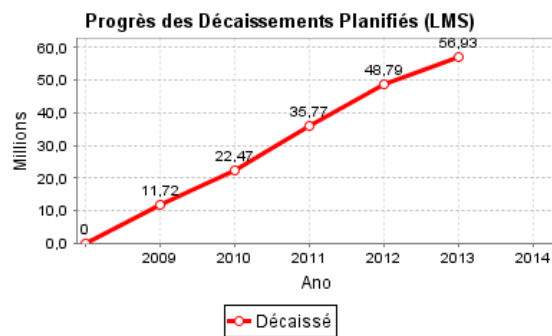



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Numéro(s) de Prêt(s):	2052/OC-UR;2052/OC-UR-1	Montant Courant Approuvé:	70.000.000,00	Initial BID:	70.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	53.965.987,71	Courant BID:	70.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	77,09	Pari Passu:	70,00
Opération(s) Connexe(s):	UR-T1032, UR-X1003, UR-L1084	Solde:	16.034.012,29	Cofinancement/Pays:	30.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	100.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 26-sep-2013 Validé par le Représentant: 28-sep-2013

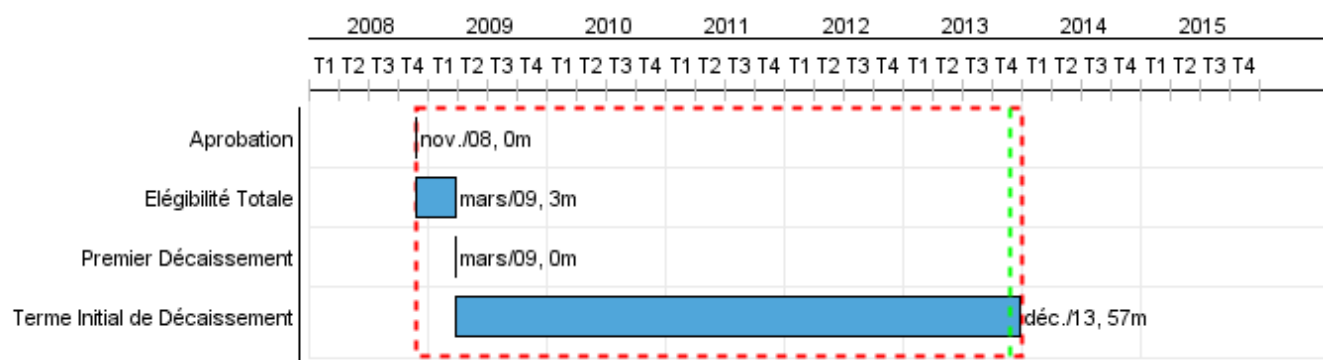

Progrès Cumulé à 2013

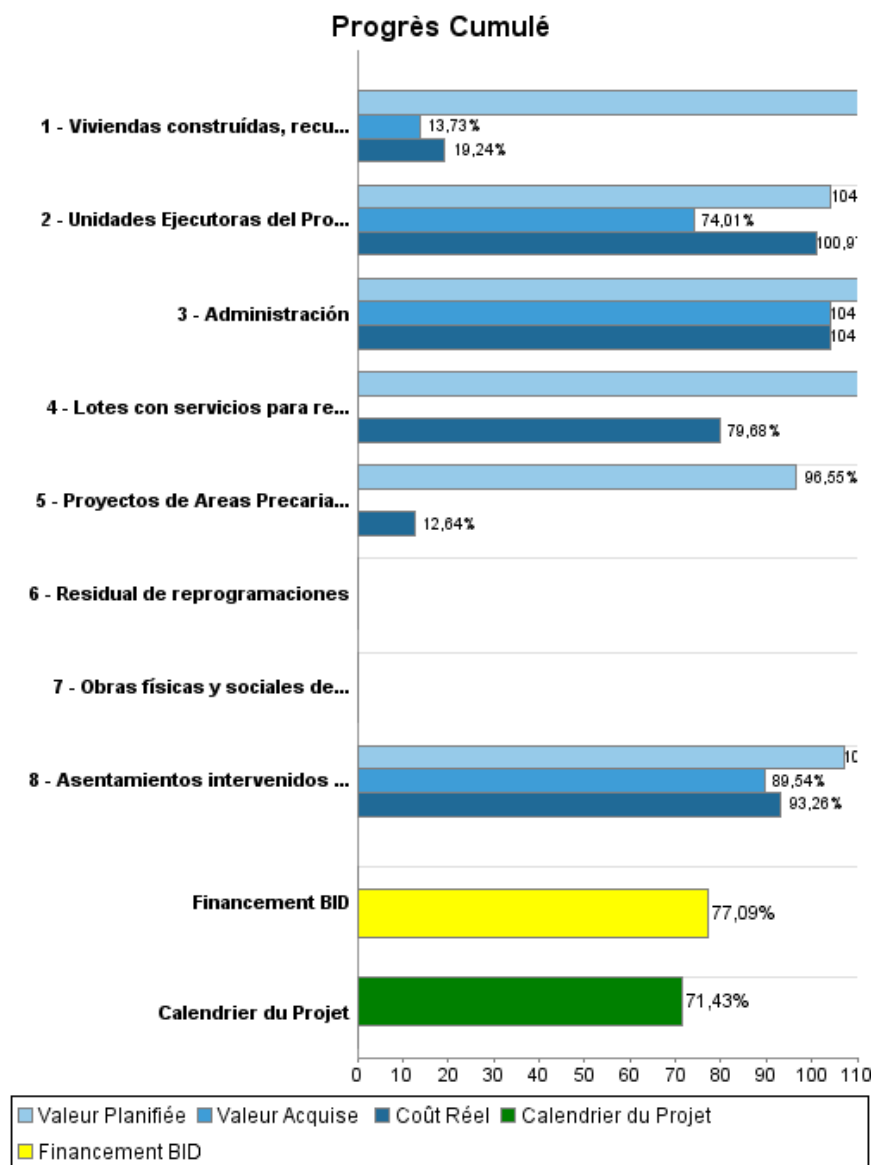

Résultats

Résultat:	Familias de los barrios intervenidos y familias re-asentadas con calidad de vida mejorada.
Suposições:	No existen variaciones importantes del tipo de cambio y/o aumentos en el costo de la construcción que impliquen disminución en la cobertura del programa
Observações:	A la finalización del programa, las familias de los asentamientos intervenidos tienen agua, electricidad, alcantarillado y drenajes pluviales, mejor vialidad en sus barrios, y mayor acceso a servicios sociales y espacios públicos.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Las familias de los asentamientos intervenidos cuentan con acceso a servicios básicos, servicios sociales, espacios públicos al final del Programa.	Familias		2006	P A	7.348,00

Résultat:	Formación de nuevos asentamientos detenida
Suposições:	No existen crisis económicas de magnitud que determinen que un importante número de población cae por debajo de la línea de pobreza
Observações:	En 2006 el INE identificó la existencia de 696 asentamientos en todo el país. Este número se ha reducido por lo siguiente: i) 22 complejos habitacionales precarios que fueron contabilizados erróneamente como asentamientos irregulares; y ii) 106 asentamientos de dos categorías: a) 62 regularizados con financiamiento del préstamo 1186/OC-UR; y b) 44 que serán regularizados con financiamiento del programa UR-L1009. Por tanto, la línea de base resultante es de 568 asentamientos (696-128).

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Canitidad de asentamientos	Asentamientos	568,00	2006	P A	568,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Mejoramiento de Barrios									
Obras físicas y sociales de regularización en áreas precarias.	Areas				2,00				8.552.000,00
Asentamientos intervenidos con obras de infraestructura (acceso a agua, electricidad, alcantarillado, vialidad, drenajes pluviales, mayor acceso a servicios sociales y espacios públicos)	Asentamientos	2,00			28,00	7.158.315,00	3.709.217,00		68.700.000,00
Proyectos de Areas Precarias formulados	Proyectos	2,00			2,00				1.448.000,00
Prevención de asentamientos irregulares									
Viviendas construídas, recuperadas y mejoradas en el ára del mercado agrícola y entorno del barrio GOES	Vivienda	200,00			500,00	5.787.000,00	249.645,00		8.900.000,00
Lotes con servicios para reasentamiento de familias	Lotes	103,00			250,00	6.657.000,00	3.320.650,00		5.500.000,00
Fortalecimiento Institucional									
Unidades Ejecutoras del Programa fortalecidas (DINAVI, UCN y Unidades Subnacionaes de las Intendencias)	Unidades	5,00			5,00	965.000,00	482.415,00		2.800.000,00
Administración									
Administración	n/a					1.423.000,00	708.708,00		4.100.000,00
Residual de reprogramaciones	0								
TOTAL						21.990.315,00	8.470.635,00		100.000.000,00
