
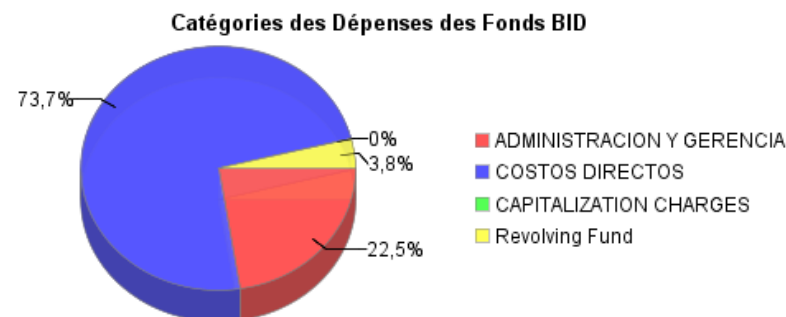
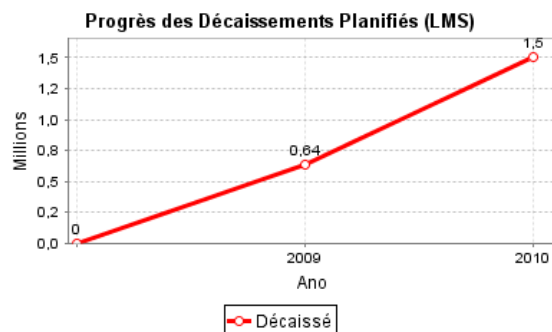



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SERVICIO NACIONAL SANEAMIENTO AMBIENTAL				
Secteur:	WATER AND SANITATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	1312/OC-PR-CPS;1312/OC-PR	Montant Courant Approuvé:	11.868.487,21	Initial BID:	24.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	11.868.487,21	Courant BID:	11.868.487,21
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	72,72
Opération(s) Connexe(s):		Solde:		Cofinancement/Pays:	5.100.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	29.100.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	222

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Apr 26, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 26, 2011

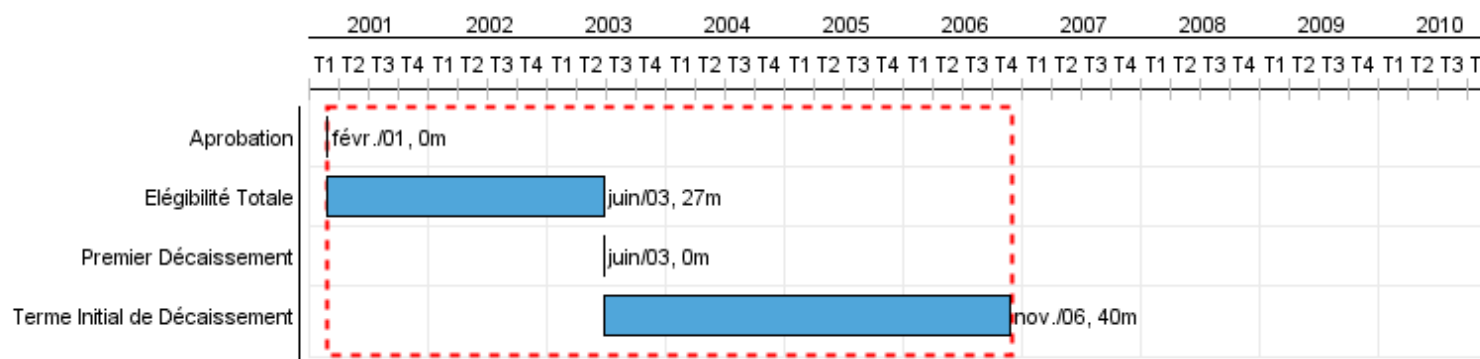

Progrès Cumulé à 2010

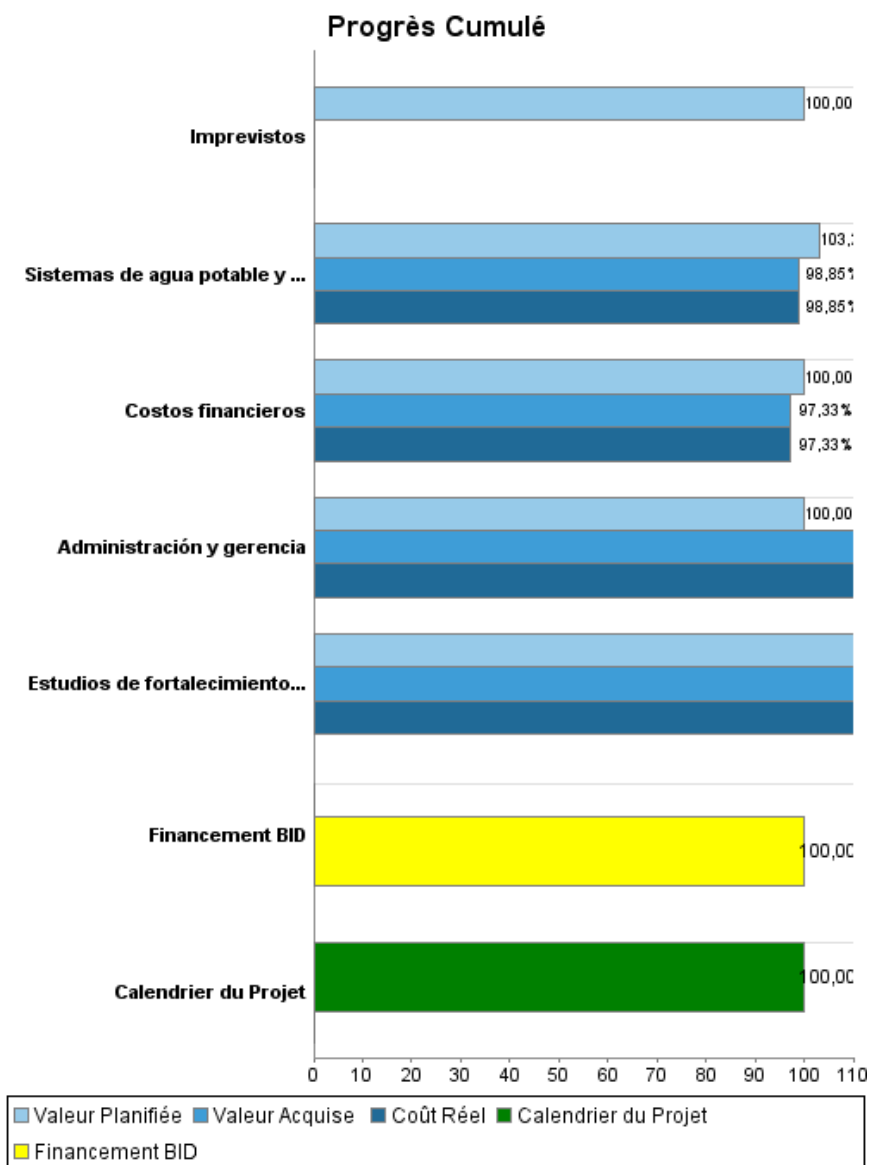

Résultats

Résultat:	Esquema institucional de provisión de servicio de agua potable y de saneamiento a pequeñas comunidades fortalecido.
Observações:	En Juntas de Saneamiento y/o Comisiones de Saneamiento, Asociaciones de Juntas y SENASA

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2008	2010	Fin du Projet
Morosidad en las cuotas de los préstamos a las comunidades o juntas de agua.	% de cuotas vencidas	18,00	2006	P		9,00		9,00
				A	14,00			
Juntas de agua para comunidades (100 rurales + 10 indígenas), suscriben convenios con SENASA, obligándose al cumplimiento del pago respectivo, así como a la operacion y mantenimiento.	juntas de agua		2006	P	110,00			0,00
				A	111,00			
Hogares atendidos con acceso a agua potable en comunidades rurales	Hogares		2006	P				0,00
				A			11.769,00	
Hogares atendidos con acceso a agua mejorada en comunidades indígenas	Hogares		2006	P				0,00
				A			447,00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1. Sistemas de Agua y Saneamiento									
Sistemas de agua potable y soluciones individuales de saneamiento en comunidades rurales construidos	sistemas		1,00		100,00		355.636,00		10.959.000,00
2. Sistemas en Comunidades Indígenas									
Sistemas de agua potable y soluciones individuales de saneamiento en comunidades indígenas construidos	sistemas				10,00				400.000,00
3. Apoyo Institucional									
Estudios de fortalecimiento concluidos y entregados: Nomenclatura: 0 (no existen estudios) 80 (presentando penúltimo informe de fortalecimiento) 100 (estudios concluidos y entregados)	%				100,00		90.271,00		600.000,00
Administración, costos financieros e imprevisto									
Administración y gerencia	NA					3.090.000,00	3.643.220,00		3.090.000,00
Imprevistos	NA					300.000,00			300.000,00
Costos financieros	NA					1.751.000,00	1.704.309,00		1.751.000,00
TOTAL						5.141.000,00	5.793.436,00		17.100.000,00
