
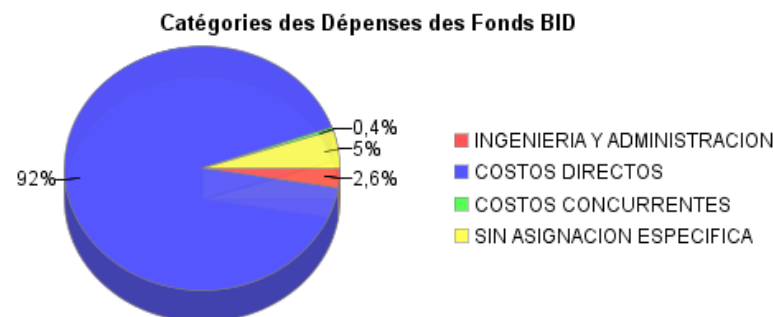
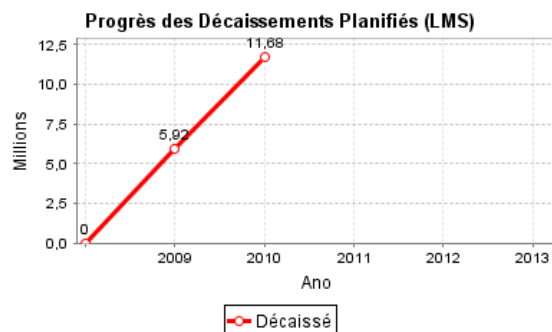



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO				
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2095/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	43.000.000,00	Initial BID:	43.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	14.891.616,92	Courant BID:	43.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	34,63	Pari Passu:	88,69
Opération(s) Connexe(s):	UR-X1006	Solde:	28.108.383,08	Cofinancement/Pays:	39.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	82.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 26, 2011 Validé par le Représentant: Apr 29, 2011

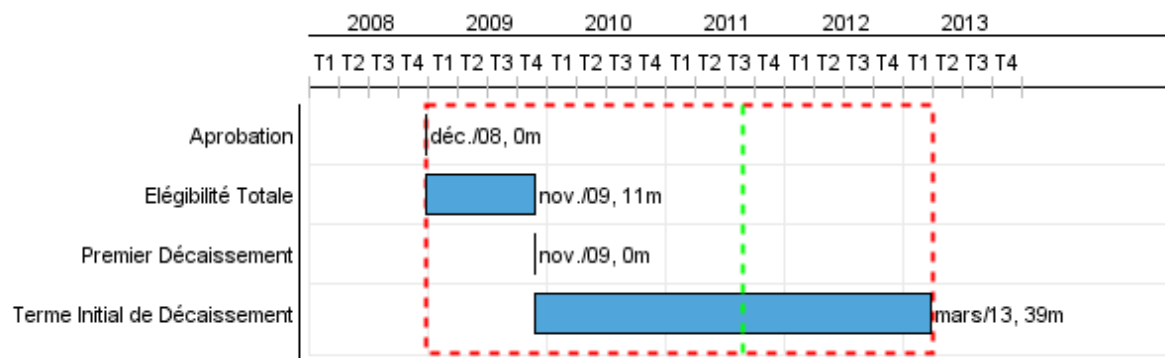

## Progrès Cumulé à 2010

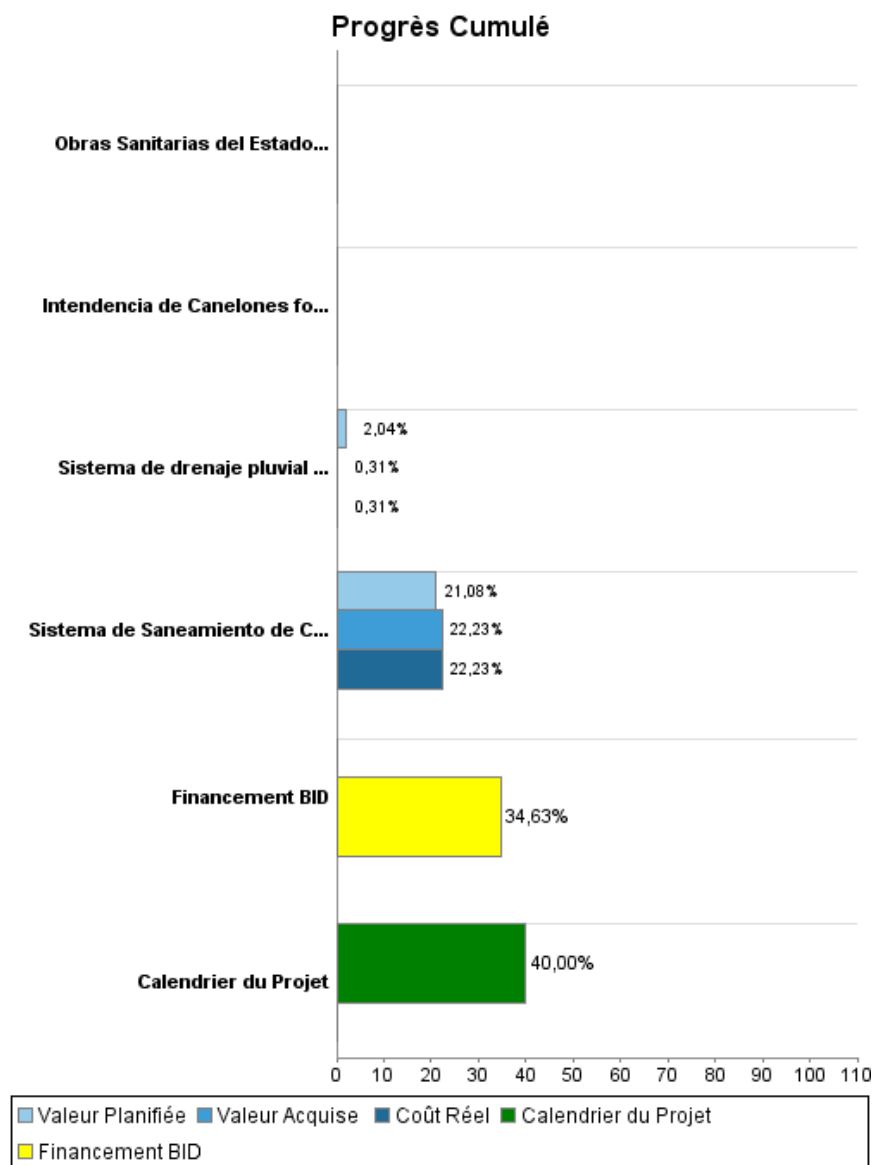

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Calidad del agua en el Arroyo Pando mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	Fin du Projet
Camiones barométricos que disponen sus líquidos residuales en la planta del Pinar ( promedio anual)	Camiones/día	88,00	2010	P A	88,00			0,00
Concentración de DBO5 en el Arroyo Pando	Relación de DBO5 aguas arriba vs aguas abajo de la cañada			P A				0,90
Contaminación microbiológica en el arroyo Pando	Relación de coliformes fecales ( UFC cada 100 ml) aguas arriba vs aguas abajo de la cañada			P A				0,90

<b>Résultat:</b>	Cobertura de desagües cloacales con sistemas sostenibles incrementada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	Fin du Projet
Hogares con nuevas conexiones efectivas a la red de saneamiento	Hogares		2010	P A			2.483,00	2.483,00

<b>Résultat:</b>	Sistema pluvial y vial de Ciudad de la Costa - Zona A mejorado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	Fin du Projet
Cantidad de denuncias por inundaciones disminuída	Denuncias/año			P A				0,00
Cantidad de denuncias por deterioro vial disminuída	Denuncias/año			P A				0,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Obras de Saneamiento</b>									
Sistema de Saneamiento de Ciudad de la Costa-Zona A construido	Unidad				1,00	8.090.000,00	8.579.000,00		42.245.000,00
<b>Obras de drenaje pluvial y pavimentación de vías</b>									
Sistema de drenaje pluvial construido	Unidad				1,00	665.300,00	101.000,00		32.616.000,00
<b>Fortalecimiento Institucional</b>									
Obras Sanitarias del Estado (OSE) fortalecido	Organismos fortalecidos				1,00				224.000,00
Intendencia de Canelones fortalecida	Organismos fortalecidos				1,00				426.000,00
<b>Gastos Financieros y Administrativos</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>8.755.300,00</b>	<b>8.680.000,00</b>		<b>75.511.000,00</b>
