

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo: 1960/OC-BR
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): BR-L1043
Subtipo de Operación: GOM - Operación Global de Obras Múltiples

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 19.382.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 8.277.743,32
% Desembolsado: 42,71
Saldo: 11.104.256,68

Costo total y Fuente

BID Original: 19.382.000,00
Actual BID: 19.382.000,00
Pari-passu: 39,28
Co-financiamiento/País: 19.382.000,00
Estimado Original: 38.764.000,00
Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: Apr 19, 2011
Validado por Representante de País: Apr 19, 2011

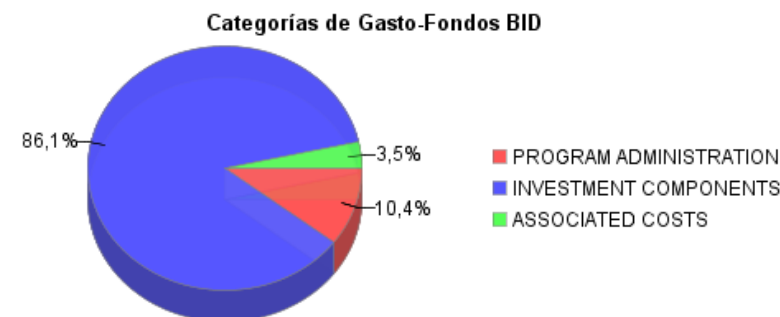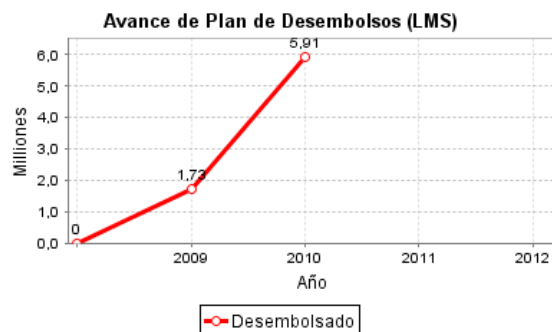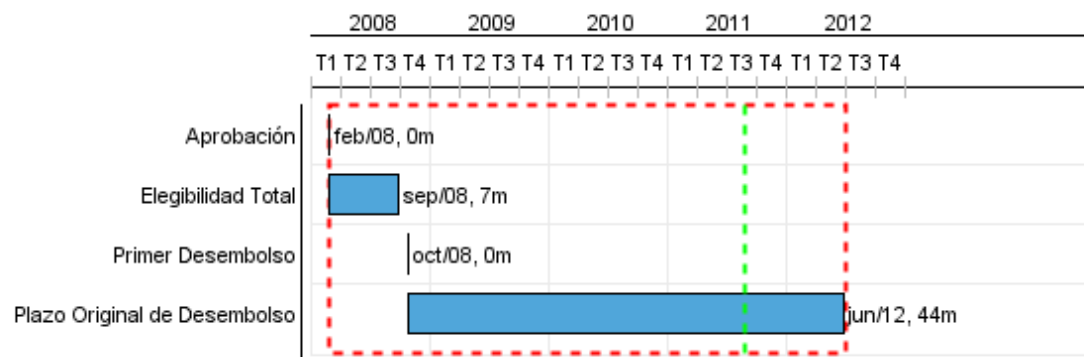

Progreso Acumulado al 2010

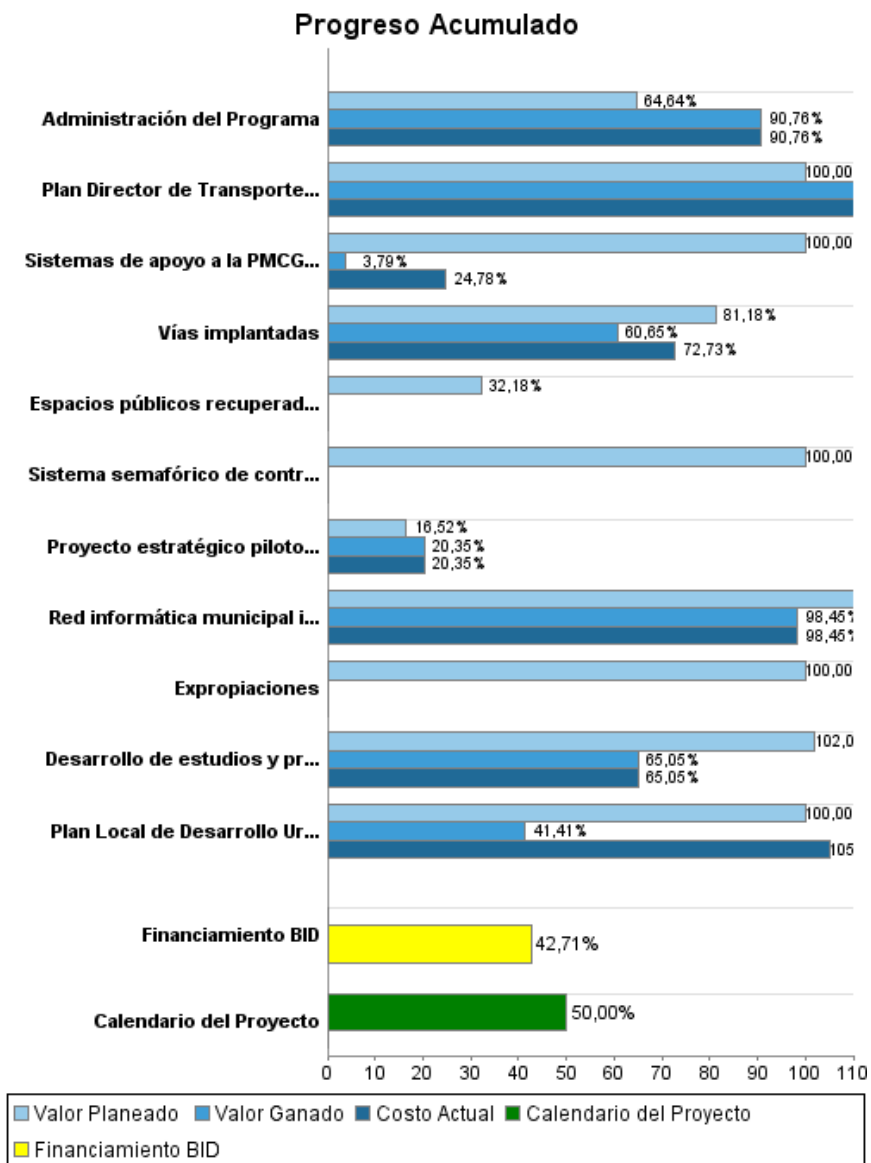

Resultados

Resultado: Área central de la ciudad revitalizada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Valor promedio de los inmuebles residenciales en el Centro.	Valor en R\$/ m2	75,12	2007	P A		97,65
Número de licencias de funcionamiento concedidas anualmente para comercio y servicios en el Centro.	Licencias de funcionamiento anuales	172,00	2006	P A		189,00

Resultado: Movilidad de la ciudad mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Tiempo de viaje para usuarios del transporte colectivo entre el área Oeste y el Centro	Minutos	9,32	2007	P A		6,99
Tiempo de viaje para usuarios del transporte privado entre el área Oeste y el Centro	Minutos	8,25	2007	P A		6,19
Tiempo de viaje para usuarios del transporte colectivo dentro del Centro en la Calle Alfonso Pena	Minutos	8,15	2007	P A		6,11
Tiempo de viaje para usuarios del transporte particular dentro del Centro en la Calle Alfonso Pena	Minutos	7,20	2007	P A		5,04
Tiempo de viaje para usuarios del transporte colectivo entre el área Oeste y el Centro	Minutos	14,30	2007	P A		10,72
Tiempo de viaje para usuarios del transporte particular entre el área Oeste y el Centro	Minutos	10,38	2007	P A		7,78

Resultado: Gestión administrativa de la Prefeitura Municipal de Campo Grande mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Gastos de comunicación de la Prefeitura.	US\$ millones anuales	2,70	2007	P A		1,35
Tiempo de trámite de licenciamiento ambiental.	Días	120,00	2007	P A		96,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Revitalización del Centro									
Plan Local de Desarrollo Urbano del Centro desarrollado y aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano (CMDU)	Gobiernos		1,00		1,00	90.000,00	186.342,00		450.000,00
Espacios públicos recuperados (con mobiliario urbano, paisajismo y pavimento)	Metros cuadrados				19.000,00	503.901,00			1.565.972,00
Proyecto estratégico piloto identificado en el Plan Local de Desarrollo Urbano del Centro desarrollado e implantado	Gobiernos				1,00				2.996.640,00
Movilidad Urbana									
Vías implantadas	Km	4,50	5,80		13,00	5.356.918,00	9.184.000,00		18.882.146,00
Sistema semafórico de control centralizado sirviendo a 180 intersecciones semaforizadas implantado	Sistema semafórico centralizado				1,00	2.556.168,00			7.100.466,00
Plan Director de Transportes actualizado	Gobiernos				1,00				258.766,00
Fortalecimiento Institucional									
Red informática municipal instalada (con 6 estaciones básicas y conexión de 274 puntos clientes)	Gobiernos				1,00				710.948,00
Sistemas de apoyo a la PMCG implantados (un software para la fiscalización de tráfico de la AGETRA, otro de licenciamiento ambiental y otro de control de obras para la SESOP)	Gobiernos	3,00			3,00	170.257,00	152.092,00		724.618,00
Otros									
Administración del Programa	No aplica					624.278,00	1.137.000,00		2.222.063,00
Expropiaciones	No aplica								1.852.381,00
Desarrollo de estudios y proyectos	No aplica						40.610,00		2.000.000,00
TOTAL						9.301.522,00	10.700.044,00		38.764.000,00
