
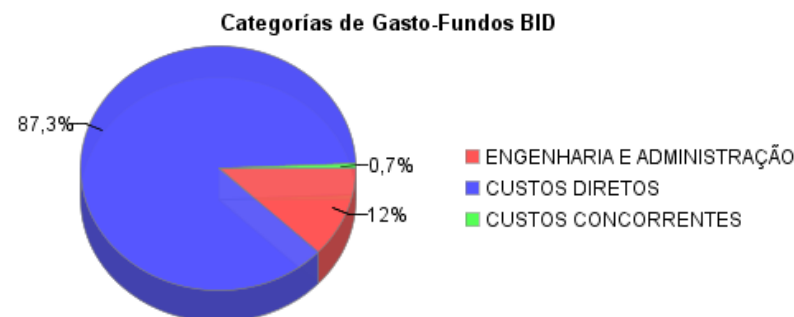
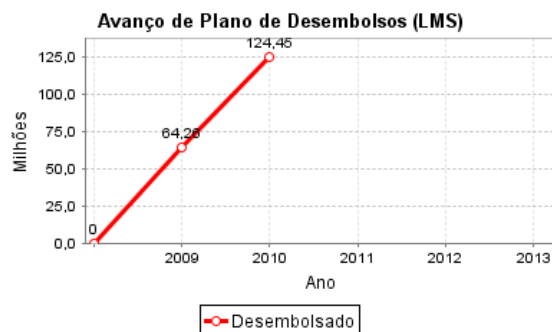



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Estado de Amazonas		
Sector: WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número da Operação: 2006/OC-BR	Atual: 154.000.000,00	Original BID: 154.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 124.453.667,53	Corrente BID: 154.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 80,81	Pari-passu: 6,86
Operação Relacionada: BR-L1005	Saldo: 29.546.332,47	Cofinanciamento/País: 66.000.000,00
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project		Original Estimado: 220.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 24, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 20, 2011

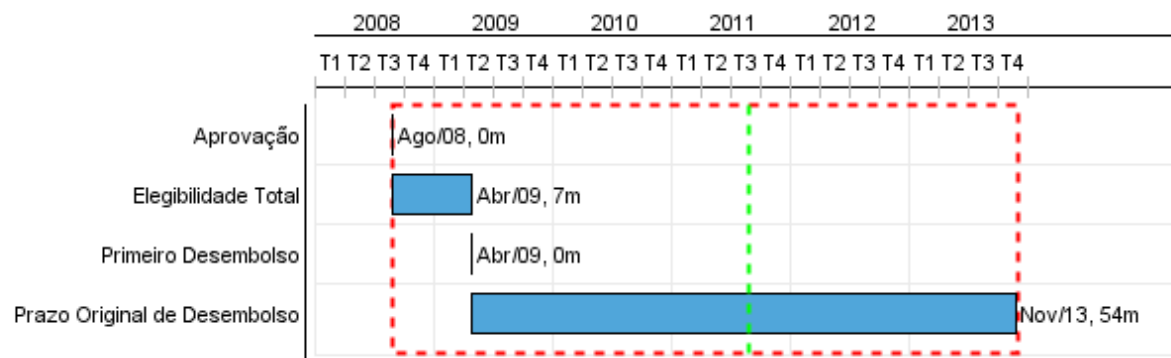

## Progresso Acumulado até 2010

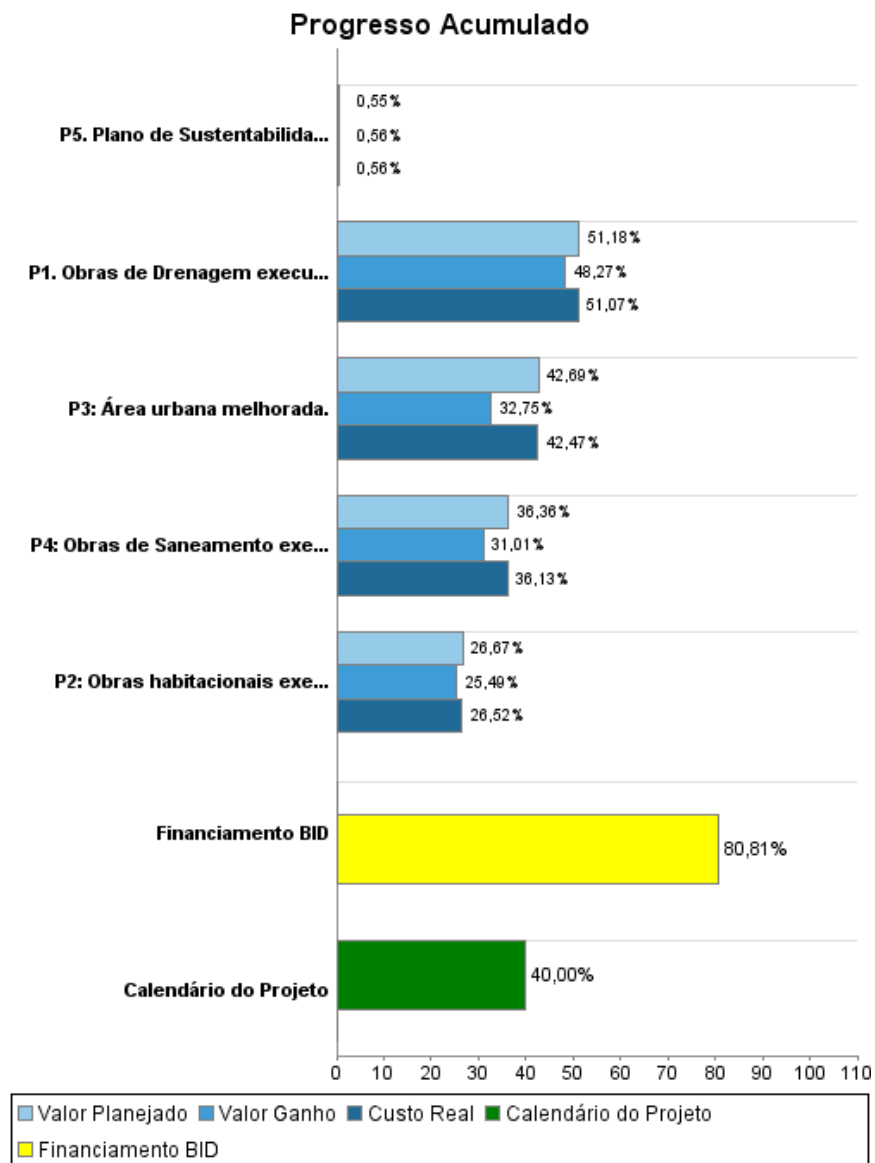

## Resultados

**Resultado:** Ocorrências de contaminação das águas nos igarapés da cidade de Manaus-AM.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Quantidade de coliformes fecais reduzidos, parte por milhão.	NMP/100ml	2.400,00	2009	P A	1.000,00
Oxigênio dissolvido nas águas aumentado, parte por 100 milhões.	mgO <sub>2</sub> /l	3,10	2009	P A	4,20
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).	mgO <sub>2</sub> /l	240,00	2009	P A	20,00
Quantidade de nitrogênio amoniacal.	mgN/l	20,00	2009	P A	10,00
Demanda Química de Oxigênio (DQO).	mgO <sub>2</sub> /l	152,30	2009	P A	75,00

**Resultado:** Ocorrências de inundações dos igarapés na cidade de Manaus-AM.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Pessoas afetadas por inundações dos igarapés.	Pessoas	21.760,00	2009	P A	0,00
Casas construídas nas margens dos igarapés.	Casas	4.352,00	2009	P A	0,00

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010**

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>COMPONENTE1: Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional</b>									
P1. Obras de Drenagem executadas.	Metros	2.575,00	2.096,00		9.488,00	4.722.560,11	4.687.895,56		30.148.264,48
P2: Obras habitacionais executadas.	Un	168,00	158,00		1.038,00	8.248.232,48	8.185.943,98		41.405.212,28
P3: Área urbana melhorada.	Ha	3,00	2,00		40,00	20.973.961,17	20.819.771,44		70.299.996,77
P4: Obras de Saneamento executadas.	Metros	42.900,00	35.907,00		142.734,00	17.499.118,51	17.372.789,41		53.287.526,47
<b>COMPONENTE 2: Sustentabilidade Social e Institucional</b>									
P5. Plano de Sustentabilidade Comunitário Social , implementado.	Plano		0,01		1,00	23.474,54	24.201,78		4.284.000,00
<b>COMPONENTE 3: OUTROS</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>51.467.346,81</b>	<b>51.090.602,17</b>		<b>199.425.000,00</b>
