
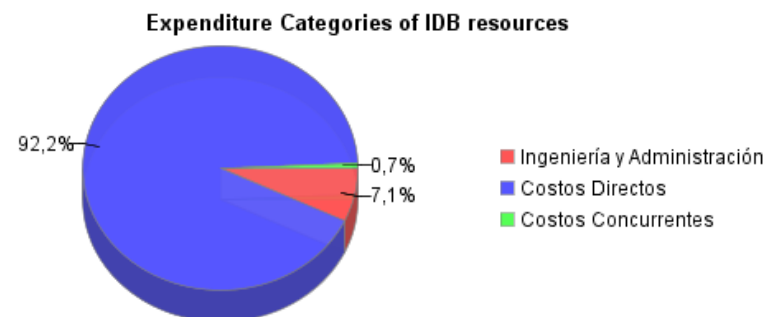
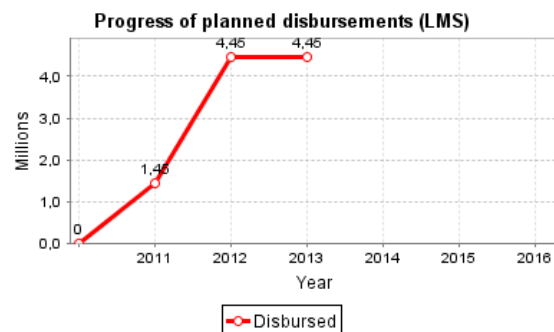


Summary Report


Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	2430/OC-DR	Current Approved Amount:	35.000.000,00	Original IDB:	35.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	4.450.000,00	Current IDB:	35.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	12,71	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	DR-T1056, DR-X1005, DR-P1077	Balance:	30.550.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	35.000.000,00
				Amortization Period (months):	228

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 28-abr-2013 Validated by Country Representative: 29-abr-2013

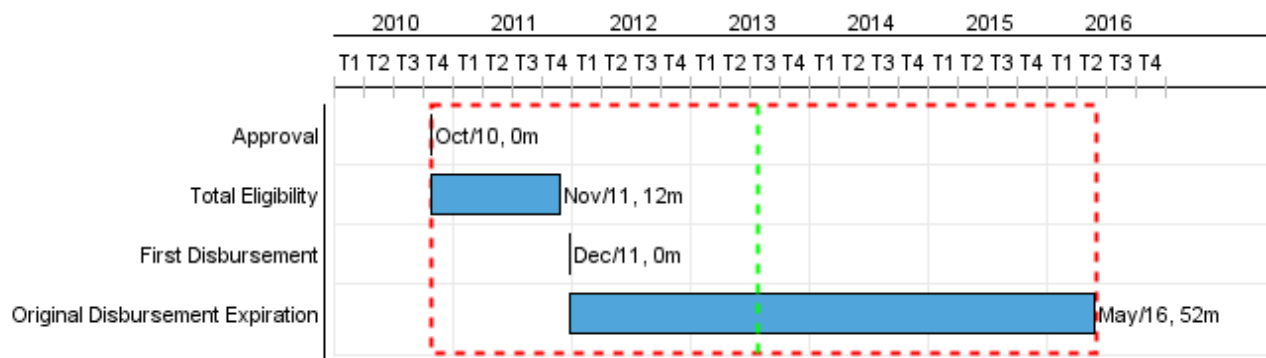

Accumulated Progress



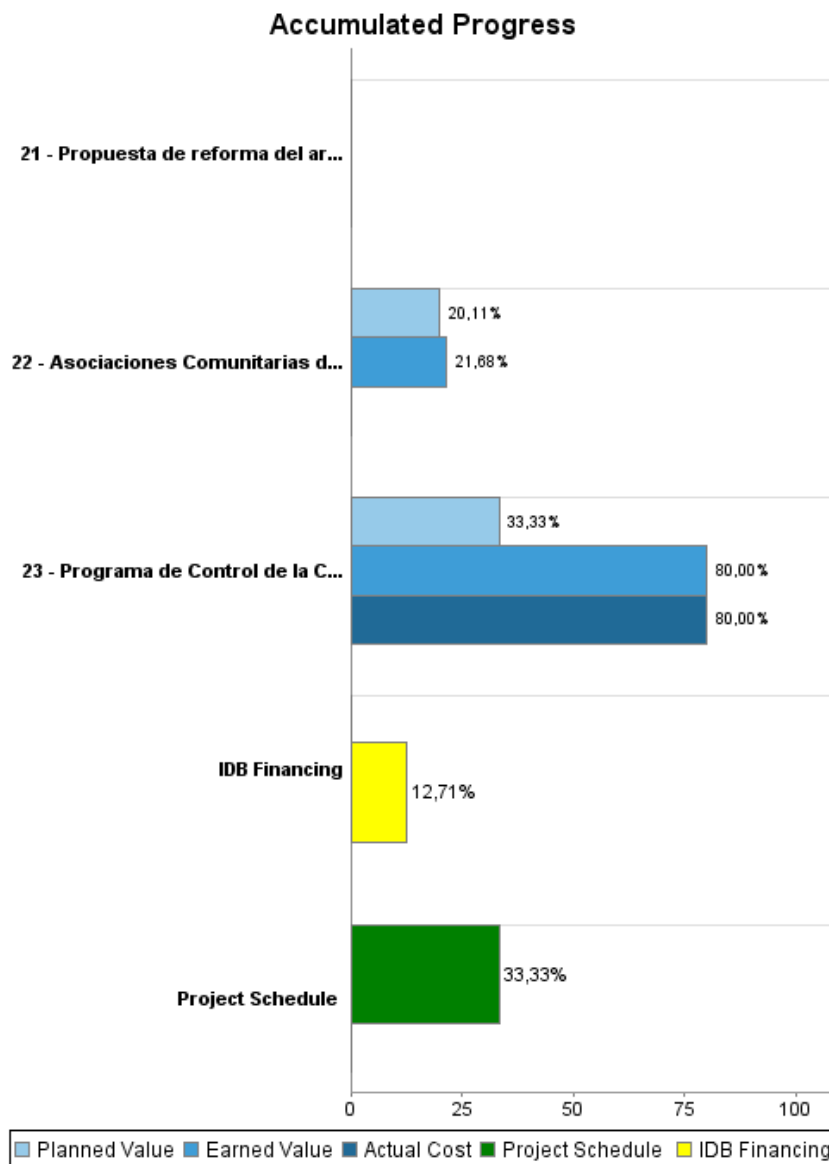

Outcomes

Outcome: Cobertura de agua potable y saneamiento incrementada en siete provincias del país donde INAPA brinda servicio.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Cobertura de agua potable en las áreas atendidas por el INAPA.	Incremento puntos porcentuales		2011	P A				0,43	1,52	2,15	4,10
Cobertura de alcantarillado/ saneamiento en las areas atendidas por el INAPA, atribuible al programa.	incremento puntos porcentuales		2011	P A				0,22	0,80	1,61	2,63
Personas beneficiadas por la construcción de sistemas de agua potable en zonas rurales	Households		2011	P A					9.300,00	12.200,00	21.500,00
Personas beneficiadas por la construcción de sistemas de saneamiento en zonas rurales	Houesholds		2011	P A					10.800,00	12.600,00	23.400,00
Personas beneficiadas por la construcción de sistemas de agua potable en zonas urbanas	Households		2011	P A					14.000,00	14.000,00	28.000,00
Personas beneficiadas por la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento en zona urbanas.	Houesholds		2011	P A					2.900,00	3.200,00	6.100,00

Outcome: La gestión técnica, operativa y comercial de INAPA mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Indice de Agua No Contabilizada en las 7 provincias beneficiarias del proyecto	%		2011	P A					5,00	5,00	10,00
Calidad de agua (indice de potabilidad)	%	50,00	2011	P A					50,00	65,00	65,00
Usuarios incluidos en el catastro de INAPA	Usuarios	329.528,00	2011	P A					330.750,00	346.500,00	363.825,00
Eficiencia de la cobranza en relacioun a usuarios facturados en las siete provincias bneficiarias	%	10,00	2011	P A			10,00	20,00	35,00	60,00	60,00
Informes financieros y estados financieros generados en sistemas informáticos que cumplen con normativa contable	Informes		2011	P A					1,00	1,00	2,00
Informes anuales de gestión de recursos humanos generados en sistemas informáticos	Informes		2011	P A					1,00	1,00	2,00

Manuales de Operacion y Mantenimiento de sistemas de Agua Potable y Saneamiento	Manuales		2011	P					1,00		1,00
				A							
Técnicos capacitados en Operacion y Mantenimiento de agua potable y calidad de agua potable	Técnicos		2011	P					20,00	20,00	40,00
				A							

Outcome: Organizaciones comunitarias para operar y mantener los sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales fortalecidas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Porcentaje de mujeres que integran las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales	%		2011	P		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
				A		30,00					
Porcentaje de sistemas rurales de Agua Potable y Saneamiento que son administrados, operados y mantenidos por las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales en el área de influencia del proyecto.	%		2011	P				40,00	60,00	80,00	80,00
				A							
Miembros de comunidades rurales reciben capacitación en Operacion y Mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento	Miembros		2011	P		14,00	58,00	78,00	50,00		200,00
				A							
Miembros de Asociaciones Comunitarias de Agua Rural reciben capacitación en administración de Sistemas de agua y saneamiento.	Miembros		2011	P		50,00	202,00	272,00	176,00		700,00
				A							

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Inversiones en Infraestructura									
Sistemas de agua potable contruidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/ periurbanos	Sistemas				22,00	500.000,00			12.100.000,00
Sistemas de agua potable contruidos o rehabilitados en comunidades rurales	Sistemas				100,00	500.000,00			18.700.000,00
Sistemas de saneamiento contruidos o rehabilitados en comunidades rurales	Sistemas				100,00	500.000,00			10.628.000,00
Sistemas de Saneamiento contruidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/ periurbanos	Sistemas				12,00	500.000,00			7.452.000,00
Diseños completados para comunidades rurales a ser servidas con agua potable	Diseños	10,00	31,00		65,00		20.000,00		220.000,00
Diseños completos para comunidades rurales a ser servidas con saneamiento	Diseños	10,00	24,00		60,00		20.000,00		220.000,00
Diseños completos para proyectos de saneamiento en zonas urbanas / periurbanas	Diseños		20,00		23,00		20.000,00		20.000,00
Diseños completos para proyectos de agua potable en zonas urbanas/periurbanas	Diseños		16,00		27,00		20.000,00		20.000,00
Desarrollo Comunitario									
Comités Gestores creados en sistemas rurales	Comités	29,00	18,00		40,00	100.000,00			324.000,00
Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales creadas	Asociaciones	7,00	9,00		25,00	100.000,00			593.000,00
Asociaciones Comunitarias de Agua Rural incorporadas a la Ley 132/05	Asociacions	7,00	9,00		25,00	20.000,00			79.000,00
Campañas de sensibilizacion ambiental en escuelas	Campaña				4,00		16.181,52		300.000,00
Campañas de Higiene realizadas	Campaña				1,00				176.000,00
Campañas de gestion de riesgos en comuidades rurales	Campaña				1,00				258.000,00
Campaña comercial realizada	Campaña				1,00				130.000,00
Mejoramiento Gestión Técnica, Operativa y Comercial de INAPA y Desconcentración de los Servicios									
Propuesta para la restructuración del area de Operacion y Mantenimiento de INAPA	Propuesta				1,00				500.000,00
Programa de Control de la Calidad de Agua en INAPA para mitigar Expansion Colera. Instalacion de cloradores en acueductos rurales.	Cloradores instalados		25,00		121,00	500.000,00	1.200.000,00		1.500.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Propuesta de reforma del Area Comercial de INAPA	Propuesta				1,00				500.000,00
Propuesta de reforma del area financiero administrativa del INAPA	Propuesta				1,00				500.000,00
Sistemas comerciales y catastro de clientes actualizados en centros urbanos.	Sistemas				16,00				4.000.000,00
Sistema contable y financiero a nivel central del INAPA y oficinas regionales implementado.	Sistemas				1,00				2.000.000,00
Sistema de administración de personal a nivel central de INAPA y regiones.	Sistema				1,00				2.000.000,00
Ciudades con catastro tecnico de redes acualizado	Ciudades				5,00				4.000.000,00
Otros costos: Administracion del Programa									
Apoyo a la Administracion del Programa	N/A					350.000,00	497.808,26		3.430.000,00
Auditorias y Evaluacion	N/A					50.000,00	6.350,00		350.000,00
TOTAL						3.120.000,00	1.800.339,78		70.000.000,00
