
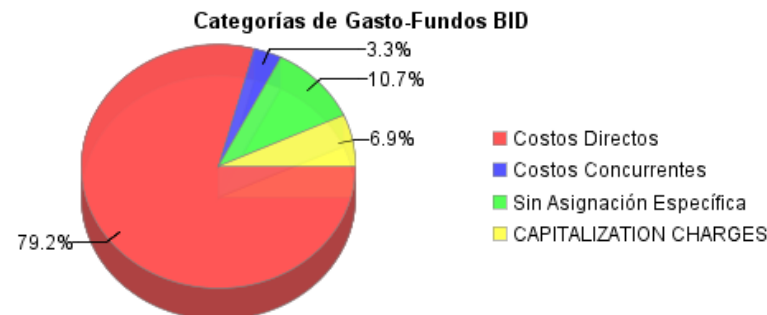




## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO		
Sector: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: 2647/OC-UR	Atual: 20.500.000,00	Original BID: 20.500.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 20.500.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 67,00
Operação Relacionada: UR-T1074	Saldo: 20.500.000,00	Cofinanciamento/País: 10.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 30.500.000,00
		Período de Amortização (meses): 246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 10-dic-2012 Validado pelo Representante do País: 10-dic-2012

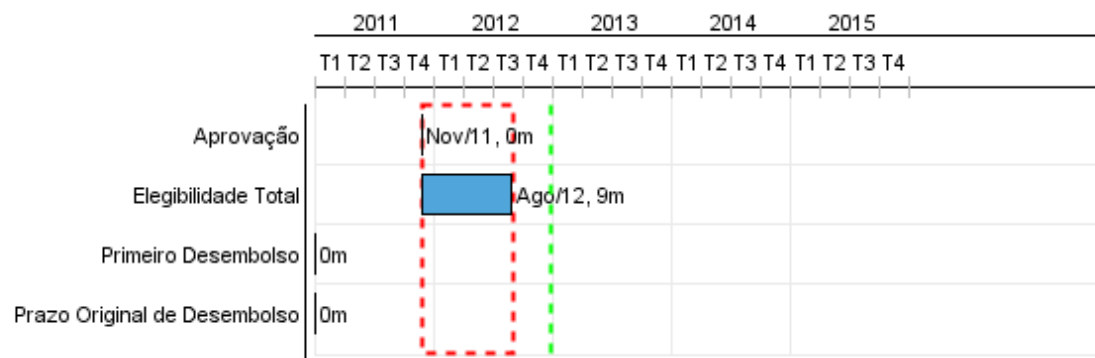

## Progresso Acumulado até 2012

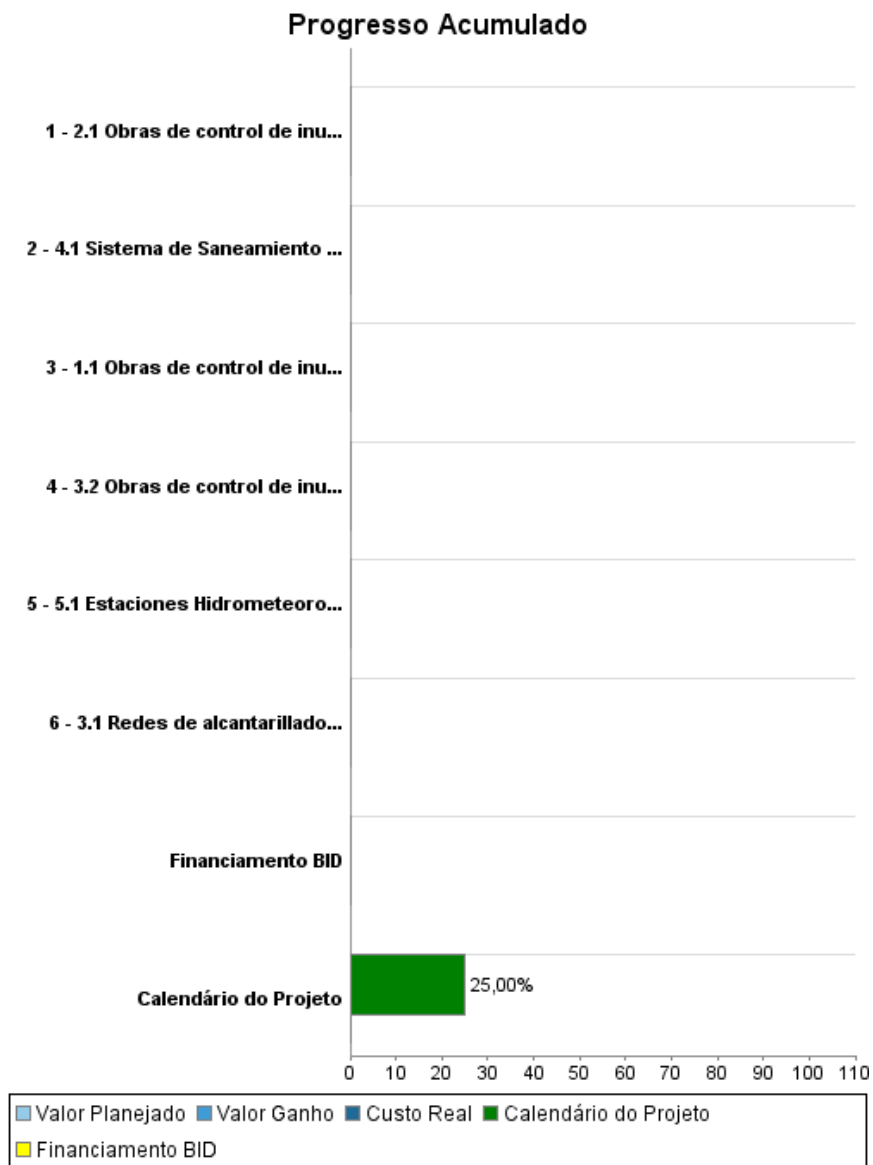

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Sistema de drenaje y saneamiento ambiental mejorado
-------------------	-----------------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Áreas inundables en Montevideo con un período de retorno de 10 años.	Áreas	11.00	2011	P	8.00
				A	
Carga orgánica vertida al Arroyo Pantanoso proveniente del PTIC	Kg DBO5/día	94.00	2012	P	
				A	

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente I. Obras de drenaje pluvial en la cuenca de Arroyo Seco</b>									
1.1 Obras de control de inundaciones	Tanques				2,00				6.844.000,00
<b>Componente II. Obras de drenaje pluvial en la cuenca del Arroyo Quitacalzones</b>									
2.1 Obras de control de inundaciones	Tanques				3,00				10.129.000,00
<b>Componente III. Obras de drenaje pluvial en la cuenca de la Cañada Peabody</b>									
3.1 Redes de alcantarillado pluvial construidas o ampliadas	km				4,60				4.746.000,00
3.2 Obras de control de inundaciones	Tanques				1,00				340.000,00
<b>Componente IV. Saneamiento ambiental para el PTI</b>									
4.1 Sistema de Saneamiento Ambiental y microdrenaje construido	Sistemas				1,00				1.083.000,00
<b>Componente V. Estaciones hidrometereológicas</b>									
5.1 Estaciones Hidrometeorológicas	Estaciones				12,00				50.000,00
<b>Compra Terrenos</b>									
Adquisición de Terrenos	N/A								671.000,00
<b>Costos administrativos y financieros</b>									
Costos Administrativos y Financieros	N/A					1.091.000,00	670.000,00		6.637.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.091.000,00</b>	<b>670.000,00</b>		<b>30.500.000,00</b>
