
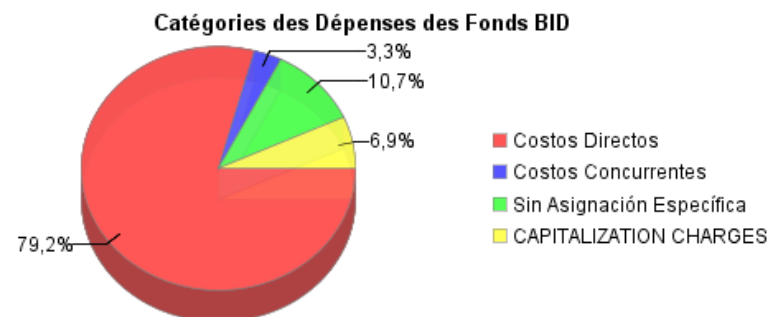




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO				
Secteur:	WATER AND SANITATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	2647/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	20.500.000,00	Initial BID:	20.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	20.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	67,00
Opération(s) Connexe(s):	UR-T1074	Solde:	20.500.000,00	Cofinancement/Pays:	10.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	30.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 26-mar-2013 Validé par le Représentant: 12-abr-2013

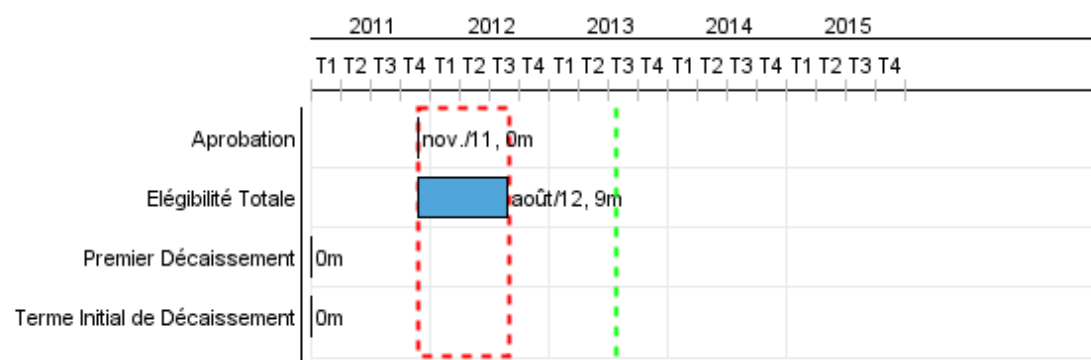

Progrès Cumulé à 2012

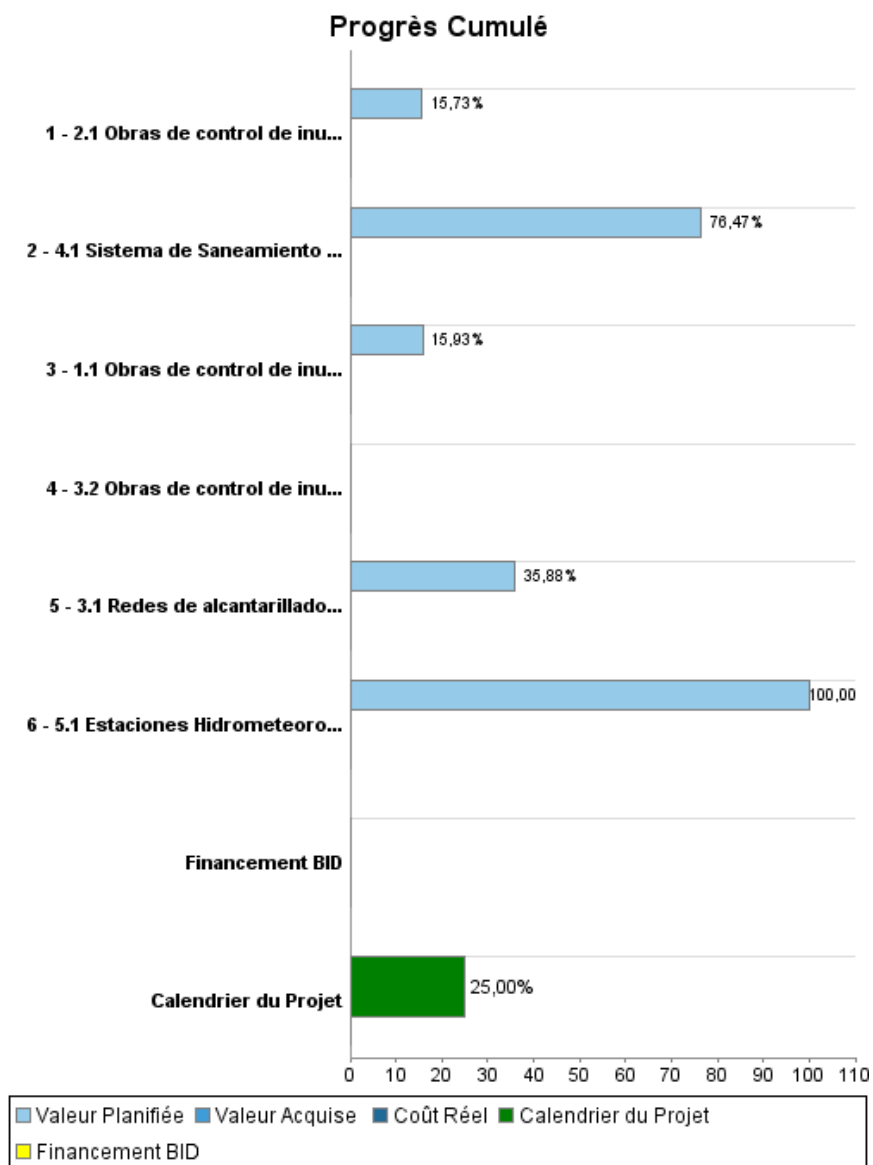

Résultats

Résultat:	Sistema de drenaje y saneamiento ambiental mejorado
------------------	-----------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Áreas inundables en Montevideo con un período de retorno de 10 años.	Áreas	11,00	2011	P	8,00
				A	
Carga orgánica vertida al Arroyo Pantanoso proveniente del PTIC	Kg DBO5/día	94,00	2012	P	
				A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I. Obras de drenaje pluvial en la cuenca de Arroyo Seco									
1.1 Obras de control de inundaciones	Tanques				2,00				6.844.000,00
Componente II. Obras de drenaje pluvial en la cuenca del Arroyo Quitacalzones									
2.1 Obras de control de inundaciones	Tanques				3,00				10.129.000,00
Componente III. Obras de drenaje pluvial en la cuenca de la Cañada Peabody									
3.1 Redes de alcantarillado pluvial construidas o ampliadas	km				4,60				4.746.000,00
3.2 Obras de control de inundaciones	Tanques				1,00				340.000,00
Componente IV. Saneamiento ambiental para el PTI									
4.1 Sistema de Saneamiento Ambiental y microdrenaje construido	Sistemas				1,00				1.275.000,00
Componente V. Estaciones hidrometereológicas									
5.1 Estaciones Hidrometeorológicas	Estaciones				12,00				50.000,00
Compra Terrenos									
Adquisición de Terrenos	N/A								671.000,00
Costos administrativos y financieros									
Costos Administrativos y Financieros	N/A					1.091.000,00	1.335.000,00		6.445.000,00
TOTAL						1.091.000,00	1.335.000,00		30.500.000,00
