
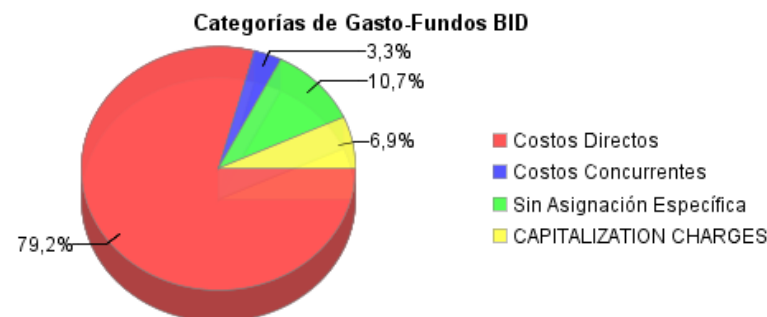
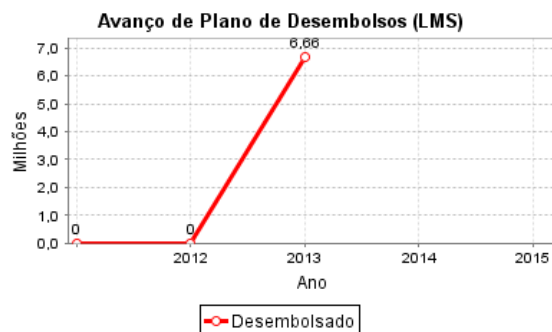



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Número da Operação:	2647/OC-UR	Atual:	20.500.000,00	Original BID:	20.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	400.000,00	Corrente BID:	20.500.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	1,95	Pari-passu:	67,00
Operação Relacionada:	UR-T1074	Saldo:	20.100.000,00	Cofinanciamento/País:	10.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	30.500.000,00
				Período de Amortização (meses):	246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação	
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão:	16-sep-2013
		Validado pelo Representante do País:	18-sep-2013

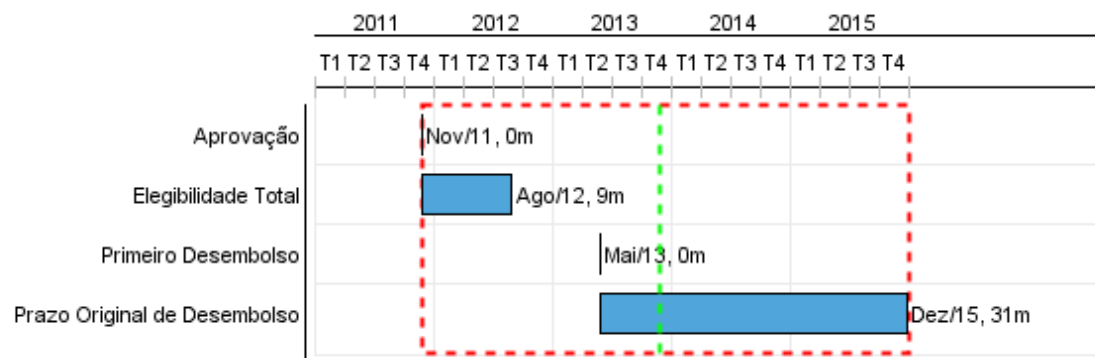

Progresso Acumulado até 2013

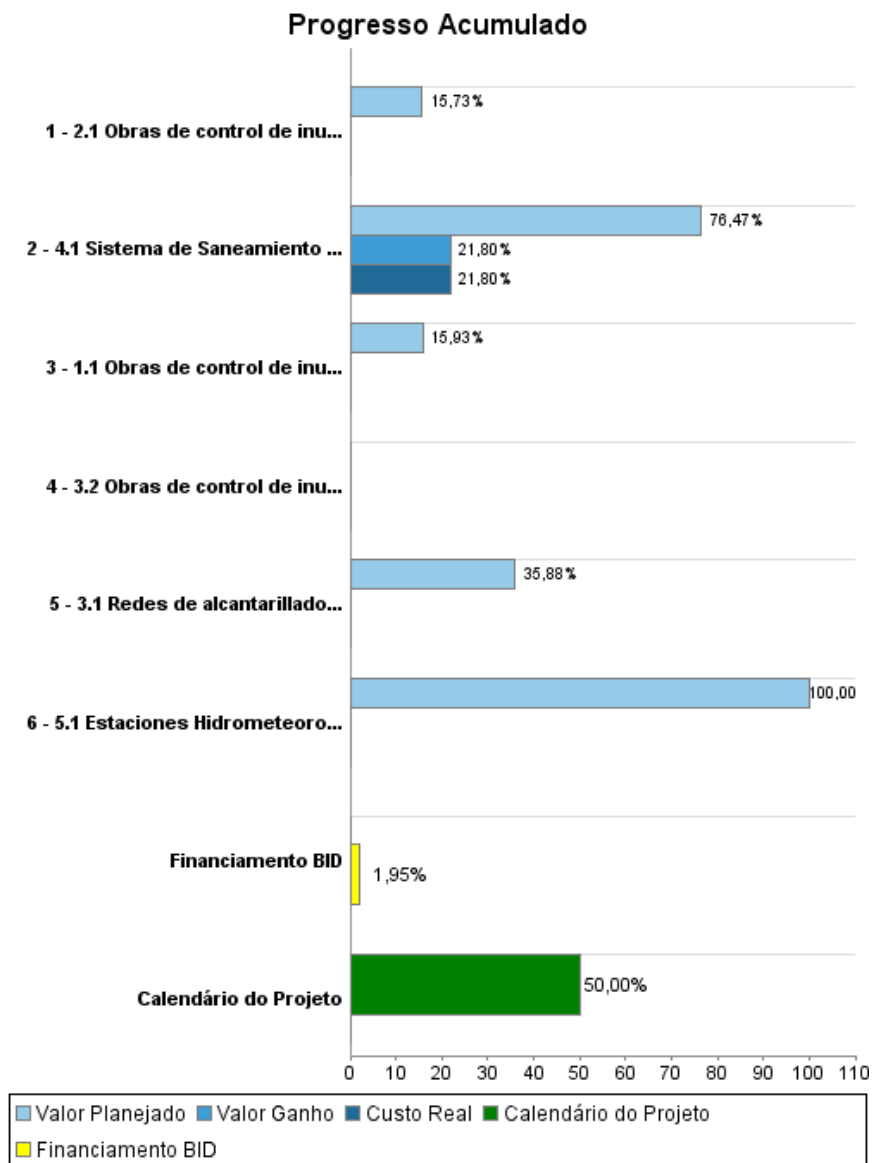

Resultados

Resultado:	Sistema de drenaje y saneamiento ambiental mejorado
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Áreas inundables en Montevideo con un período de retorno de 10 años.	Áreas	11,00	2011	P A	8,00
Carga orgánica vertida al Arroyo Pantanoso proveniente del PTIC	Kg DBO5/día	94,00	2012	P A	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I. Obras de drenaje pluvial en la cuenca de Arroyo Seco									
1.1 Obras de control de inundaciones	Tanques				2,00	1.090.300,00			6.844.000,00
Componente II. Obras de drenaje pluvial en la cuenca del Arroyo Quitacalzones									
2.1 Obras de control de inundaciones	Tanques				3,00	1.593.700,00			10.129.000,00
Componente III. Obras de drenaje pluvial en la cuenca de la Cañada Peabody									
3.1 Redes de alcantarillado pluvial construidas o ampliadas	km	1,00			4,60	1.703.000,00			4.746.000,00
3.2 Obras de control de inundaciones	Tanques	1,00			1,00				340.000,00
Componente IV. Saneamiento ambiental para el PTI									
4.1 Sistema de Saneamiento Ambiental y microdrenaje construido	Sistemas				1,00	975.000,00	278.000,00		1.275.000,00
Componente V. Estaciones hidrometereológicas									
5.1 Estaciones Hidrometeorológicas	Estaciones	12,00			12,00	50.000,00			50.000,00
Compra Terrenos									
Adquisición de Terrenos	N/A					671.000,00	626.000,00		671.000,00
Costos administrativos y financieros									
Costos Administrativos y Financieros	N/A					1.000.000,00	26.000,00		6.445.000,00
TOTAL						7.083.000,00	930.000,00		30.500.000,00
