

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
Secteur: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Numéro(s) de Prêt(s): 2908/BL-BO
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): BO-T1167, RG-P1478, BO-L1085, BO-T1189, RG-P1509
Sous-Type de l'Opération: PFM - Multi-Phase Lending Project

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 47.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:
% Décaissé:
Solde: 47.000.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 47.000.000,00
Courant BID: 47.000.000,00
Pari Passu: 96,00
Cofinancement/Pays: 2.000.000,00
Estimation Initiale: 49.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 12-abr-2013

Validé par le Représentant:

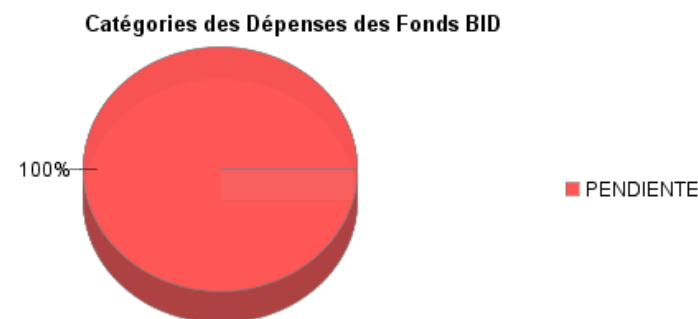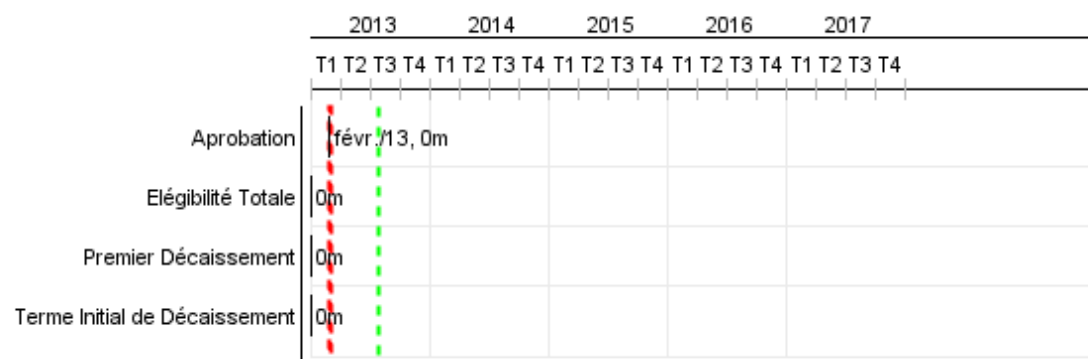

Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Capacidad de planificación y gestión urbana mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2017	Fin du Projet
Obras incluidas en los Programas Operativos Anuales (POAs) que son gestionados a través de un sistema informático de seguimiento de proyectos	%		2012	P A		60,00	60,00

Résultat: Infraestructura vial y urbana de El Alto mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2017	Fin du Projet
Reducción del tiempo promedio de viaje en el circuito definido por el playón de las Casetas de Peaje de la Autopista y la intersección de la Av. Juan Pablo II y la AV. Alfonso Ugarte	minutos	11,00	2012	P A	11,00	5,00	5,00
Reducción del tiempo promedio de viaje en el circuito definido por le playón de las Casetas de Peaje de la Autopista y la intersección de la Av. Ladislao Cabrera y la Calle 126 de la Zona Bolivar C	minutos	26,00	2012	P A	26,00	13,00	13,00
Reducción del tiempo promedio de viaje en el circuito definido por el playón de las Casetas de Peaje de la Autopista y la intersección de la Av. 6 de Marzo y la Calle 11	minutos	21,00	2012	P A	21,00	17,00	17,00
Reducción del consumo de combustible en el trayecto entre La Ceja y Viacha	miles US\$/año		2012	P A		205,00	205,00

Résultat: Prestación de los servicios al ciudadano por parte del GAMEA mejorada y desconcentrada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2017	Fin du Projet
Porcentaje de trámites de recaudación atendidos en la Dirección de Recaudación que pasan a ser atendidos en las 14 sub alcaldías y en las 2 nuevas centralidades	%		2012	P A		40,00	40,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Apoyo a las capacidades de planificación y gestión urbana territorial									
Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el órgano ejecutivo del GAMEA	Plan				1,00				760.000,00
Sistema de Información para el Seguimiento de Obras operando	Sistema Informático				1,00				130.000,00
Funcionarios capacitados en gestión de proyectos y en el uso del Sistema Informático de Seguimiento de Obras	No de funcionarios				50,00				200.000,00
Mejoramiento de la infraestructura urbana									
Estudios de pre inversión para la nueva centralidad sur realizados	estudio				1,00				440.000,00
Estudios de pre inversión para la nueva centralidad oeste realizados	estudio				1,00				600.000,00
Estudios de pre inversión para la apertura vial aeropuerto realizados	estudio				1,00				700.000,00
Estudios de pre inversión Fase II realizados	estudio				3,00				1.600.000,00
Centralidad sur construida	metros cuadrados				6.300,00				9.150.000,00
Centralidad oeste construida	metros cuadrados				8.800,00				12.500.000,00
Apertura vial Aeropuerto habilitada	estructura				1,00				17.430.000,00
Programas de capacitación adaptados a los comerciantes de las nueve centralidades realizados	programas				3,00				320.000,00
Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres de las zonas de las nueve centralidades	programas				3,00				200.000,00
Mejora de la prestación de servicios al ciudadano									
Rediseño de procesos y sistema informático relacionados a la gestión de la propiedad inmueble realizados	procesos y sistema				1,00				940.000,00
Creación de una Unidad de Atención Ciudadana en el GAMEA	unidad				1,00				400.000,00
Ventanillas de atención ciudadana operando	ventanillas de atención ciudadana				16,00				660.000,00
Capacitación a funcionarios municipales en temáticas de prestación de servicios realizada	funcionarios capacitados				90,00				100.000,00

RAPPORT DE SUIVI

BO-L1079 - Urban rearrangement program La Ceja
2012 2º período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 14/03/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Campañas de comunicación para el uso de las ventanillas de atención ciudadana realizadas	campañas				3,00				150.000,00
Administración, auditoria, monitoreo y evaluación									
Administración, auditoria, monitoreo y evaluación	N/A								2.720.000,00
TOTAL									49.000.000,00
