
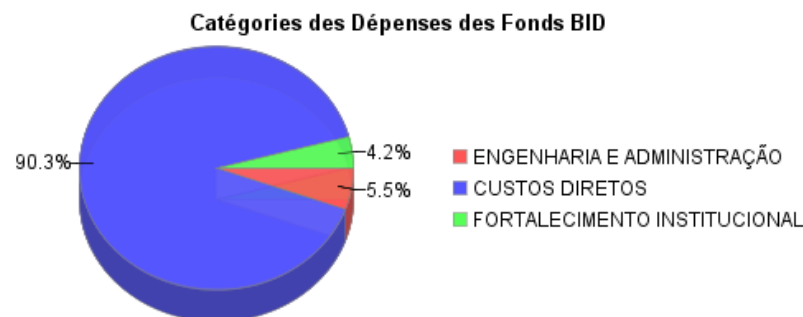
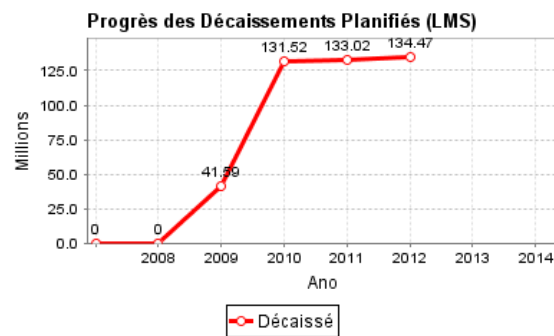



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
Secteur:	TRANSPORT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1957/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	176.775.000,00	Initial BID:	176.775.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	133.773.454,10	Courant BID:	176.775.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	75,67	Pari Passu:	66,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-T1089	Solde:	43.001.545,90	Cofinancement/Pays:	93.110.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	269.885.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012 Validé par le Représentant: 28-sep-2012

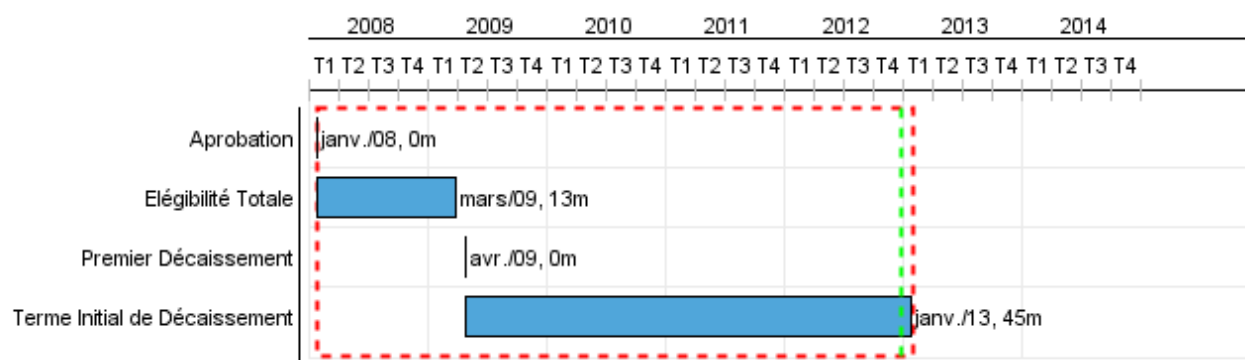

Progrès Cumulé à 2012

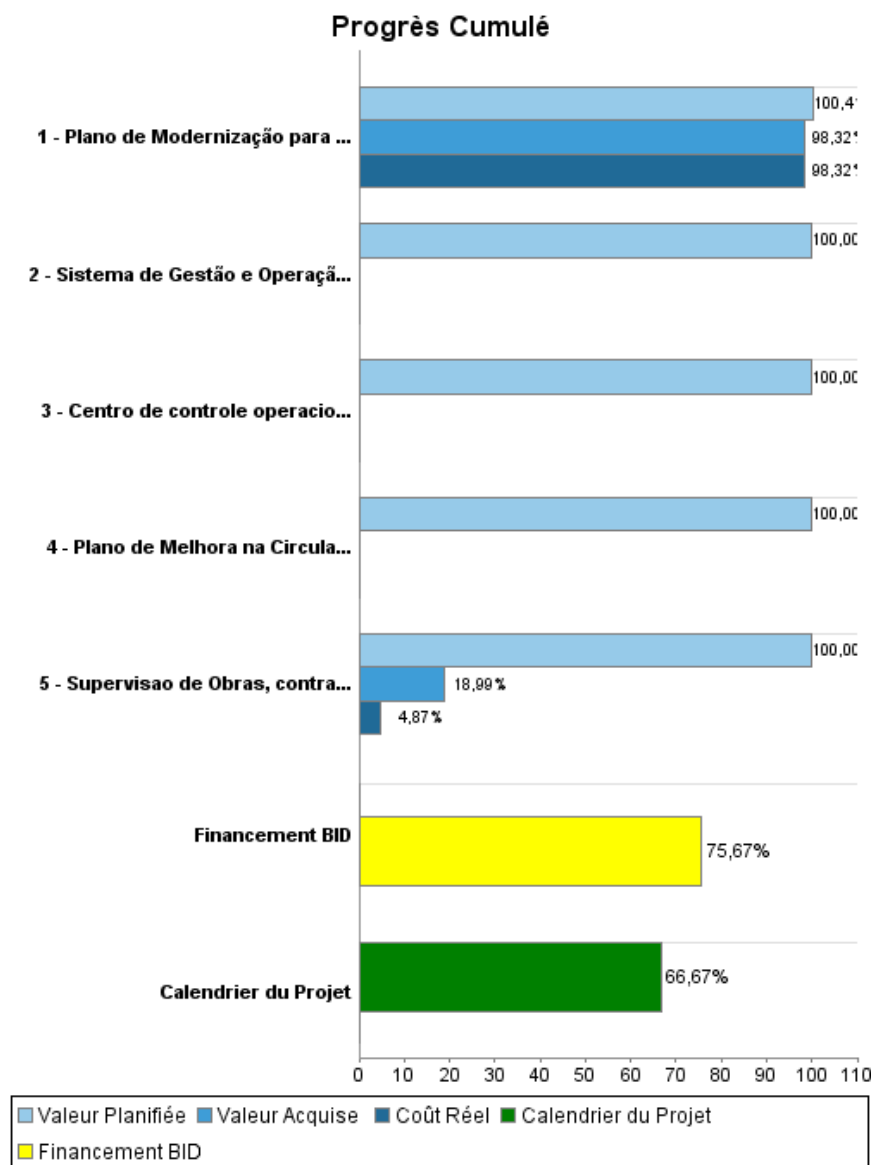

Résultats

Résultat:	Mobilidade e acessibilidade da população do Distrito Federal, melhorada.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Opiniões favoráveis (boa a excelente) dos habitantes do DF.	%	17.40	2008	P A	30.00	30.00
Tempo de viagem dos usuários do sistema de Ônibus.	Minutos	67.00	2008	P A	56.00	56.00
Tempo de viagem dos usuários que utilizam operação integrada.	Minutos	86.00	2008	P A	82.00	82.00
Tempo de espera nas paradas de ônibus.	Minutos	30.00	2008	P A	15.00	12.00
Índice de Passageiro por Quilômetro (IPK).	IPK	9.00	2008	P A	12.00	12.00
Custos de operação dos ônibus.	US\$ / km	0.86	2008	P A	0.78	0.78

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Condições de mobilidade e acessibilidade da população do Distrito Federal, em particular aquela de menores recursos, aumentando a integração dos núcleos urbanos da área metropolitana de Brasília - Melhorada.									
Plano de Modernização para integração do transporte público coletivo (TPC), implementado.	Plano				1,00		858.216,00		208.520.000,00
Plano de Melhora na Circulação e nas condições de segurança do transporte motorizado e não motorizado, implementado.	Plano				1,00				21.100.000,00
Centro de controle operacional de trânsito, operando.	Centro				1,00				4.285.000,00
Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público, implementado.	sistema				1,00				5.100.000,00
Fortalecimento Institucional									
Supervisão de Obras, contratada.	contratos	1,00	1,00		4,00	200.000,00			15.140.000,00
Outros - Administração e Supervisão do Programa									
Administração do Programa	N/A					2.982.000,00	1.738.468,00		15.740.000,00
TOTAL						3.182.000,00	2.596.684,00		269.885.000,00
